



Plan Quinquenal de la Red Vial Cantonal para la Unidad Técnica de Gestión Vial

Municipal de la Municipalidad de
San Carlos

Periodo 2018 al 2022



Elaborado por:
*Margareth
Rodriguez Arce*



CONTENIDO

ÍNDICE DE TABLAS	IV
ÍNDICE DE GRÁFICOS	VI
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	VII
ABREVIATURAS	VIII
INTRODUCCIÓN.....	1
Generalidades del Documento.....	5
A. REFERENCIA EMPRESARIAL	5
1. Antecedentes de la Municipalidad de San Carlos.....	5
2. Generalidades del Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial	10
B. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO.....	13
3. Justificación del Plan Quinquenal.....	13
4. Planteamiento del problema.....	13
5. Objetivos	13
6. Alcance del Documento.....	15
7. Limitaciones del Documento	15
A. ANTECEDENTES DE LA PLANIFICACIÓN	17
1. Definición conceptual de Planificación.....	18
2. Tipos de Planeación.....	20
3. Planes Quinquenales.....	24
B. MARCO METODOLÓGICO	25
1. Metodología.....	25
2. Investigación	25
3. Alcances Metodológicos.....	27
4. Técnicas de Investigación	28
5. Fuentes de Información.....	29
6. Sujetos y Fuentes de Investigación	30
A. GENERALIDADES	32
B. TIPOLOGÍA DE LA RED VIAL	33
C. LEY 8114 DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA Y SU REGLAMENTO.....	35
D. LEY N° 9329	55
E. DECRETO N° 27917.....	57
F. LEY 8114.....	59
G. LEY N° 7755	59
H. LEY N° 7729	61
I. LEY N° 7331	61
J. LEY N° 8757	62
K. LEY N° 6909	63
A. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN	65
B. TIPO DE INVESTIGACIÓN	65
C. FUENTES DE INFORMACIÓN	66
1. Fuentes Primarias.....	66
2. Fuentes secundarias.....	66
D. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN	67



1. Método de entrevista	67
E. ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN QUINQUENAL.....	68
F. CONCLUSIONES	71
A. GENERALIDADES DEL CANTÓN.....	73
1. Orígenes y Evolución del Cantón	73
2. Datos Demográficos del Cantón.....	78
3. Índice de Desarrollo Social	83
4. IDS Del Cantón de San Carlos	88
5. Principales actividades productivas	91
6. Extensión de la Red Vial Cantonal.....	92
7. Extensión de la Red Vial Nacional en el Cantón	97
B. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED VIAL DEL CANTÓN.....	101
1. Extensión de la Red Vial Cantonal Clasificada, No Clasificada y Cuadrantes y Calles Urbanas.....	101
2. Diagnóstico del Estado de la Red Vial del Cantón	102
C. SUPUESTOS DE LA FORMULACIÓN	103
3. Financieros	104
4. Macroeconómicos	109
5. Técnicos	113
6. Vulnerabilidad a los desastres naturales.....	115
D. POLÍTICAS Y CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN	123
1. Criterios Generales de Intervención	123
2. políticas en materia de gestión vial de la Municipalidad de San Carlos.....	126
E. PROYECCIONES DE INGRESOS	128
F. OBJETIVOS DEL PERIODO POR TIPO DE INTERVENCIÓN	130
G. METAS PARA EL PERÍODO POR TIPO DE INTERVENCIÓN.....	131
H. INDICADORES PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN QUINQUENAL	132
I. MATRIZ RESUMEN	140
3. Análisis de la Matriz Resumen del Plan Quinquenal	143
4. Matriz Resumen del Plan Quinquenal de la Red Vial Cantonal	146
5. Análisis del Plan Quinquenal 2011-2015 y años 2016-2017	555



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla I. Total de longitud de caminos en Km por distrito en el Cantón de San Carlos.	94
Tabla II. Distribución de los Caminos por Distrito.	95
Tabla III. Red Vial Nacional en el Cantón.....	97
Tabla IV. Extensión y Clasificación de la Red Vial Cantonal	101
Tabla V. Extensión y Clasificación por distrito de la Red Vial Cantonal	102
Tabla VI. Estado de la Red Vial de San Carlos 2017.....	103
Tabla VII. Distribución del Aporte BID primeros 3 años del quinquenio	107
Tabla VIII. Precio del Combustible Años 2016-2017 y 2018.....	110
Tabla IX. Precios al consumidor para noviembre 2017	111
Tabla X. Proyección de ingresos 2018-2022.....	128
Tabla XI Proyección de los ingresos de los Recursos Propios de la Municipalidad.....	129
Tabla XII. Simbología de los Indicadores	132
Tabla XIII Indicador para el control y evaluación del Mantenimiento Periódico de la RVC.....	134
Tabla XIV Indicador para el control y evaluación de la ejecución de las metas con recursos del BID de la RVC	135
Tabla XV Indicador para el control y evaluación del Mantenimiento Periódico de la RVC.....	136
Tabla XVI Indicador para el control y evaluación del Mantenimiento Rutinario de la RVC.....	137
Tabla XVII Indicador para el control y evaluación del Mejoramiento de la RVC.....	138
Tabla XVIII Indicador para el control y evaluación de la Rehabilitación de la RVC	139
Tabla XIX. Cantidad de Kilómetros por clasificación	144
Tabla XX. Extensión en Km de acuerdo con el IVTS	144



ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráficos I. Distribución proporcional de la población del Cantón de San Carlos,.....	79
Gráficos II. Estimación de la población total cantonal de San Carlos al 2018-2022	80
Gráficos III Proporción de la población cantonal según distrito del 2018-2022	81
Gráficos IV Población Rural y Urbana en los distritos del cantón de San Carlos.	82
Gráficos V Proporción de la población según Distrito	83
Gráficos VI Índice de Desarrollo Social Distrital 2013, según División Territorial Administrativa	89
Gráficos VII Distribución de los Caminos del Cantón de San Carlos Según su Clasificación	96
Gráficos VIII Precio del Combustible Años 2016-2017 y 2018	111
Gráficos IX Estadísticas registradas en la Municipalidad de San Carlos por Desastres Naturales 2012-2017.....	122
Gráficos X Proyectos ejecutados y no ejecutados en el Periodo 2011-2017	556
Gráficos XI Proyectos ejecutados y no ejecutados por año 2011-2017	557
Gráficos XII Porcentaje del estado actual de la Red Vial Cantonal 2012-2017	558
Gráficos XIII Porcentaje del estado actual de la Red Vial Cantonal 2012-2017	558
Gráficos XIV Comportamiento de la Condición de la RVC.....	559



ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración I. Visión y Misión de la Municipalidad de San Carlos	6
Ilustración II. Organigrama Estructural de la Municipalidad de San Carlos	9
Ilustración III. Organigrama Estructural de la Dirección de Gestión Vial	11
Ilustración IV Tipos de Planeación según el Nivel Jerárquico de la Organización.....	20
Ilustración V Proceso Cualitativo.....	26
Ilustración VI Fuentes de información.	29
Ilustración VII Ejemplos de fuentes primarias y secundarias. tes primarias y secundarias.	30
Ilustración VIII Etapas para la elaboración del Plan Quinquenal de Conservación Vial Cantonal	68
Ilustración IX División territorial administrativa de San Carlos.....	78
Ilustración X Composición del Índice de Desarrollo Social 2013.....	84
Ilustración XI Índice de Desarrollo Social Distrital 2013, según División Territorial Administrativa.....	90
Ilustración XII Red Vial de Costa Rica	93
Ilustración XIII Proyecciones de inflación subyacente y medida por IPC.....	112
Ilustración XIV. Mapa estratégico de los asuntos legales relacionados con el tema de red vial cantonal	125
Ilustración XV. Políticas Generales en Materia de Red Vial Cantonal.....	127



ABREVIATURAS

MOPT: *Ministerio de Obras Públicas y Transportes*

CONAVI: *Consejo Nacional de Vialidad*

INVU: *Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo*

IVTS: *Índice de Viabilidad Técnico Social*

CFIA: *Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica*

JVC: *Junta Vial Cantonal*

MEIC: *Ministerio de Economía, Industria y Comercio*

MINAE: *Ministerio de Ambiente y Energía*

IDS: *Índice de Desarrollo Social*

SIGVI: *Sistema de Gestión Vial Integrado*

SINFOC: *Sistema de Información de Caminos*

TPD: *Tránsito Promedio Diario*

AASHTO: *Conocida por sus siglas en inglés como “Asociación Americana de Oficialías de Transportes y Carreteras Estatales”*

UTGVM: *Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal*

RVN: *Red Vial Nacional*

RVC: *Red Vial Cantonal*

NYMEX: *La Bolsa Mercantil de Nueva York*

COLOSEVI: *Consejo Local de Seguridad Vial*



BID: *Banco Interamericano de Desarrollo*

PIT: *Programa de Infraestructura de Transporte*

CEPAL: *Comisión Económica para América Latina y el Caribe*

INEC: *Instituto Nacional de Estadísticas y Censos*

IVTS: *Índice de Viabilidad Técnico Socia*

DGM: *Dirección de Geología y Minas*

MINAET: *Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones*

SETENA: *Secretaria Técnica Nacional Ambiental*

Km: *Kilometro*

N: *Norte*

S: *Sur*

E: *Este*

O: *Oeste*

NE: *Noreste*

NO: *Noroeste*

SE: *Sureste*

SO: *Suroeste*

FOMUDE: *Proyecto de Fortalecimiento Municipal y Descentralizado*

DEMUCA: *Programa de Desarrollo Municipal de Centroamérica*

ADI: *Asociación de Desarrollo Integral*



INTRODUCCIÓN

La elaboración de este proyecto tiene como objetivo formular el Plan Quinquenal de Conservación Vial Municipal 2018 – 2022 para la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de San Carlos, tomando en consideración las indicaciones en materia de planificación vial emanadas por la Contraloría General de la República.

La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de San Carlos, funge como un órgano encargado de la infraestructura vial del cantón, por lo que este departamento es de vital importancia para el municipio y el Cantón de San Carlos en general, ya que a través de la red vial municipal o cantonal es que se genera el principal movimiento de personas, de actividades socioeconómicas, culturales y educativas, así como el transporte de la producción de bienes y servicios del país, en especial de la pequeña y mediana empresa.

La red vial de un cantón es fundamental para el desarrollo y crecimiento de manera que se faciliten el transporte de personas y las cargas, la Municipalidad de San Carlos pretende el mejoramiento continuo de la red vial de manera que pueda funcionar como una ventaja ya que al haber un adecuado desarrollo de transporte los costos son menores.

La conservación y el desarrollo del sistema vial deben fundamentarse y regirse con base en criterios de alto nivel técnico, de manera que factores como la improvisación, el empirismo, el oportunismo y la visión de corto plazo sean erradicadas ya que han demostrado ser amenazas negativas y de muy alto costo para el desarrollo de los sistemas viales.

Con base en lo anterior se justifica la elaboración de los planes de conservación y desarrollo vial, debidamente formulados, actualizados y puestos en ejecución con riguroso fundamento técnico, para la asignación de fondos públicos en este sector.



En síntesis, el desarrollo de este documento se enfoca en la formulación del Plan Quinquenal de la Red Vial Cantonal debidamente elaborado con base en el documento denominado “Propuesta de Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la elaboración del Plan Quinquenal de Gestión Vial Municipal”. Este documento sirve de guía para preparar el Plan Quinquenal de Inversiones Viales, en concordancia con lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento al Artículo 5to Inciso B) de la Ley N° 8114 de “Simplificación y Eficiencia Tributaria”, y la reforma la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, No. 9329 del 15 de octubre del 2015.

La estructura general de este trabajo está conformada por cinco capítulos, los cuales se explican de manera resumida a continuación:

En el **primer capítulo**, llamado Generalidades de la Investigación, el lector podrá encontrar los antecedentes de la Municipalidad de San Carlos, su misión, su visión, organigrama, generalidades del Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), así como los puestos con sus respectivas funciones del mismo Departamento. La descripción del problema, justificación del estudio y objetivos. Además, incluye los alcances del trabajo y las limitaciones que existieron durante su elaboración.

En el **segundo capítulo**, denominado Marco Teórico, se describen los conceptos de planificación, así como los tipos de planificación conocidos: planificación estratégica, planificación funcional y planificación operativa; también se puntualiza en el término plan quinquenal y se hace referencia a conceptos utilizados en el cuarto capítulo del proyecto denominado Marco Metodológico. Todos estos términos son utilizados para el propio desarrollo del trabajo.



En el **tercer capítulo**, señalado como Marco Legal, se detallan una serie de legislaciones que debe cumplir la Unidad Técnica de Marco Legal Gestión Vial Municipal con respecto a la gestión de infraestructura vial y la administración de recursos para inversión pública en la Red Vial Cantonal. En otras palabras, se realiza un resumen de las leyes relacionadas con el Plan Quinquenal de la Red Vial Cantonal y las leyes que respaldan los aportes a los municipios para la conservación vial.

En el **cuarto capítulo** se muestra el Marco Metodológico, donde se describe el tipo de investigación empleada, las fuentes de información, técnicas de investigación y metodología del análisis externo e interno.

En el **quinto capítulo** se desarrolla propiamente el Plan Quinquenal de la Red Vial Cantonal, donde se podrán encontrar las generalidades del cantón, las características generales de la red vial del cantón, los supuestos de formulación, las políticas y los criterios generales de intervención, las proyecciones de ingresos, la definición de proyectos y objetivos generales, las metas para el periodo por tipo de intervención, los indicadores de control, evaluación del Plan Quinquenal y se puede observar una matriz resumen del plan.

Finalmente se detalla un análisis del Plan Quinquenal anterior detallando los resultados de este.

Cabe destacar que además se añaden al trabajo tres apartados al finalizar, uno muestra las conclusiones del Plan de Quinquenal de Gestión Vial Municipal, en el segundo se muestra la literatura consultada para la realización del trabajo y finalmente se presentan los apéndices y los anexos correspondientes a este trabajo.



CAPÍTULO I

Generalidades del Documento



CAPITULO I. GENERALIDADES DEL DOCUMENTO

Este capítulo contiene las generalidades del presente documento, haciendo referencia a la Municipalidad de San Carlos. También se presentan elementos genéricos que se buscan atender con la formulación de este plan, como el problema atendido, los objetivos y otros similares.

A. REFERENCIA EMPRESARIAL

La referencia empresarial presenta elementos generales sobre la Municipalidad de San Carlos, en vista de que es la organización interesada en la elaboración de este Plan Quinquenal.

1. ANTECEDENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS


El primer Palacio Municipal de San Carlos es inaugurado en octubre de 1947 por el Concejo Municipal integrado por Higinio Vargas, Roberto Quirós y Luis Hidalgo Quesada. El edificio tuvo un costo de 30.000 colones y se ubicó frente al parque, donde se realiza hoy la Feria del Agricultor, los días viernes y sábados.

El nuevo Palacio Municipal se ubica en un terreno donde funcionaron por muchos años instituciones educativas, como la Escuela Juan Chaves Rojas, el Liceo San Carlos y la Escuela de Enseñanza Especial.

La Municipalidad del periodo 1970 – 1974, compró el terreno a la Junta de Educación de la Escuela Juan Chaves Rojas, por la suma de 240.000 colones. Se construyó el edificio, con un costo de 1.200.000 colones, financiado con fondos propios municipales. El edificio se inauguró el día 27 de abril de 1974.

1.1. MISIÓN Y VISIÓN

Ilustración I. Visión y Misión de la Municipalidad de San Carlos

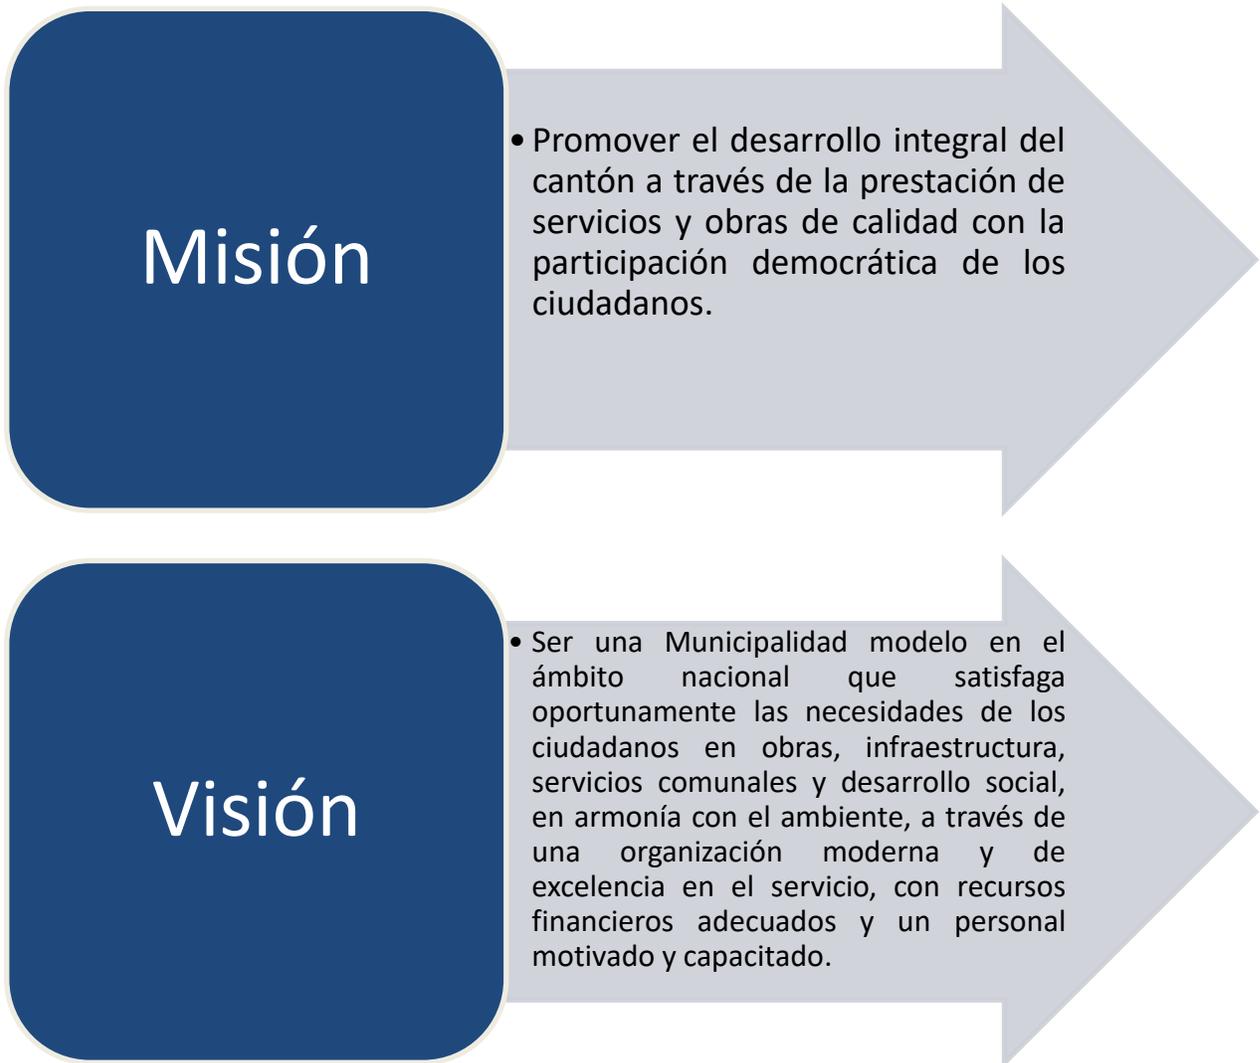

Fuente: Municipalidad de San Carlos

3.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD

En la Ilustración II se muestra la estructura organizacional de la Municipalidad de San Carlos, la misma muestra la composición de las unidades técnicas y administrativas que la integran y sus respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría.

El nivel político se organiza a partir del Concejo Municipal, La Secretaría del Concejo, La Dirección de Auditoría y La Alcaldía Municipal.

✓ CONCEJO MUNICIPAL

El gobierno municipal está compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por los regidores, además por un Alcalde (sa) y sus respectivos suplentes, todos de elección popular. El Concejo se constituye en la instancia jerárquica superior.

✓ ALCALDÍA MUNICIPAL


La Alcaldía es el órgano de mayor jerarquía administrativa dentro de la estructura municipal. Está a cargo del Alcalde Municipal con el apoyo de dos alcaldes suplentes, quienes lo sustituyen en sus ausencias temporales y definitivas, además de cumplir las otras funciones asignadas en el Código Municipal.

Para el cumplimiento de sus fines, el Alcalde delega parte de las funciones administrativas al Director General y este a las siguientes direcciones:



- Dirección Administrativa
- Dirección de Planificación
- Dirección de Hacienda
- Dirección Jurídica
- Dirección de Desarrollo Urbano
- Dirección de Gestión Vial
- Dirección de Desarrollo Social

Ilustración II. Organigrama Estructural de la Municipalidad de San Carlos

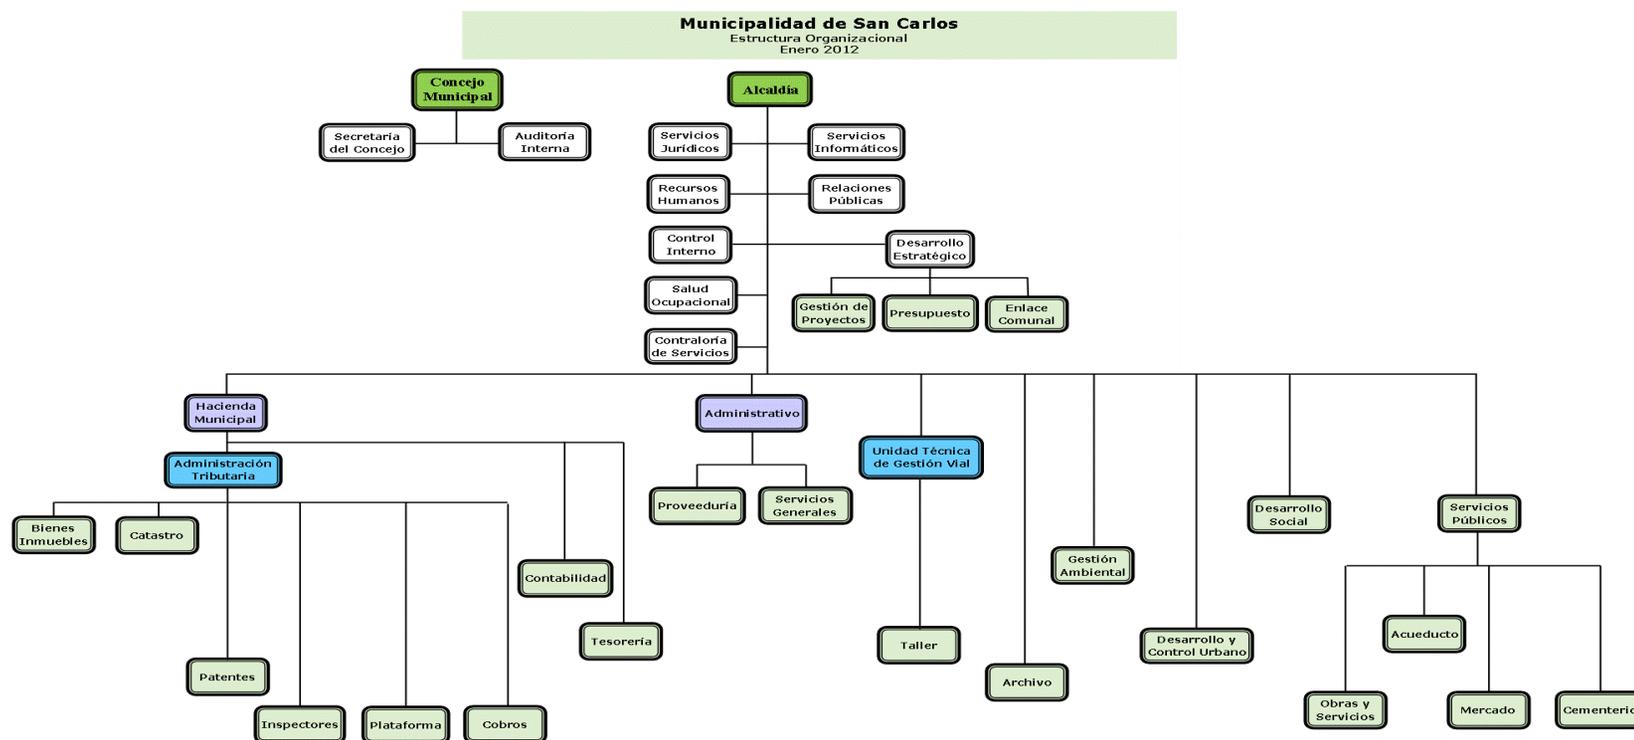

Aprobado por el Concejo Municipal de San Carlos en sesión extraordinaria celebrada el miércoles 28 de marzo del 2012, mediante artículo Nº 02, incisos 1 y 2, Acta Nº 19

Fuente: Municipalidad de San Carlos

2. GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL

Las Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal, funcionan como tales desde el año 2001 con la promulgación de la Ley de Eficiencia Tributaria o ley 8114 (publicada el 9 de julio del 2001, en el Alcance N° 53-A de La Gaceta N° 131), que otorga fondos a las municipalidades del país para su administración en lo referente a viabilidad.

La Unidad Técnica de Gestión Vial cumple funciones como secretaría técnica de la Junta Vial Cantonal, y se constituye como un departamento municipal más.

La UTGV trabaja con un Plan Anual Operativo (PAO) el cual se fundamenta en el machote recomendado por la Contraloría y el mismo trabaja con metas globales, con el objetivo de tener menos códigos presupuestarios y mayor control de los recursos.

Las metas establecidas en el PAO son nueve y se presentan a continuación:


- UTGVM
- Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de caminos de lastre y tierra (por kilómetro)
- Construcción de superficies duraderas (por metros cuadrados)
- Mantenimiento rutinario de la red vial en asfalto (bacheo por toneladas)
- Rehabilitación de sistemas de evacuación pluvial y colocación de alcantarillas (por metros lineales)
- Rehabilitación de sistemas de evacuación pluvial (obras grises, por metros cúbicos de concreto)
- Construcción de puentes (por metros lineales)

- Mantenimiento y rehabilitación de puentes (por metros lineales)
- Atención de casos de emergencia

En la Municipalidad de San Carlos la Unidad Técnica de Gestión Vial se caracteriza por mantener un control meticuloso en la ejecución de obras, así como en el control de combustible, de repuestos y el inventario de maquinaria y equipo.

Así mismo este departamento tiene la siguiente estructura organizativa que le permite definir las distintas maneras de dividir el trabajo para alcanzar luego la coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos, el cual se muestra en la siguiente ilustración:

Ilustración III. Organigrama Estructural de la Dirección de Gestión Vial

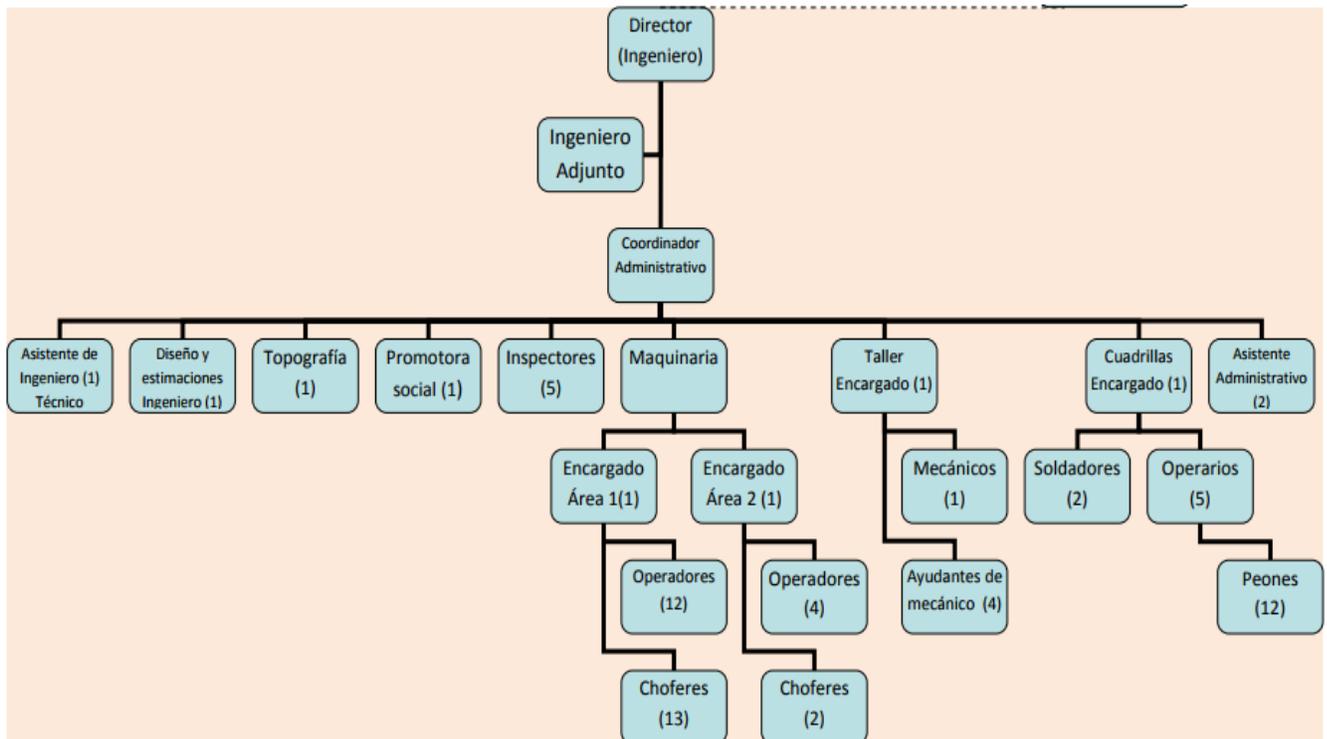

Fuente: Quesada (2018), Manual para la Gestión y Control de Obra Pública



Se establece que cada municipalidad del país debe contar con una Unidad Técnica de Gestión Vial, conformada al menos por: un(a) ingeniero(a) de caminos, un(a) promotor(a) social y un(a) técnico asistente.

Los integrantes de la Dirección de Gestión Vial trabajan bajo la modalidad de ejecución de obras de Conservación Vial Participativa. En la que eventualmente participarían de forma cooperativa, la municipalidad (a través de la Unidad Técnica Vial), el gobierno central, las organizaciones comunales y la sociedad civil del cantón.

Esta modalidad de trabajo requiere que junto a las obras técnicas se desarrollen procesos de organización comunal. Bajo la premisa que esto facilitará la consecución de los objetivos propuestos, dotando además a los vecinos del cantón de la consciencia de su responsabilidad en el desarrollo y conservación de las vías cantonales.

Bajo el Modelo de Conservación Vial Participativa que promueve en la actualidad la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de San Carlos, se ha logrado consolidar un excelente trabajo de equipo bajo la dirección del Ing. Pablo Jiménez Araya. Gracias a la labor que ha venido desplegando dicha Unidad, muchas de las comunidades del Cantón de San Carlos disfrutan hoy de buenos caminos, pues logran trabajar en forma participativa para concretar aquella misión que se ve reflejada en los proyectos viales, teniendo así una mejor calidad de vida para sus habitantes. Hay que destacar el trabajo de muchas horas por parte de los actores involucrados en este Modelo de Conservación Vial, ya que con mucho esfuerzo se ha generado confianza en la labor de los funcionarios municipales, quienes junto a las comunidades han vuelto a tener mejores caminos en el corto y mediano plazo.

B. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO

3. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN QUINQUENAL

A partir del Artículo N° 1 de la Ley General de caminos Públicos N° 5060 se establece le corresponde a las municipalidades la administración la Red Vial Cantonal, el Artículo 4 del Código Municipal menciona la autonomía política, administrativa y financiera que posee la municipalidad, la Ley N° 8114 de “Simplificación y Eficiencia Tributaria” menciona es responsabilidad de las Municipalidades la conservación directa de la Red Vial Cantonal y la ley N° 9329 Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal en su Artículo N° 2 menciona la responsabilidad de los gobiernos locales de cumplir con lo establecido en los planes quinquenales, lo que implica por consiguiente se deben desarrollar Planes Quinquenales de Desarrollo y Conservación de la Red Vial Cantonal, como una herramienta de planificación que establezca los lineamientos a seguir para ejecutar los proyectos propuestos a nivel vial en un plazo de cinco años y así lograr definir las prioridades de intervención de los caminos de acuerdo con la disposición de recursos de la Municipalidad de San Carlos.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema que pretende resolver este trabajo es determinar ¿Cuáles elementos debe incluir la formulación del Plan Quinquenal de Conservación Vial Cantonal 2018 – 2022 para la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de San Carlos, para atender las indicaciones en materia de planificación vial emanadas por la Contraloría General de la República?

5. OBJETIVOS

Los objetivos que persigue este trabajo son los siguientes:

5.1 GENERAL

El objetivo del presente documento es formular el Plan Quinquenal de Conservación Vial Cantonal 2018 – 2022 para la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de San Carlos, atendiendo las indicaciones en materia de planificación vial emanadas por la Contraloría General de la República.

5.2 ESPECÍFICOS

Seguimiento de detalla los objetivos específicos de este trabajo:

1. Construir el marco de generalidades del cantón y de la red vial cantonal que sirvan de insumo para la definición del Plan Quinquenal 2018– 2022 de Conservación Vial Cantonal.
2. Formular los supuestos técnicos, financieros, económicos y de vulnerabilidad a los desastres naturales que sustenten la formulación del Plan Quinquenal 2018 – 2022 de Conservación Vial Cantonal.
3. Identificar las políticas y criterios generales de intervención para el Plan Quinquenal 2018 – 2022 de Conservación Vial Cantonal.
4. Construir la proyección de ingresos para el Plan Quinquenal 2018 – 2022 de Conservación Vial Cantonal.
5. Formular los objetivos, metas, indicadores y proyectos que integren el Plan Quinquenal 2018 – 2022 de Conservación Vial Cantonal.
6. Realizar un análisis de la implementación del plan 2011-2017, con respecto a las metas alcanzadas.

6. ALCANCE DEL DOCUMENTO

El Plan Quinquenal formulado es de competencia de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de San Carlos, determinando las obras a realizar en los próximos cinco años en el cantón, para el periodo 2018 – 2022. Su alcance más detallado incluye la definición específica de cada proyecto vial a desarrollar en el quinquenio especificado, según el tipo de intervención requerida.

7. LIMITACIONES DEL DOCUMENTO

Durante la realización del presente plan quinquenal no fue posible precisar el monto específico de cada proyecto vial, por lo que el plan presenta un presupuesto general y el detalle de cada proyecto por desarrollar.



CAPÍTULO II

Marco Teórico



CAPITULO II. MARCO TEÓRICO

En este apartado se muestra la conceptualización de los elementos que representan el sustento teórico de la investigación, basándose en literatura existente, para facilitar al lector la mejor comprensión del trabajo realizado.

De esta manera se considera primordial empezar por referirse al concepto de planificación y analizar cuál es el estado actual de la planificación, examinando su evolución desde su implementación en la década de los sesenta hasta su posterior adaptación en las empresas.

A. ANTECEDENTES DE LA PLANIFICACIÓN

De acuerdo con Elizagarate (1986), para los años 60 el concepto de planificación hacía énfasis a una planificación empresarial a nivel nacional. Para los años 80 la planificación se distingue como un elemento para el incremento competitivo de las empresas, y se orientaba a sectores empresariales. Ya para los años 90 el concepto de planificación evoluciona al hacer referencia a la globalización de los sectores.

Planificar significa anticipar el curso de acción que ha de tomarse con la finalidad de alcanzar una situación deseada. Tanto la definición de la situación deseada como la selección y el curso de acción forman parte de una secuencia de decisiones y actos que realizados de manera sistemática y ordenada constituyen lo que se denomina el proceso de planificación (BID, EIAP y FGV Brasil, 1985).

La planificación es determinar por adelantado lo que se va hacer y cómo se va hacer.

Se puede considerar que la planificación está formada por un conjunto de decisiones que aborda el futuro específico que los gerentes quieren para sus organizaciones. Cabe decir que la planificación es como una locomotora que arrastra al tren de las actividades de la organización, dirección y el control. (Freeman, 1997).

La planeación, también conocida como planificación o planeamiento, consiste en el proceso a través de cual se analiza la situación actual (dónde estamos), se establecen objetivos (dónde queremos llegar), y se definen las estrategias y cursos de acción (cómo vamos a llegar) necesarios para alcanzar dichos objetivos (CN Crece Negocios.com).

Sea cual sea el tamaño de una empresa o entidad, la planeación es fundamental para el éxito de ésta, ya que sirve como base para las demás funciones administrativas (organización, coordinación y control) y permite reducir la incertidumbre y minimizar los riesgos.

1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE PLANIFICACIÓN

Desde años atrás en la historia siempre ha existido la noción de administración y con ella de planeación. Pero es una noción inconsciente, pues una vez comienza a plasmarse el pensamiento administrativo, se empieza a percibir la importancia de la planeación. Muchos autores se han preocupado por la función de planeación y han desarrollado sus propias definiciones, aunque lo expresan diferente, guardan elementos comunes; todos ellos coinciden en considerar que la planeación se convierte en la función fundamental del proceso administrativo para la supervivencia de la empresa.

Para Koontz, Weihrich y Cannice (2008), planeación consiste en definir los objetivos y metas organizacionales. Para ellos planificar es importante porque se establecen normas y directrices que facilitan el control, además de que los planes proporcionan orientación o dirección para el negocio.

La planeación se puede definir como un puente que comunica el dónde se encuentra la organización y a dónde quiere llegar. Es la determinación consciente de vías de acción. Planear es entonces decidir anticipadamente qué hacer, cuándo, cómo, quién, porque si bien es imposible conocer el futuro, no planear implicaría dejar las diversas situaciones sometidas al azar, a la casualidad y esta lógicamente no es la mejor manera de manejar una empresa.

Por otro lado, Russell Lincoln y Ackoff (1988) son conscientes de la necesidad de planear en las organizaciones, pero además consideran que procurar que esta sea útil es realmente difícil, pues es una de las actividades humanas de mayor complejidad, por lo tanto, equivocarse no es un error, pero conformarse con ello si lo es. Para Ackoff la planeación es "...un proceso de toma de decisiones, pero es igualmente claro que la toma de decisiones no siempre equivale a la planeación".

Ackoff toma a esta función administrativa como lo que hacemos antes de realizar una acción, es decir, es una toma de decisión "anticipada", donde se decide qué va a hacerse y de qué manera, para conseguir determinadas cosas en el futuro, por esto deben tomarse decisiones antes de actuar, pero de lo contrario la planeación no sería necesaria. Finalmente afirma sobre el significado de la planeación, sostiene que "el no hacerlo bien no es un pecado, pero él no hacerlo lo mejor posible, sí lo es".

Chiavenato (1986), describe a la planeación como "la función administrativa que determina anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacerse para alcanzarlos, se trata de un modelo teórico para la acción futura". La considera como la primera función administrativa, pues ella es la base para que se den las demás. La planeación comienza con una definición de los planes con los que se pretenden llevar a cabo.

Considerando las propuestas de los autores previos, la planeación está representada por la unificación de las anteriores definiciones; en ellas son comunes varios aspectos, como los objetivos, la selección de alternativas, pensar a largo plazo, buscar una alianza de algo, responde a preguntas de cómo llego, dónde llego, toma decisiones anticipadas, adelantándose al futuro, busca seleccionar un curso de acción, utilizando procesos, para desencadenar en la toma de decisiones.


Es un proceso que se utiliza en función de un grupo de personas o instituciones, que revive y estima su situación actual, y posteriormente analiza las condiciones futuras de su medio ambiente, sociedad o institución a la que sirven, para desarrollar estrategias organizacionales, políticas, procedimientos, programas, presupuestos que le serán útiles para solucionar los problemas de situaciones que llegasen a presentarse.

De acuerdo con Steiner (1983), “la planeación es un proceso que comienza con el establecimiento de objetivos; define estrategias, políticas y planes detallados para lograrlos, es lo que establece una organización para poner en práctica las decisiones, e incluye una revisión del desempeño y retroalimentación para introducir un nuevo ciclo de planeación”.

2. TIPOS DE PLANEACIÓN

La planeación en una empresa según los niveles jerárquicos básicamente puede ser de tres tipos: planeación estratégica, planeación táctica y planeación operativa.

Ilustración IV. Tipos de Planeación según el Nivel Jerárquico de la Organización

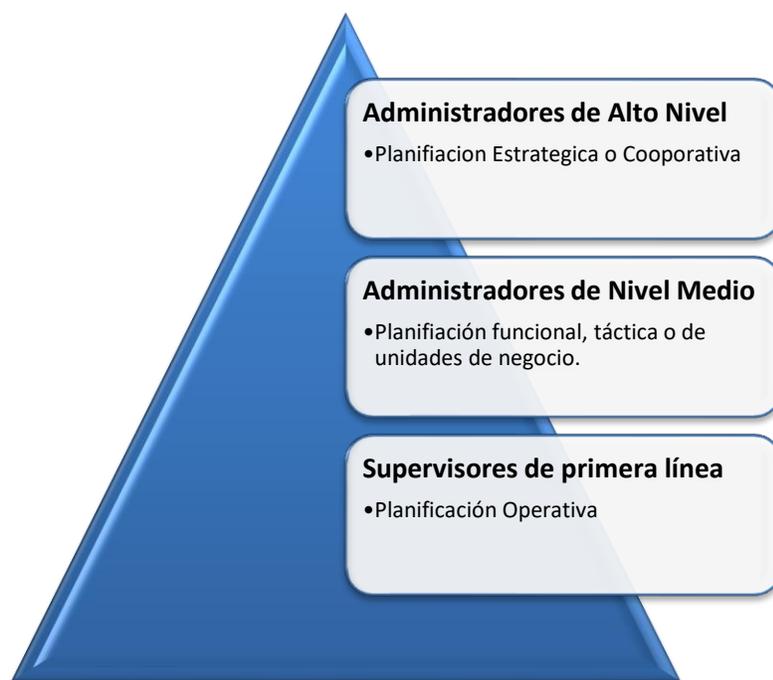

Fuente: Mahoney, Jerdee y Carroll (1965). “The job(s) of Management”.

2.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

En la planeación estratégica se analiza la situación actual, se establecen los objetivos generales de la empresa y se diseñan estrategias, cursos de acción y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos; planes que afectan una gran variedad de actividades y que parecen simples y genéricos.

La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir, considera un enfoque global de la empresa, por lo que debe ser elaborada por la cúpula de la empresa y ser realizada a largo plazo, en teoría, para un periodo de 5 años a más, aunque en la práctica se suele realizar para un periodo de 3 a 5 años, debido a los cambios del mercado.

Para Steiner (1983), sobre los orígenes del planeamiento estratégico, la planeación estratégica formal fue introducida por primera vez a mediados de 1950, en algunas de las empresas comerciales más importantes de aquel tiempo, denominándolo sistema de planeación a largo plazo. Hasta ese entonces era predominante la dirección y planeación de tipo operacional, la cual se centraba en la gestión de áreas específicas, resolviendo problemas a corto y mediano plazo. Pero el tipo de dirección que se llevaba a cabo en los niveles más altos de la organización no era la dirección operacional sino estratégica, aquella que guía, direcciona y pone límites a todo proceso operacional. El planeamiento estratégico viene a ser hoy día uno de los factores fundamentales, si no el principal, de la realización del proceso de dirección estratégica.

2.2 PLANEACIÓN TÁCTICA

En la planeación táctica se analiza la situación actual, se establecen los objetivos específicos o metas de la empresa, y se diseñan estrategias, cursos de acción y planes tácticos necesarios para lograr dichos objetivos; planes que, a diferencia de los planes estratégicos, tienen un alcance más estrecho, limitado y se establecen con mayor detalle.

La planeación táctica se realiza a un nivel funcional, es decir, considera solamente cada departamento o área de la empresa, por lo que debe ser elaborada por los responsables o jefes de cada área y ser realizada a mediano plazo, para un periodo de 1 a 3 años.

✓ DIFERENCIAS ENTRE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA

En la Planificación Estratégica el ámbito de acción es a largo plazo, al igual que la canalización y asignación de recursos y el establecimiento de objetivos. A diferencia la Planificación Táctica tiene un ámbito de acción más restringido, tiene un uso específico de los recursos en función de objetivos también específicos y el establecimiento de objetivos es a corto y mediano plazo.

2.3 PLANEACIÓN OPERATIVA

Es un instrumento indispensable de teorización y organización, en la cual deben contemplar todos los detalles para la ejecución de acciones concretas; se debe planificar antes de actuar sobre una situación o problema para poder transformarla.

La planificación operativa se establece a corto plazo, es específica y está orientada a la consecución del objetivo determinado. La planificación operativa convierte los conceptos generales del plan estratégico en cifras claras, en pasos concretos y en objetivos evaluables a corto plazo. La planificación operativa demanda una aplicación de recursos que sea eficiente y efectiva enfocados en la solución de problemas y consecución de los objetivos establecidos. La planeación operativa se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas específicas que deben realizar las personas en cada una de sus unidades de operaciones (Scribd, 2011).

✓ **IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN OPERACIONAL**

- Permite organizar en frecuencia lógica las actividades y las acciones e igualmente visualizar el tiempo requerido para cada una de ellas.
- Define las funciones y responsabilidades.
- Contribuye a la preparación de un trabajo consiente, editando las improvisaciones, unifica criterios en cuanto a objetivos y metas.
- Prevé la utilización de los recursos: humanos, materiales y equipos

✓ **DIFERENCIAS ENTRE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA**

La planificación estratégica como se mencionó anteriormente se hace a largo plazo, responde a las preguntas ¿Qué hacer? y ¿Cómo hacer? en el largo plazo, y además incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos, estrategias y políticas.

La planificación estratégica se orienta a la eficacia, es decir a maximizar los resultados y el impacto en dirección al cumplimiento de la misión institucional.

La planificación operativa por otro lado es a corto plazo, responde a las preguntas ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Quién?, ¿Dónde? y ¿Con qué? La planificación operativa hace una desagregación del plan estratégico en programas o proyectos específico. Se orienta a la eficiencia, es decir a organizar adecuadamente los recursos de la organización, así mismo trata de maximizar la relación resultado / recursos.

En síntesis, los planes estratégicos afectan a una amplia gama de actividades de la organización y los planes operativos tienen un alcance más estrecho y limitado.

Los planes estratégicos se establecen en términos que parecen simples y genéricos, y los planes operativos se establecen con mayor detalle (Stoner, 1996).

3. PLANES QUINQUENALES

Un Plan Quinquenal hace referencia a un proyecto, plan, o idea que se propone terminar o alcanzar su objetivo en un plazo de cinco años, se trabaja generalmente a nivel gubernamental.

De esta manera se vincula el concepto de Planificación Operativa con un Plan Quinquenal, ya que este último plasma en cada uno de los años un plan operativo en el cual se deben contemplar todos los detalles para la ejecución de acciones concretas.

Los Planes Quinquenales han sido la forma de planificación socioeconómica más importante a nivel mundial. Este tipo de planificación ha resultado muy efectiva a la hora de trazar las vías por las que discurrirá el futuro del país.

En el presente trabajo se desarrolla un Plan Quinquenal de Inversiones, por lo tanto, para acercar más el anterior concepto con el proyecto, se puede decir que el Plan Quinquenal es el instrumento de planificación gubernamental que integra las políticas públicas para alcanzar los objetivos de desarrollo planteados por una determinada Administración, para garantizar el bienestar del país.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el instrumento de planificación gubernamental que integra las políticas públicas para alcanzar los objetivos de desarrollo planteados por una determinada Administración. Es un plan de carácter vinculante y por tanto se constituye en la base para la definición de los Planes Quinquenales; que a su vez determinan los Planes Operativos Institucionales que se traducen en Presupuestos Anuales de las entidades.

El Plan Quinquenal de Gestión Vial Municipal, es una herramienta de Planificación que establece los pasos necesarios para lograr las metas y objetivos propuestos en el área de conservación vial en un plazo de cinco años, estos planes se desarrollan en cada una de las municipalidades del país. Permite definir las prioridades de intervención de los caminos de acuerdo con la disposición de recursos.

B. MARCO METODOLÓGICO

Es importante conocer la conceptualización de algunos elementos básicos de la metodología utilizada para la elaboración del presente trabajo, que le dan validez, de manera que le permita al lector comprender los conceptos utilizados que en muchas ocasiones son ambiguos y poco comunes.

1. METODOLOGÍA

El termino metodología está compuesto del vocablo “método” y es sustantivo griego “logos”. Este último significa explicación, juicio, tratado, estudio. Al unirse el vocablo y el sustantivo se forma la palabra METODOLOGIA, que significa el estudio de los métodos; es decir, la metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación, de controlar sus resultados y de presentar posibles soluciones a un problema que conlleva la toma de decisiones. En términos más sencillos se trata de la guía que nos va indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo de investigación.

2. INVESTIGACIÓN

La investigación es un proceso que se ha utilizado a lo largo de la historia para averiguar datos, de los cuales no se conoce información o también para conocer más acerca de ellos, según (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 4) *“la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno”*.

La investigación puede presentar dos tipos de enfoque, ya sea cuantitativo (trabaja con números) o cualitativo (utiliza datos). En este caso se presenta un enfoque cualitativo para la confección de la investigación.


En el contexto de la investigación son muchas las metodologías que es posible seguir, sin embargo, existen 2 grandes grupos que incluyen a otras más específicas. Se trata de la metodología de investigación cuantitativa y la cualitativa, las cuales se detallan a continuación:

2.1 ENFOQUE CUALITATIVO

Este tipo de enfoque posee algunas características entre ellas destaca: se basa en la recolección de datos no estandarizados, sin medición numérica, en el proceso del desarrollo de la interpretación se pueden ajustar o definir las preguntas de investigación. La investigación cualitativa según (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010, págs. 16-17) “proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas”.

La imagen que se muestra a continuación presenta las fases que se deben llevar a cabo para el proceso cualitativo:

Ilustración V Proceso Cualitativo

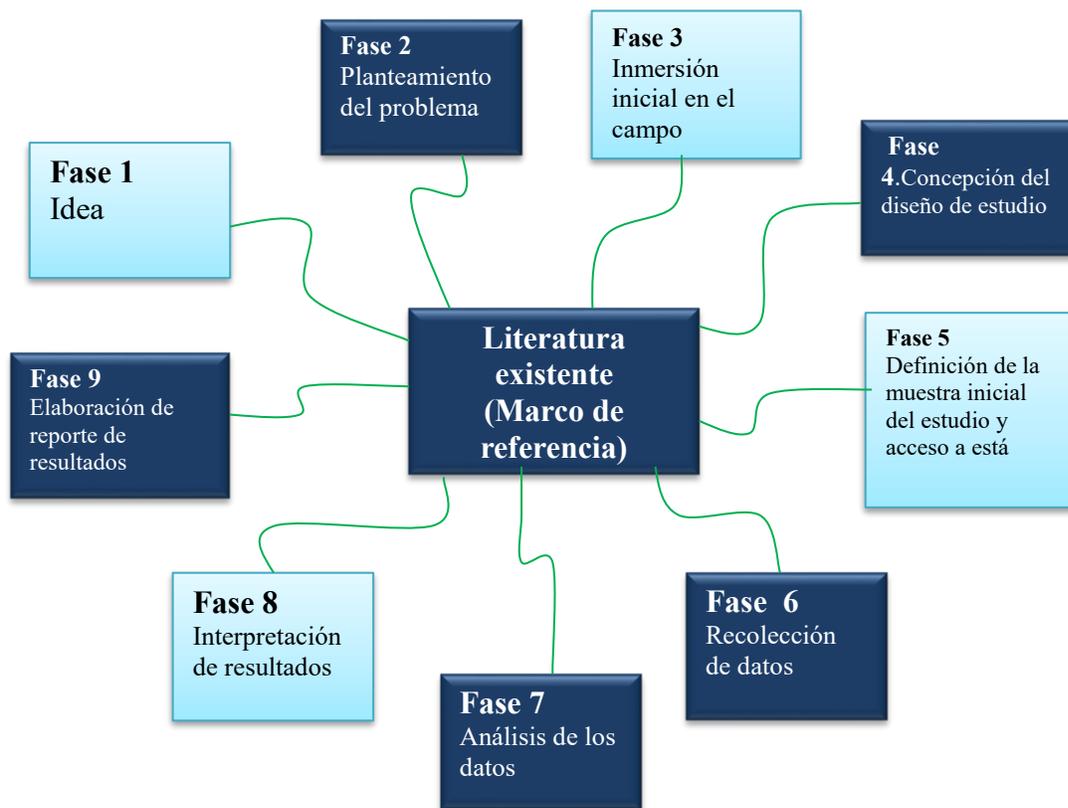

Fuente (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 8)

3.3. ENFOQUE CUANTITATIVO

El enfoque cuantitativo se basa en la medición numérica y el análisis estadístico, este

tipo de investigación puede generar varias hipótesis, las cuales son sometidas a prueba para verificar su efectividad. Este es un enfoque muy objetivo y sigue un proceso estructurado. Según (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 4), *“usa la recolección de datos para proba hipótesis, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”*

La diferencia más importante entre la metodología cuantitativa y la cualitativa radica en que la primera logra sus conclusiones a través de la correlación entre variables cuantificadas, y así poder realizar generalizaciones y producir datos objetivos, mientras que la segunda estudia la relación entre las variables obtenidas a partir de la observación en contextos estructurales y situacionales y admite subjetividad (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2007).

A fin de decidir qué tipo de metodología es necesario utilizar para una determinada investigación, el investigador debe considerar varios aspectos como por ejemplo los resultados que se espera obtener, quienes son los interesados en conocerlos, la naturaleza misma del proyecto, entre otras.

3. ALCANCES METODOLÓGICOS

Una investigación puede tener diferentes tipos de alcance, este va a depender del tipo de estudio y la estrategia que se pretende utilizar, sin embargo, se pueden utilizar combinaciones de alcances. Según (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010, págs. 78-84) existen cuatro alcances que puede tener una investigación:

- **EXPLORATORIOS**

Se realizan con el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o inclusive o se ha abordado antes.

- **DESCRIPTIVOS**

Buscan explicar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice.

- **CORRELACIONALES**

Asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o población, tienen como fin determinar en ocasiones de dos variables, pero por lo general se realizan estudios de tres, cuatro o más variables.

- **EXPLICATIVOS**

Pretenden establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Este se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se presenta.

Una vez definido el alcance en una investigación se requieren de fuentes de información.

4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Al intentar comprender la definición que se hace de lo que es una metodología, resulta de suma importancia tener en cuenta que una metodología no es lo mismo que la técnica de investigación. Las técnicas son parte de una metodología, y se define como aquellos procedimientos que se utilizan para llevar a cabo la metodología, por lo tanto, como es posible intuir, es uno de los muchos elementos que incluye.

Algunas de las técnicas que se pueden utilizar en una investigación son:

La Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.


La Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación.

La Encuesta: La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003).

5. FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes de información son todas aquellas herramientas utilizadas para la conseguir la información, datos en las cuales se basa la investigación, existen dos tipos de fuentes las cuales se detallan a continuación:


Ilustración VI Fuentes de información.

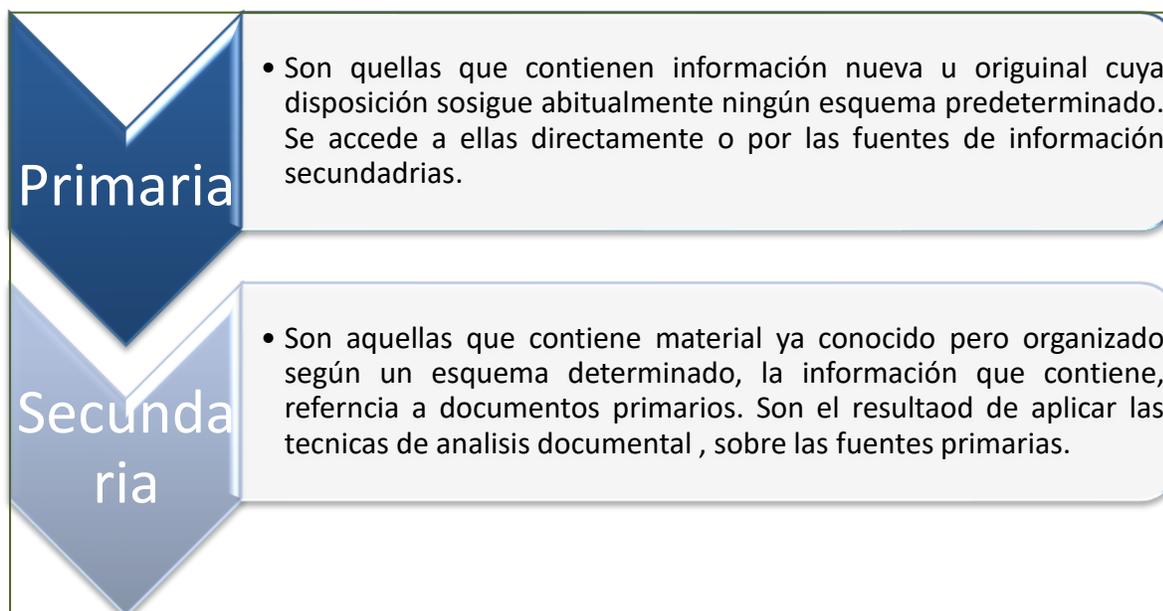

Fuente: Hernández S., Fernández C., & Baptista L. (2006)

Algunos ejemplos de elementos mediante los cuales se puede recolectar información primaria y secundaria pueden ser:

Ilustración VII Ejemplos de fuentes primarias y secundarias. tes primarias y secundarias.

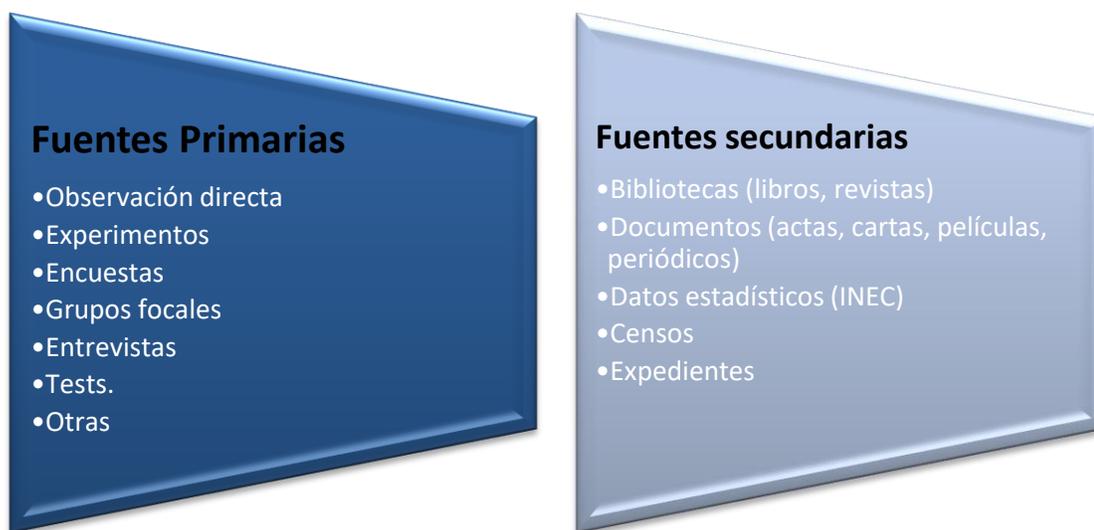

Fuente. Basada en (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010, págs. 53-58)

6. SUJETOS Y FUENTES DE INVESTIGACIÓN

Para la obtención de la información requerida se necesita contar, tanto con fuentes como con sujetos de investigación. Esto por cuanto las fuentes están respaldadas por investigaciones previas que presentan información básica para descubrir nuevos campos a explorar dentro de la indagación que se realiza.

Los sujetos de investigación son validadores del material consultado que con fundamento y propiedad validan los datos encontrados en las fuentes consultadas. Los sujetos de investigación son personas físicas que de una u otra forma brindan información para desarrollar de la mejor manera esta indagación, con el fin de determinar las causas y posibles soluciones del problema planteado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003).

Para la elaboración del marco teórico del presente trabajo se tomaron como base varios libros relacionados con el tema, fundamentando los conceptos y metodologías implementadas en esta investigación, dando validez al trabajo y permitiendo una mayor comprensión a sus lectores.



CAPÍTULO III

Marco Legal



CAPITULO III. MARCO LEGAL

En el presente capítulo se detalla una serie de legislaciones que debe cumplir la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal con respecto a la gestión de infraestructura vial y la administración de recursos para inversión pública en la Red Vial Cantonal.

A. GENERALIDADES

En primera instancia, en forma muy general se puede hablar de la Ley N° 7794, o Código Municipal, del 30 de abril de 1998, la cual establece los aspectos generales de incumbencia municipal. Cita como atribución del Concejo Municipal (Artículo 13, inciso a) el “fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de gobierno inscrito por el Alcalde Municipal para el período por el cual fue elegido y mediante la participación de los vecinos”. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 17 de la ley General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, N° 8801 del 28 de abril de 2010).

Con respecto a los Concejos de Distrito, el Artículo 57 establece una serie de funciones de las cuales destacan el “b) Recomendar al Concejo Municipal el orden de prioridad para ejecutar obras públicas en el distrito, en los casos en que las instituciones estatales desconcentren sus decisiones; y c) Proponer al Concejo Municipal la forma de utilizar otros recursos públicos destinados al respectivo distrito”.

Por otro lado, la Ley General de Caminos Públicos N° 5060, clasifica a estos según su función en Red Vial Nacional y Red Vial Cantonal. En el Capítulo I, Artículo 1 determina la Red Vial Cantonal es administrada por las municipalidades.

B. TIPOLOGÍA DE LA RED VIAL

La Red Vial Nacional es la que está administrada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a través del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) según la Ley N° 7798. Dicho Consejo se crea con el objetivo de planear, programar administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación y la construcción de la Red Vial Nacional. En el Artículo 1 define, “la presente ley regula la construcción y conservación de las carreteras, calles de travesía y puentes de la red vial nacional”.

La Red Vial Nacional está constituida por las siguientes clases de caminos públicos:

- **Carreteras Primarias:** Red de rutas troncales, que sirven como corredores caracterizados por volúmenes de tránsito relativamente altos y con una alta proporción de viajes internacionales, interprovinciales o de larga distancia.
- **Carreteras Secundarias:** Rutas que conectan cabeceras cantonales importantes no servidas por carreteras primarias, así como otros centros de población, producción o turismo, que generen una cantidad considerable de viajes interregionales o Inter cantonales.
- **Carreteras Terciarias:** Rutas que sirven de colectoras del tránsito para las carreteras primarias y secundarias, y que constituyen las vías principales para los viajes dentro de una región, o entre distritos importantes.

La Ley N° 7798 en el Artículo 22, establece la importancia de cumplir las siguientes prioridades a la hora de usar el financiamiento con fondos locales, de igual manera exceptúa el financiamiento con préstamos internos y externos para fines específicos de la construcción de obras nuevas:

- Conservación.
- Mantenimiento rutinario.
- Mantenimiento periódico.

- Mejoramiento.
- Rehabilitación.
- Construcción de obras viales nuevas

La Red Vial Cantonal de acuerdo al Artículo N° 1 de la Ley General de Caminos Públicos N° 5060, del 22 de agosto de 1972 y el Artículo 4 del Código Municipal, se establece que las Municipalidades son responsables directas de la conservación de la Red Vial Cantonal y que estará constituida por los siguientes caminos públicos, no incluidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes dentro de la Red vial nacional:

- **Caminos vecinales:** Caminos públicos que suministren acceso directo a fincas y a otras actividades económicas rurales; unen caseríos y poblados con la Red vial nacional, y se caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales de corta distancia.
- **Calles locales:** Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no clasificadas como travesías urbanas de la Red Vial Nacional.
- **Caminos no clasificados:** Caminos públicos no clasificados dentro de las categorías descritas anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas veredas, que proporcionen acceso a muy pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento y mejoramiento.

Lo anterior, reformado por Ley No. 6676 del 18 de setiembre de 1981

C. LEY 8114 DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA Y SU REGLAMENTO

Asimismo, la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria N° 8114 y su Reglamento, también establece dicha responsabilidad para los municipios, sin embargo, se le permite al MOPT seguir ejerciendo su rol rector, con el compromiso de velar a través de sus unidades asesoras, sobre la planificación, regulación y control a largo plazo de la buena marcha de los proyectos cantonales.

En materia vial cantonal, la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, del 4 de julio del 2001, es el cuerpo jurídico que en su Artículo 5 establece el destino de los recursos de la carga tributaria que pesa sobre los combustibles. Precisamente en sus incisos a) y b) se establece que: del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único del combustible, se destinara.

“a) Un veintiuno coma setenta y cinco por ciento (21,75%) a favor del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para la atención de la red vial nacional, los cuales se destinarán exclusivamente a la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento, la rehabilitación y la construcción de obras viales nuevas de la red vial nacional.

b) Un veintidós coma veinticinco por ciento (22,25%) a favor de las municipalidades para la atención de la red vial cantonal, monto que se destinará exclusivamente a la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación. Una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se utilizarán para construir obras viales nuevas de la red vial cantonal.

(Así reformado por el artículo 12 de la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, N° 9329 del 15 de octubre de 2015)”.

El 22.25% que se va a destinar a las municipalidades se realiza mediante la Tesorería Nacional en 3 parámetros: el 50% se determina según la extensión de la red vial de cada cantón y registró en el MOPT, el 35% se asigna según el Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS) elaborado por el Ministerio de Planificación y Política Económica

(Mideplán). De esta manera se asignará a los cantones con menor IDS proporcionalmente mayores recursos. Finalmente, el 15% restante se distribuirá en partes iguales a las municipalidades.

Así mismo la ejecución de los recursos se realiza bajo la modalidad participativa, en cada municipalidad deberá de existir una Junta Vial Cantonal o Distrital nombrada por el Concejo Municipal.

Es importante mencionar se consideran como parte de la Red Vial Cantonal, todos los caminos y calles que están bajo la administración de los gobiernos locales en este caso la Municipalidad de San Carlos, de igual manera se establecen como parte de la red vial las aceras, ciclo vías, pasos, rutas peatonales, áreas verdes y de ornato, el señalamiento vertical y horizontal, los puentes y demás estructuras de drenaje y retención y las obras geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los caminos.

Por otro lado, el Decreto N° 34624-MOPT, “Regulación a lo Estipulado en el Artículo 5°, inciso b) de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, N° 8114”; publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 138, del 17 de julio del 2008. Con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política y con fundamento en la Ley de Simplificación Tributaria, N° 8114, publicada en el Alcance N° 53ª, La Gaceta N° 131, del 9 de julio del 2001 y la Ley de creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes N° 4786 del 5 de julio de 1971 y la Ley General de la Administración Pública N° 6227 del 2 de mayo de 1978”, se crea para mejorar la eficiencia en la programación y ejecución de los fondos suministrados por el Gobierno Central de acuerdo a la Ley 8114, el cual rige como un instrumento para el manejo de tales fondos. Este decreto está estrechamente vinculado con el tema de red vial cantonal, y es el principal cuerpo normativo que rige la materia.

Valen rescatar algunas aportaciones del reglamento:

Artículo 3. Definiciones

Aseguramiento de calidad: *Combinación del control de calidad realizado por el contratista y del proceso de verificación de control de calidad realizado por parte de la Administración.*

Autocontrol de calidad: *Es el plan de control de calidad que un contratista debe aplicar a una obra por contrato, debidamente aprobado por la Administración contratante a la que deberá presentar sus resultados.*

Calles locales: *Son las vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, o incluidas dentro de proyectos de urbanización, que cuenten con el aval del gobierno municipal correspondiente y que no estén clasificadas por el CONAVI como calles de travesía de la Red Vial Nacional.*

Caminos no clasificados: *Comprende dos tipos diferentes de vías públicas: Las que están en uso y son transitables en toda época del año y las veredas y caminos en desuso para el tránsito vehicular.*

Caminos vecinales: *Son aquellos caminos de la Red Vial Cantonal, que unen poblados y caseríos entre sí, o con las cabeceras de distrito, brindan conexión a rutas nacionales o comunican con sitios de interés público y complementan el concepto de conectividad de la red vial, para dar acceso a una zona o región. Por lo general poseen volúmenes de tránsito moderado, en su mayoría ocasionado por viajes locales de corta distancia. Permiten el traslado de la producción agropecuaria, turística e industrial a las carreteras de categoría superior.*

Casos de ejecución inmediata: *Comprende la reparación de cualquier daño que pueda presentarse en la vía por eventos imprevistos a causa de casos fortuitos o fuerza mayor, que, por su naturaleza, no estén contemplados dentro del programa anual de trabajo. La ejecución inmediata de las reparaciones es necesaria para la seguridad de los usuarios, para garantizar el tránsito de la vía y así evitar daños mayores.*

Conservación vial: Es el conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se garantice un óptimo servicio al usuario. La Conservación Vial comprende el mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico y la rehabilitación de los diferentes componentes de la vía.

Control de calidad: Es el conjunto de acciones cualitativas y cuantitativas destinadas a medir y comprobar que las características de una obra, parte de ella o un servicio cumpla con los requerimientos establecidos. Desarrollo de la red vial cantonal: Constituye el conjunto de acciones que es necesario emprender para adaptar las condiciones de la red vial cantonal a las necesidades producto del crecimiento del volumen de tránsito, crecimiento de la población y crecimiento de la producción derivadas o proyectadas de los planes de desarrollo del cantón, del crecimiento habitacional, en particular de los planes de tránsito y transporte.

Gestión vial: Es el conjunto de obras o acciones necesarias, para alcanzar una meta de conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabilitación o construcción vial, según el detalle contenido en las definiciones del presente artículo, que debe ser planificada y evaluada, con participación de los usuarios. Responde al qué hay que hacer, dónde, en qué forma y cuándo.

Gobiernos Locales: Estructura pública que tiene la competencia de administración de los intereses y servicios locales dentro de un territorio específico, sea éste a nivel cantonal o distrital.

Mantenimiento periódico: Es el conjunto de actividades programables cada cierto período, tendientes a renovar la condición original y de los pavimentos mediante la aplicación de capas adicionales de material granular tratamientos superficiales, sellos o recarpeteos asfálticos, según sea el caso, sin alterar la estructura subyacente a la capa de ruedo, así como la restauración de taludes de corte y de relleno, señalamiento en mal estado, aceras, ciclo vías obras de protección u otras necesarias para la seguridad vial y peatonal. El mantenimiento periódico de los puentes incluye la limpieza, pintura, reparación o cambio de los componentes estructurales o de protección, así como la limpieza del cauce del río o quebrada, en las zonas aledañas.

Mantenimiento rutinario: Es el conjunto de actividades que deben ejecutarse con mucha frecuencia durante todo el año, para preservar la condición operativa de la vía, su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios. Está constituido por la limpieza de drenajes, el control de la vegetación, las reparaciones menores de los pavimentos de concreto asfáltico, concreto hidráulico, y de tratamientos superficiales bituminosos, el bacheo manual o mecanizado de las superficies de ruedo constituidas por materiales granulares expuestos, aceras, ciclovías, el mantenimiento ligero de los puentes, las obras de protección u otras necesarias para la seguridad vial y peatonal, y demás obras de arte, así como la restitución de la demarcación y el señalamiento.

Mejoramiento: Es el conjunto de mejoras o modificaciones de los estándares horizontales y/o verticales de los caminos, relacionados con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, la velocidad de circulación y aumentar la seguridad de los vehículos. También se incluyen dentro de esta categoría, la ampliación de la calzada, el cambio del tipo de superficie de tierra a material granular expuesto o de este a pavimento bituminoso o de concreto hidráulico entre otros, y la construcción de estructuras tales como alcantarillas mayores, puentes, intersecciones, espaldones, aceras, ciclo vías, cunetas, cordón y caño.

Modalidad participativa de ejecución de obras: Se conoce también como Conservación Vial Participativa se refiere a la coordinación y cooperación que se establece entre la Municipalidad, el Gobierno Central y las organizaciones comunales y la sociedad civil de un cantón, con la finalidad de planificar, ejecutar, controlar y evaluar obras de diversa índole, contempladas dentro de la conservación y construcción vial en el entendido que la ejecución de recursos no implica el traslado horizontal de los mismos de una organización a otra. Su aplicación contribuye a garantizar la sostenibilidad de las vías, ya que además de los recursos del Gobierno y la Municipalidad, permite incorporar los valiosos aportes de las comunidades y la sociedad civil en general, en efectivo o en especie. Esta modalidad, requiere acompañar las obras técnicas con otros elementos como organización, capacitación, promoción y control social, que motiven el interés de los usuarios, la cooperación y la solidaridad.

Obras nuevas: Son las construcciones de vías públicas que se incorporan a la red vial cantonal existente, como producto de nuevos proyectos de urbanización o de nuevas interconexiones urbanas y rurales, entre otras.

Reconstrucción: Es la renovación completa de la estructura de la vía, con previa demolición parcial o total de la estructura del pavimento, las estructuras de puente, los sistemas de drenaje y las obras de arte.

Red vial cantonal: Es la red de calles y caminos públicos que no forman parte de la Red Vial Nacional y cuya administración es de responsabilidad municipal en lo que corresponde. Se consideran parte de la Red Vial Cantonal todos los elementos constitutivos de su derecho de vía, tales como calzada; espaldones; zonas verdes; puentes viales y peatonales, fijos o colgantes; aceras; ciclo vías; sistema de drenaje; cordón y caño; obras de estabilización o contención; túneles; entre otros que técnicamente puedan considerarse.

Rehabilitación: Reparación selectiva y refuerzo del pavimento o de la calzada, previa demolición parcial de la estructura existente, con el objeto de restablecer su capacidad estructural y la calidad de ruedo originales. Considera también la construcción o reconstrucción de aceras, ciclovías u otras necesarias para la seguridad vial y peatonal, sistemas de drenaje. Antes de cualquier rehabilitación en la superficie de ruedo, deberá verificarse que los sistemas de drenaje el sistema de drenaje funcione bien. En el caso de los puentes y alcantarillas mayores, la rehabilitación comprende las reparaciones mayores tales como el cambio de elementos o componentes estructurales principales, el cambio de la losa del piso, la reparación mayor de los bastiones, delantales u otros. En el caso de muros de contención se refiere a la reparación o cambio de las secciones dañadas o a su reforzamiento, posterior al análisis de estabilidad correspondiente.

Sistema de Gestión Vial Integrado: Es el conjunto de procedimientos, rutinas, actividades y mecanismos de archivo y manejo de información, que aunado a programas de cómputo constituyen las herramientas para la gestión vial.

Verificación de calidad: *Es el control de calidad que la Administración debe aplicar a una obra por contrato o por administración.”*

Artículo 4. Destino de los recursos.

“El Concejo a propuesta de la Junta Vial Cantonal destinarán los recursos provenientes de la Ley ... exclusivamente a la conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación; una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se usarán para construir obras viales nuevas de la red vial cantonal , que se entenderá como los caminos vecinales, los no clasificados y las calles urbanas, según las bases de datos de la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).”

Artículo 6. Planes de Desarrollo y Conservación de la Red Vial Cantonal.

“Las Juntas Viales Cantonales formularán Planes Quinquenales y Anuales de Conservación y Desarrollo Vial, en concordancia con las políticas y directrices emitidas por el Concejo, el MOPT y los Planes Reguladores de Desarrollo Cantonal vigente.

Estos planes tendrán al menos lo siguiente:

- a) El marco de políticas que le dan respaldo, con indicación de metas, indicadores de logro y modalidad de ejecución a utilizar. El presupuesto y las fuentes de financiamiento, con referencia a los aportes de la Municipalidad, del MOPT y de las comunidades beneficiadas.*
- b) Los montos por invertir en cada proyecto, según categoría y tipo de obra*
- c) El plan de mantenimiento y rehabilitación vial.*
- d) Formas de seguimiento y evaluación de los planes. La participación activa de los usuarios y del MOPT.*

e) Los planes de desarrollo vial, con base en los Planes Reguladores y/o Planes de Desarrollo Local.”

Artículo 7. Modalidades de Ejecución de Obras.

Las modalidades de ejecución de obras podrán ser, entre otras, las siguientes:

- a) Obras por administración, con equipo y personal propios.*
- b) Obras por convenio, con participación de las comunidades, el MOPT y otras organizaciones públicas o privadas.*
- c) Obras por contrato, con sus debidos carteles y reglamentación.*
- d) Concesión o gestión interesada de obras y proyectos.*
- e) Combinaciones de las anteriores.*

Artículo 8. Preferencia por la Modalidad Participativa de Ejecución de Obras

“Los recursos provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, deben ejecutarse preferiblemente bajo la Modalidad Participativa de Ejecución de Obras, que se define en el artículo 3, de este Reglamento...”

Artículos 9, 10, 11 y 12. Junta Vial Cantonal.

La Junta Vial Cantonal es un órgano público, no estatal, nombrado por el Concejo de cada cantón y es un órgano de consulta en la planificación y evaluación en materia de obra pública vial en el cantón y de servicio vial municipal. Se integra ad honorem por el Alcalde (quien preside), miembro del Concejo, el Ingeniero Regional del MOPT, un representante de Concejos de Distrito (electo por estos en Asamblea), un representante de las Asociaciones de Desarrollo (electo por el Concejo de una terna remitida por la Asamblea de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal), un representante de las cámaras del sector privado con sede en el cantón (electo por el Concejo de una terna remitida por una asamblea de cámaras), un representante de la comunidad de usuarios (elegido en una Asamblea Pública y abierta, convocada por el Concejo) y el Director de Gestión Vial Municipal, con voz pero sin voto.

Las decisiones se toman por mayoría simple (salvo que la legislación establezca algo distinto) y el presidente tiene voto doble en caso de empate.

Los miembros de la Junta Vial Cantonal se desempeñarán gratuitamente, por un período fijo de cuatro años y podrán ser reelectos.

Son responsabilidades de la Junta Vial Cantonal (artículo 12):

“a) Proponer al Concejo, el destino de los recursos referidos en los artículos 4 y 9 del presente Reglamento, por medio de planes anuales y quinquenales de conservación y de desarrollo vial del cantón. Dichos planes serán remitidos al Concejo para la aprobación o improbación respectiva, en este último caso deberá fundamentarse técnica y legalmente para que se proceda con la subsanación correspondiente en un plazo de diez días hábiles. Estas propuestas o planes deberán considerar la prioridad que fija el artículo 5, inciso b) de la Ley Nº 8114.

b) Conocer y avalar los proyectos de presupuesto anual de la gestión de la Red Vial Cantonal correspondiente, los cuales serán formulados por la UTGVM y contendrán el detalle de las obras a intervenir con indicación expresa, al menos, de lo siguiente: nombre de la obra, descripción, meta a alcanzar, modalidad de ejecución, costo total, monto presupuestado, plazo estimado y probable fecha de inicio.

c) Velar por el cumplimiento de las políticas, normativa y reglamentación aplicable en gestión vial, emitida por el MOPT y otros entes competentes.

d) Conocer los informes mensuales de la evaluación de la Gestión Vial Municipal, que prepare la UTGVM.

e) Las que expresamente le fueren conferidas por el Concejo.

f) Presentar en el mes de enero ante el Concejo Municipal un informe anual de rendición de cuentas. Con el mismo propósito, publicará durante ese mismo mes, en un medio de comunicación colectiva, local o nacional, un resumen o el texto íntegro del informe anual de labores, así como la convocatoria para asamblea pública y abierta, que deberá realizarse a más tardar un mes después de esta publicación, en la que la JVC presentará el informe de rendición de cuentas.

g) Solicitar al Concejo la realización de auditorías financieras y técnicas cuando las circunstancias lo ameriten.

h) Velar porque las actividades de diseño, construcción y planeamiento estratégico sean desarrolladas por profesionales competentes e idóneos.

i) Velar porque se apliquen principios de aseguramiento de calidad para garantizar la eficiencia de las obras.

j) Acatar lineamientos del MOPT para el inventario, clasificación y referencia de la red vial cantonal, y suministrar dichos inventarios periódicamente al MOPT.

k) Proponer al Concejo Municipal la reglamentación que considere pertinente para la efectiva Gestión Vial Cantonal”

Artículos 13. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.

Esta fungirá como secretaría técnica de la Junta Vial Cantonal, y debe contar al menos con un director que corresponde al profesional en Ingeniería Civil, un Técnico Asistente y un Promotor Social profesional en ciencias sociales; su operación se incluye en el Plan Anual Operativo de cada municipio y los recursos para su operación se desprenden de lo dispuesto en la Ley 8114.

Artículo 15. Seguimiento y evaluación de la Gestión Vial.

“El MOPT pondrá a disposición de las municipalidades el SIGVI o su equivalente, como herramienta estandarizada y ágil para la evaluación, planificación y programación de sus proyectos. La Junta Vial Cantonal deberá realizar el seguimiento y la evaluación de los planes anuales, apoyándose en la información del Sistema de Gestión Vial de la municipalidad”

Artículo 17. Competencia o Rol del MOPT en la Red Vial.

Las siguientes funciones, entre muchas que ejecuta el MOPT en materia vial, son las relacionadas con las municipalidades, la conservación de la red vial cantonal y por ende con la elaboración de los Planes Quinquenales:

“a) Asesorar a las Juntas Viales Cantonales en la elaboración de los Planes de Desarrollo y Conservación de la Red Vial Cantonal, por medio de sus Direcciones Regionales y otras dependencias competentes.”

b) Emitir directrices y políticas para el desarrollo y funcionamiento eficiente de la red vial nacional y cantonal del país, que faciliten la coordinación y uniformidad de criterios de gestión y uso.

c) Definir, mediante la Dirección de Planificación Sectorial, los criterios para la clasificación funcional y nomenclatura de la red vial y clasificarla.

d) Velar porque las redes viales nacional y cantonal del país, se desarrollen en forma complementaria, independientemente de los límites político-administrativos cantonales o provinciales.

f) Emitir, mediante la División de Obras Públicas, las normas, procedimientos y recomendaciones técnicas que rigen la infraestructura vial del país, que garanticen la calidad del servicio, seguridad y estándares acordes con la naturaleza de las vías y las condiciones locales. Esta documentación técnica debe ser comunicada por esta División a las municipalidades y a otros interesados.

h) Mantener, mediante la Dirección de Planificación Sectorial, una base de datos actualizada sobre los inventarios de la red vial, con base en los inventarios de la Red Vial Cantonal realizados por las dependencias competentes de la División de Obras Públicas, con el apoyo de las municipalidades. Asimismo, la Dirección de Planificación Sectorial integrará los inventarios realizados por el CONAVI en la Red Vial Nacional, de manera que su manejo permita la obtención de información y estadísticas relevantes para proyectos y evaluaciones de interés cantonal o nacional.

i) Propiciar la implementación de programas de innovación y transferencia de tecnología que beneficien la gestión vial al nivel nacional y cantonal, dirigidos a las municipalidades, organizaciones comunales y a la empresa privada, según corresponda.

j) Mantener en operación, por parte de la División de Obras Públicas, un Sistema de Gestión Vial (SIGVI o similar) aplicable en la Institución y en las municipalidades para los procesos de conservación y desarrollo de la red vial de todo el país, diferenciado según región y características particulares. Este deberá comprender los costos y tarifas para las diferentes actividades, normas de ejecución, normas de intervención y estándares de desempeño.”

Entre otras funciones establecidas en el Artículo anterior.

Artículo 18. Estimación de los recursos a transferir a las municipalidades

En este Artículo se establece cuáles son los fondos que son destinados a las municipalidades por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes con base en la Ley 8114.

“Cada año en calidad de responsable del Sector Transporte, mediante la Dirección de Planificación Sectorial, el MOPT se encargará de hacer las estimaciones de los montos a transferir a cada Municipalidad, con base en los criterios establecidos en la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias y la certificación de ingresos públicos de la Contraloría General de la República.”

Artículo 19. Registro Vial.

El Registro Vial de Costa Rica fue creado como una dependiente de la Dirección de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el cual se detallará la infraestructura de la Red Vial Cantonal y Nacional del país, estableciendo su clasificación, nomenclatura, extensión, tipo de superficie, estado, señalización, censos de tránsito y condición socioeconómica.

Artículo 20. Constitución de la Red Vial Cantonal.

“La Red Vial Cantonal estará constituida por los caminos públicos no incluidos dentro de la Red Vial Nacional y de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Caminos Públicos. Se compone de a) caminos vecinales o clasificados, b) calles locales y c) caminos no-clasificados.”

Artículo 21. Requisitos para clasificar los caminos vecinales.

En este artículo se determina cuáles son los requisitos que están establecidos para determinar los caminos vecinales.

“Constituyen caminos vecinales o clasificados aquellos que cumplan, al menos, con tres de los siguientes criterios:

- a) Posibilita el acceso a centros de población rural que cuenten con al menos tres de los siguientes servicios o infraestructura física en operación: escuela, plaza de deportes, salón comunal, iglesia, servicio de electricidad, servicio de transporte de pasajeros, puesto de salud, telefonía.*

- b) *La población promedio que tributa al camino debe ser mayor que 50 habitantes/km de extensión del camino, o existen al menos un promedio de 10 casas visibles habitadas por kilómetro de extensión de la vía.*
- c) *El camino debe ser la principal vía de comunicación para el transporte de cosechas y productos del área que tributa al camino Al menos el 50% de esa área estará dedicada activamente a la producción agropecuaria (ganadería intensiva, cultivos) u otras actividades.*
- d) *El TPD debe ser mayor que 30 vehículos.*
- e) *El camino debe ser la vía principal de acceso a toda una zona, cuenca o región que necesita ser comunicada (concepto de red).*
- f) *Otros criterios a considerar en caso de duda: existencia de asociación o asociaciones de desarrollo integral o específica y/o comités de caminos, en la zona de influencia del camino En el caso de los comités de caminos, estos deberán estar adscritos a la Asociación de Desarrollo Integral o a la Municipalidad respectiva.”*

En el Artículo 22 se especifican otros criterios de clasificación para los caminos vecinales que, aunque no cumplan con lo establecido en el Artículo 21, con la respectiva solicitud del Gobierno Municipal, análisis y aprobación de la Dirección de Planificación del MOPT, cumplen al menos uno de los siguientes criterios:

- “a) Dan acceso a sitios calificados de interés turístico (accesos principales a playas y volcanes).*
- b) Sirven como rutas alternas a rutas nacionales de reconocida importancia.*
- c) Dan acceso a reservas de recursos naturales, reservas indígenas o a proyectos de asentamientos campesinos impulsados por el Gobierno de la República o el Gobierno Local.*

- d) *Dan acceso a centros de acopio importantes.*
- e) *Son rutas importantes para la seguridad nacional o el interés nacional como atracaderos, torres de transmisión u observatorios.”*

Artículo 23. Criterios de clasificación para calles locales.

Para realizar la clasificación de las calles locales cada municipalidad puede establecer sus criterios si poseen un reglamento aprobado, en caso de que no haya reglamentación municipal, se aplicará lo establecido en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, del INVU de 1982.

Artículo 24. Caminos no Clasificados en uso.

Los caminos públicos que se encuentren en la categoría no clasificados en uso deben de cumplir una serie de requisitos o criterios que se definen a continuación:

- “a) *Son transitables durante la gran mayoría del año,*
- b) *Dan acceso a algunos caseríos de menor importancia a los que se establecen en el artículo 20 anterior, o a muy pocos usuarios.*
- c) *Tienen un ancho promedio de la superficie de ruedo de al menos 4 metros.*
- d) *Cuentan con algunos elementos de la infraestructura de drenaje (cunetas, alcantarillado primario) o puentes.*
- e) *La superficie de ruedo se encuentra en tierra o con muy poco lastre, pero permite el tránsito de vehículos.*
- f) *Son caminos alternos de poca importancia y que dan acceso a zonas de baja producción agropecuaria.”*

Artículo 25. Caminos no-Clasificados en desuso para el tránsito de vehículos.

El Artículo 25 establece los criterios de la clasificación para los caminos en desuso para el tránsito de vehículos.

“Las vías públicas de esta categoría son aquellas que cumplen con los siguientes requisitos:

- a) Se utilizan para la movilidad y comunicación local, a través de medios de transporte como motocicleta, bicicleta, bestias o peatonal.*
- b) No son aptas para el tránsito vehicular.*
- c) El derecho de vía es muy angosto.*
- d) El derecho de vía está poblado de árboles, arbustos o malezas significando que el camino no está en uso o que es utilizado únicamente en períodos muy cortos del año.*

La conservación de esta red de caminos públicos es responsabilidad entera de los usuarios y beneficiarios directos y por lo tanto su extensión no se contabiliza para efectos de la asignación de recursos del impuesto único a los combustibles, previsto en la Ley de Simplificación Tributaria...”

Artículo 26. Inventario de la Red Vial Cantonal.

El Artículo 26 establece que el inventario de la Red Vial Cantonal le deberá de ejecutar cada gobierno local, considerando lo establecido por la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, una vez se realice el inventario el Alcalde y la Unidad Técnica de Gestión Vial deben de realizar una certificación indicando la información presentada en las boletas y mapas de cada camino concuerdan con la realidad.

Artículo 27. Sistema de Codificación de la Red Vial Cantonal.

“Las vías públicas pertenecientes a la Red Vial Cantonal se codificarán por medio del procedimiento que para tal efecto emitirá la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT.”

Artículo 28. Archivo y manejo de la información.

“La Dirección de Planificación Sectorial del MOPT será la encargada del archivo y el manejo de la información de la red vial costarricense. Previo aporte de los materiales necesarios, las municipalidades tendrán acceso a una copia fiel de esta información, para sus propios archivos

Artículo 29. Actualización de la información.

La Dirección de Planificación Sectorial del MOPT en conjunto con los interesados de la municipalidad y la División de Obras Públicas debe de coordinar la actualización de las bases de datos viales de cada cantón y si existieran dar trámite a las categorías de las vías públicas. Debe de existir comunicación entre el MOPT y el gobierno local en caso de actualización.

Artículo 30. Ingreso de información y comunicación a los interesados

Al 31 de mayo cada año La Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, deberá de presentar un corte y resumen anual mediante el cual comunique el inventario vial a las municipalidades, instituciones del gobierno local y a otros interesados. Es importante se incluya todo el inventario existente y las solicitudes realizadas antes del 31 de enero del año correspondiente.

Artículos 31 al 39. Estándares técnicos para el desarrollo y conservación de los caminos vecinales.

Las municipalidades deben de considerar una serie de requisitos técnicos establecidos para el diseño y definición de las actividades previstas ya sean conservación, mantenimiento o nuevas obras, aplicando las especificaciones generales para la construcción de caminos, carreteras y puentes, además deben considerar las versiones actualizadas de los siguientes reglamentos o disposiciones:

- Las Disposiciones para la Construcción y Conservación Vial Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras.
- Reglamento de Circulación por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga.
- El Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito.
- Las normas y guías de diseño AASHTO o equivalentes.

Están determinados una serie de criterios técnicos se deben de tomar en consideración a la hora de ejecutar las obras, como por ejemplo los estándares mínimos para características geométricas y derecho de vía existentes, estructura de pavimento, sistemas de drenaje, pesos y dimensiones para la estructura de la vía, puentes, rutas para tránsito pesado, obras de arte para la circulación de la fauna y vías en áreas de protección. Se destaca en el Artículo 32 que cualquier variante a los requisitos técnicos establecidos deberá razonarse y justificarse bajo la responsabilidad del profesional responsable de la obra o del diseño.

D. LEY N° 9329

Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, fue aprobada con la finalidad de brindar a los gobiernos locales una atención exclusiva, que está regulada por la Ley N° 5060, Ley General del Caminos Públicos y la Ley N. ° 8801, Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, de 28 de abril de 2010.

Esta legislación establece la responsabilidad que tienen los gobiernos locales de forma plena y exclusiva en la atención de la Red Vial Cantonal, de manera que sean los encargados de todos los procesos relacionados desde planear, organizar, financiar, construir entre otras funciones, para llevar a cabo las metas establecidas en el plan quinquenal de cada municipio y así velar por la conservación y desarrollo de la infraestructura vial del cantón.

En el artículo 4 de esta Ley se establecen los Esquemas de atención de las competencias: *“Esta ley faculta la arrogación y la atribución directa, exclusiva y plena por los gobiernos locales de las competencias relativas a la administración de la red vial cantonal. No obstante, los gobiernos locales podrán ejercer la competencia transferida en esta ley de manera mancomunada, por medio de convenios, federaciones o confederaciones de municipalidades, o cualquier otro mecanismo de gestión municipal establecido en la normativa jurídica nacional o local, incluyendo la creación de unidades ejecutoras intercantonales o regionales”.*

En la Ley N ° 9329 se estipulan las políticas para el manejo del financiamiento de la Red Vial Cantonal. La fuente de recursos se especifica en el Artículo 5 *“Para la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, los gobiernos locales contarán con los recursos incluidos en el artículo 12 de la presente ley, correspondientes al inciso b) del artículo 5 de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001 y sus reformas.*

En ningún caso, el aporte podrá ser menor al uno coma cinco por ciento (1,5%) de los ingresos ordinarios del Gobierno central.

Se incluirán dentro de este monto los aportes en materiales e insumos que realice el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a solicitud de las municipalidades, para la construcción o el mantenimiento de la red vial cantonal”.

En los artículos 6 y 7 de la Ley, se determina la asignación o el giro de los recursos a las municipalidades, los cuales serán brindados a cada gobierno local mediante la Tesorería Nacional, además se establece la legislación para la asignación de recursos a los concejos municipales de distrito.

En el Artículo 10 se establece la coordinación de las direcciones regionales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y los gobiernos locales, ya sea la dirección regional del MOPT o la entidad asignada por el ministerio, son los encargados de coordinar los temas de rectoría técnica, así como la fiscalización de sus actividades de manera que logren brindar la mejor atención a la red vial del cantón. Cabe mencionar la responsabilidad que tiene El Ministerio de Obras Públicas y Transportes en las funciones relacionadas con la red vial cantonal el Artículo 2 menciona *“Sin perjuicio de las potestades del Consejo Nacional de Vialidad, planificar, construir, mantener y mejorar las carreteras y caminos de la red vial nacional. Regular y controlar los derechos de vía de las carreteras de dicha red existentes o en proyecto. Regular, controlar y vigilar el tránsito y el transporte por los caminos públicos. Ejercer la fiscalización y la rectoría técnica en materia de infraestructura vial, en virtud de lo cual debe asesorar y coordinar, con los gobiernos locales, sobre las regulaciones técnicas y logísticas indispensables que atañen a la adecuada funcionalidad de la red vial cantonal, considerada por separado y en integración con la red vial nacional.”*

Con respecto a los recursos utilizados para la construcción y mantenimiento vial se establece en el Artículo 5 de la Ley, que un veintidós coma veinticinco por ciento (22,25%) se asigna a las municipalidades, los montos asignados son para la conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y la rehabilitación. En caso de que ya se hayan cumplido las metas en las áreas antes mencionadas los sobrantes se utilizarán para construir nuevas obras viales en la

comunidad.

El porcentaje asignado a las municipalidades es girado a la municipalidad mediante la Tesorería Nacional considerando los parámetros:

- i. El cincuenta por ciento (50%), según la extensión de la red vial de cada cantón inventariada por los gobiernos locales y debidamente registrada en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
- ii. El treinta y cinco por ciento (35%), según el Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS) elaborado por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán). Los cantones con menor IDS recibirán proporcionalmente mayores recursos.
- iii. El quince por ciento (15%) restante será distribuido en partes iguales a cada una de las municipalidades.

E. DECRETO N° 27917

Después de notificar acerca de lo que recoge el Decreto N° 34624-MOPT, “Regulación a lo Estipulado en el Artículo 5°, inciso b) de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria”, es importante rescatar que otra política que le da respaldo a las actividades ejecutadas por lo municipios como entes encargados de la gestión vial cantonal, es el Decreto N° 27917, “Reestructuración Orgánica y Funcional del Ministerio de Obras Públicas y Transporte”, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 112, del 10 de junio de 1999, el cual modifica la estructura orgánica, organizativa y funcional del MOPT y entre otros se reforma la función de la División de Obras Públicas.

En el Artículo N° 15, se establecen las funciones de obras públicas determinando lo siguiente:

“Considerando que, por una parte el Consejo Nacional de Vialidad es el responsable de la conservación y construcción de la Red Vial Nacional y por otra que las Municipalidades son las responsables de la Red Vial Cantonal, el rol de la División de Obras Públicas pasará a enfocarse en la asistencia técnica y apoyo a los Municipios para la conservación de dicha red, procurando al mismo tiempo que las Municipalidades vayan asumiendo gradualmente sus responsabilidades, en la medida que tengan capacidad financiera y técnica para ese cometido.

Por lo tanto, la División de Obras Públicas es clave para ayudar y canalizar los requerimientos de las Municipalidades en la etapa de transición, para que estas asuman su responsabilidad sobre la Red Cantonal.

Su objetivo es brindar en forma coordinada, la asistencia técnica y el apoyo a las municipalidades y a otras organizaciones del país, para que, en conjunto con éstas, se lleven a cabo las obras públicas necesarias con énfasis en la infraestructura vial cantonal, que permita un desarrollo económico y social del país, acorde con las políticas generales del Gobierno y del Ministerio...”

Para cumplir con las metas establecidas, la División de Obras Públicas debe de estar conformada por una estructura establecida en el Artículo 16, confirmada por las Unidades Asesoras y las Unidades Ejecutoras. Las asesoras les corresponde el planeamiento y programación, control de maquinaria, equipos y la atención de emergencias y desastres. Por otra parte, las Unidades Ejecutoras están conformadas por la Gestión Municipal, Obras Fluviales, Ingeniería, Direcciones Regionales, Edificaciones, y Ayuda Comunal.

F. LEY 8114

Ley General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades.

Cabe rescatar que además de la Ley 8114, “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, del 4 de julio del 2001, existen otras leyes que dan sustento a los recursos financieros que perciben las municipalidades para destinar a obras públicas. En base a lo anterior se puede mencionar la Ley N° 8801 “Ley de Tránsito del Poder Ejecutivo a las Municipalidades” publicada en el alcance N° 7 a la Gaceta N° 85 del 04 de Mayo del 2010, la cual establece en su Artículo N° 1 que esta *Ley “tiene como objeto establecer los principios y las disposiciones generales para ejecutar lo dispuesto en el artículo 170 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, con el fin de transferir recursos del presupuesto de ingresos y gastos de la República y la titularidad de competencias administrativas del Poder Ejecutivo a los gobiernos locales, para contribuir al proceso de descentralización territorial del Estado costarricense”*.

Dentro de los propósitos de esta ley se pretende la modernización del Estado costarricense, tratando de que los servicios públicos que reciben los ciudadanos sean de calidad, brindados de forma eficiente, eficaz y transparente, garantizando un gobierno democrático.

G. LEY N° 7755

La Ley N° 7755, “Control de Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional” la cual establece cual es el procedimiento mediante el cual en su Artículo 1°:

“La ley regulará todo lo relacionado con el otorgamiento, distribución y buen uso de las partidas específicas, con cargo a los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República y sus modificaciones.

Entiéndase por partidas específicas el conjunto de recursos públicos asignados en los presupuestos nacionales para atender las necesidades públicas locales, comunales o regionales, expresadas en proyectos de inversión o programas de interés social... independientemente de que su ejecución esté a cargo de las municipalidades en forma directa o por medio de contrataciones o convenios con otras instancias gubernamentales o no gubernamentales....

Las obras, los programas, los proyectos y los equipamientos financiados con partidas específicas estarán dirigidos a solucionar problemas generales e impulsar el desarrollo local en todos los campos y en la cultura. Por su parte, los proyectos de inversión estarán orientados preferentemente a la construcción, la reconstrucción, el mejoramiento y el mantenimiento de la infraestructura pública, comunal y regional”.

En el Artículo 2, se menciona como las municipalidades son beneficiarias de las partidas específicas, las cuales les corresponde administrar los fondos públicos, los cuales deben ser solicitados por las comunidades y canalizados a través de cada municipalidad. Además, se establece en la Ley N° 7755, los encargados de realizar la aprobación, el procedimiento de asignación, cuáles son los criterios que se toman en cuenta para asignarlos, en caso de una modificación como se realiza, se determinan los principios básicos de tesorería, los principios presupuestarios y el proceso para las erogaciones.

H.LEY N° 7729

Las municipalidades reciben aportes financieros provenientes de la Ley N° 7729, “Modificación de la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles a la Ley N° 7509”, modificada el 09 de mayo de 1995, la cual establece que, para efectos de este impuesto, las municipalidades tendrán el carácter de administración tributaria. Que los gobiernos locales se encargarán de realizar valoraciones de bienes inmuebles, facturar, recaudar y tramitar el cobro judicial y de administrar, en sus respectivos territorios, los tributos que genera la presente Ley.

Se establecen como objetos de los impuestos: los terrenos, instalaciones, o construcciones fijas que existan.

En la Municipalidad de San Carlos particularmente se asigna un alto porcentaje del monto recaudado en Impuestos de Bienes Inmuebles a la conservación de la infraestructura pública, por lo tanto, es un aporte de gran interés para dicho municipio.

I. LEY N° 7331

Asimismo, se puede hacer mención de la Ley N° 7331, “Reforma la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres” N° 8413, la cual señala en su Artículo N° 231, que de las sumas recaudadas por el concepto de multas por infracciones, que señala el inciso d) del Artículo 10 de la Ley N° 6324, el Concejo de Seguridad Vial transferirá semestralmente *“Un diez por ciento (10%) a las municipalidades de toda la República, el cual se distribuirá tomando en consideración, en igual porcentaje, su población y su área geográfica. Estas sumas se destinarán, exclusivamente, para financiar proyectos de seguridad vial, en coordinación con la Dirección General de Ingeniería de Tránsito.”*

En el Artículo 15, de la Ley N° 6324, se establece el apoyo que brinda la Dirección de Ingeniería a las municipalidades, como se especifica a continuación:

“La Dirección de Ingeniería de Tránsito tendrá una Oficina Coordinadora y de Asistencia Técnica para asesorar a las municipalidades en los aspectos de ingeniería, planificación y regulación del tránsito. Los programas, planes y diseños para proyectos relacionados con el tránsito en los cantones, deberán ser revisados y aprobados por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito antes de ser ejecutados por la respectiva municipalidad”.

J. LEY N° 8757

La Asamblea Legislativa de la Republica de Costa Rica realizo la aprobación de La Ley N° 8757 “Ley de Aprobación del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CR-X1007) entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Programa de Infraestructura de Transporte (PIT)”,

Dicha Ley en su Artículo 7, establece acerca de la ejecución de las operaciones individuales de la red vial cantonal:

“La ejecución de operaciones individuales de la red vial cantonal será realizada por las municipalidades y los concejos municipales de distrito, según corresponda. Para dar cumplimiento a esta actividad, el Gobierno de la República, dentro del marco de estos convenios, deberá transferir a las municipalidades doscientos millones de dólares moneda de los Estados Unidos de América (US \$200.000.000,00) de los fondos provenientes de los empréstitos, para que estas ejecuten dichos rubros...”.

Según se establece en esta Ley será asignado a las municipalidades un sesenta por ciento (60%) según la extensión vial de cada cantón y un cuarenta por ciento (40%) según la cantidad de población de cada cantón para proyectos de caminos.

K.LEY N° 6909

Finalmente se menciona el aporte que da la Ley N° 6909, “Impuesto de Ruedo a Favor de las Municipalidades”, la cual fue creada mediante el Artículo 3 el 03 de noviembre de 1983 e indica lo siguiente:

“Crease un impuesto a favor de las municipalidades del país, por la suma fija de doscientos colones, por cada vehículo automotor, suma que se cancelará anualmente junto con los derechos de circulación. La distribución de lo recaudado por este concepto se hará en la misma proporción que el impuesto territorial que corresponde a cada municipalidad. El producto de este impuesto deberá dedicarse exclusivamente a los programas de mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales y, además, a la adquisición de maquinaria y equipo para esos efectos”.

Se concluye el análisis de la legislación relacionada con la Red Vial Cantonal, el tema cual como se puede visualizar en el desarrollo del capítulo es muy amplio, pero fundamental para que el lector pueda conocer la temática legal que debe regir en toda municipalidad a nivel vial, teniendo en consideración las leyes, decretos y reglamentos que respaldan la conservación de la infraestructura vial a cargo de las municipalidades en Costa Rica.



CAPÍTULO IV

Marco Metodológico





CAPITULO IV. MARCO METODOLÓGICO

A continuación, se muestra la metodología que se aplicó para el desarrollo del Plan Quinquenal en este capítulo se incluye: el tipo de investigación, fuentes de información, sujetos de información, métodos de recolección de información y las etapas que se llevaron a cabo para el desarrollo de estas.

Seguidamente se presenta el Marco Metodológico relacionado con el Plan Quinquenal de la Municipalidad de San Carlos.

A. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

El enfoque del presente trabajo es cualitativo, de manera que no se utilizan cifras ni métodos estadísticos en la investigación. Si bien se presentan cifras y datos los mismos son producto de la recolección de información en fuentes secundarias.

B. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Para la confección de este trabajo, se requirió de una investigación de tipo descriptiva, debido a que busca conocer y describir en detalle la situación actual de la Red Vial Cantonal. Para desarrollar el trabajo se recolectó información y se estudiaron las características y propiedades, lo que sirve para establecer criterios de intervención, realizar proyecciones de ingresos y además sistematizar los objetos que se involucran en el trabajo logrando de esta manera plantear la metodología, instrumentos y seguimiento para el Plan Quinquenal.



C.FUENTES DE INFORMACIÓN

Esta investigación utilizó fuentes de información tanto primarias como secundarias, con el fin de adquirir los datos para abarcar los aspectos que requiere la confección del Plan Quinquenal.

1. FUENTES PRIMARIAS

La información primaria recolectada es proporcionada por los encargados (Manuel Emilio Calvo y Pablo Jiménez Araya) de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de San Carlos, que poseen la experiencia y el conocimiento sobre la conservación de la Red Vial Cantonal. Así también el estudio se basa en lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento al Artículo 5to Inciso B) de la Ley N° 8114 de “Simplificación y Eficiencia Tributaria” y la Ley N° 9329 Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal.

2. FUENTES SECUNDARIAS

La información secundaria se obtuvo principalmente de documentos e información brindada por la Municipalidad de San Carlos para el desarrollo del Plan Quinquenal entre ella reglamentos, políticas, planes, manuales, presupuestos, según las necesidades conforme al avance del estudio. Además, se utilizó el internet con el fin de obtener información teórica y así poder elaborar el marco teórico y el metodológico, también se utilizaron fuentes bibliográficas para la recolección de datos, donde especificaron varios conceptos que complementan los marcos anteriormente mencionados.



D. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

En vista de la necesidad de realizar la actualización del Plan Quinquenal 2018 al 2022, se optó por la elaboración de este trabajo. La técnica de investigación utilizada para el desarrollo fue básicamente mediante la aplicación de la entrevista personal. Esta es una técnica para obtener información que consiste en un diálogo entre dos personas, de manera que se logre transmitir el conocimiento y se pueda elaborar un trabajo conforme a las necesidades de la Unidad Técnica de Gestión Vial.

Por lo tanto, para realizar el proyecto se aplicó la siguiente técnica de investigación:

1. MÉTODO DE ENTREVISTA

Se realizaron entrevistas no estructuradas para el esclarecimiento de dudas y retroalimentación sobre información necesaria el desarrollo del trabajo. Se realizó con el fin de obtener información de un modo más fácil, detallado y la interpretación de los datos fuera de manera más certera. Las entrevistas se realizaron a los ingenieros de la UTGV, sustrayendo opiniones de personas expertas en la materia.

E. ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN QUINQUENAL

A continuación, se presentan las etapas que se llevaron a cabo para la implementación del proyecto, posteriormente se detallan los pasos que se siguieron en cada una de ellas, con el fin de desarrollar y abarcar todos los puntos establecidos para el trabajo.

Ilustración VIII Etapas para la elaboración del Plan Quinquenal de Conservación Vial Cantonal



Fuente: Elaboración propia



Para la elaboración del Plan Quinquenal de Conservación Vial Cantonal se realizaron 6 etapas:

Etapas 1: La primera etapa se basó en la recolección de información general del cantón de San Carlos, se pueden destacar los siguientes datos: el número habitantes, población urbana, población rural, extensión del cantón, principales actividades productivas, Índice de Desarrollo Social, extensión de la red vial cantonal y extensión de la red vial nacional en el cantón. Esta información permitió caracterizar de manera general la situación socioeconómica de San Carlos; como parte de la investigación se buscó información de las características generales de la red vial del cantón, permitiendo determinar: extensión de la red vial cantonal clasificada y no clasificada, cuadrantes y calles urbanas y el diagnóstico del estado de la red vial del cantón.

Etapas 2: En la segunda fase de la investigación de igual manera se recolecto información, pero en los ámbitos financiero, económica técnica y de vulnerabilidad de los desastres naturales. La información económica fue facilitada principalmente por el Director Financiero de la Municipalidad de San Carlos basándose en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la Municipalidad, también se recibió información económica del MOPT y del departamento de UTGVM. Una vez recolectados los datos, se procedió a analizar y realizar los supuestos de formulación financieros, económicos, técnicos y de vulnerabilidad. Cada uno de los supuestos que se realizaron fueron codificados con el objetivo de tener más facilidad en el momento de hacer mención de alguno de ellos a lo largo del trabajo

Etapas 3: En la tercera etapa realizó una indagación minuciosa de las políticas, decretos y leyes mediante las cuales se establece los criterios generales de intervención que sustentan los proyectos del Plan Quinquenal. En esta etapa se señalaron las principales políticas gubernamentales que sustentan los proyectos plasmados en el Plan Quinquenal. Así mismo, se estudió un documento facilitado por la UTGVM, llamado “Propuestas en políticas en materia vial cantonal”, para conocer las políticas internas de la municipalidad en conservación vial.



Etapa 4: en la cuarta etapa se procedió a efectuar las proyecciones de ingresos para los próximos cinco años, estas se realizan con base en el análisis de la información económica y financiera recolectada en la segunda etapa. El Plan Quinquenal debe contener el desglose de ingresos por fuente de financiamiento; por lo tanto, se tomaron los supuestos financieros realizados en la segunda etapa de la metodología para realizar el detalle de los ingresos que se esperan percibir en el siguiente quinquenio.

Etapa 5: Se procedió a implementar la quinta etapa, definiendo los proyectos por realizar para el período 2018 – 2022, de forma paralela se fueron considerando varios factores que afectan la red vial para puntualizar los objetivos, las metas por tipo de intervención. Además, se elaboraron los indicadores para el control y evaluación del Plan Quinquenal con la finalidad de tener una herramienta que permita medir el nivel de avance de una actividad respecto a la meta establecida en el plan. Cada indicador contiene una fórmula que permite mediante los datos de cada año, conocer el porcentaje de progreso de la actividad programada.

Etapa 6: En la sexta etapa, se realizó la Matriz Resumen, la cual estandarizó la información recolectada en los pasos anteriores. La misma corresponde a una hoja electrónica de Excel que se confeccionó para resumir toda la información del Plan Quinquenal. Después de confeccionada la Matriz Resumen se realizó un análisis de esta, con el fin de darle valor agregado al Plan Quinquenal, en ese análisis se tomaron las variables que se consideraron más significativas y se compararon con el objetivo de tener resultados más concisos del Plan Quinquenal.

Finalmente se procedió a desarrollar un análisis del Plan Quinquenal 2011-2017 y la evolución que tuvo en estos años, en el cual se presentan varios gráficos de análisis y se muestra la valuación del plan anterior.



F. CONCLUSIONES

Por último, se plantearon las conclusiones, con base en el análisis de la información adquirida en el desarrollo del Plan Quinquenal.

El Marco Metodológico detallado en este Capítulo sirvió de orientación, debido a que se estableció una secuencia lógica para llevar a cabo cada una de las etapas de la investigación, con el propósito de lograr los objetivos del trabajo. Se utilizó como base para la elaboración del Plan Quinquenal que se plantean en los siguientes capítulos.



CAPÍTULO V

Plan Quinquenal de Conservación Vial



CAPITULO V. PLAN QUINQUENAL DE CONSERVACIÓN VIAL 2018 – 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

A continuación, se presenta el detalle del Plan Quinquenal de Conservación Vial 2018 – 2022 de la Municipalidad de San Carlos.

A. GENERALIDADES DEL CANTÓN

Se realizó una investigación de los aspectos generales del cantón de San Carlos que sirven de orientación para el desarrollo del Plan Quinquenal:

1. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DEL CANTÓN

El territorio de San Carlos es un pueblo norteño privilegiado con verdes llanuras, con un alto potencial para el desarrollo de la agricultura y ganadería y en un inicio perteneciente al cantón de Naranjo, ante la organización de los integrantes del municipio propusieron el cambio de distrito a cantón es así como el 26 de septiembre de 1911, bajo decreto número 31 se establece a San Carlos como el cantón número diez de la provincia de Alajuela, es ese entonces estaba confirmado únicamente por 4 distritos Villa Quesada, Florencia, Buenas Vista y Aguas Zarcas, además una pequeña iglesia, un cuadrante formado, una oficina telegráfica y de correos, un matadero público y una escuela a la cual acudían entre 70 y 80 niños.

1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

En un inicio la tierra de San Carlos era conocida como parte de la tierra de los indios Votos, un término que históricamente se asignó en 1667 por la primera fortificación que levantaron los españoles sobre el Río San Juan, para defender a nuestro país de los piratas. En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al cantón de San Carlos estuvo habitado por indígenas votos.

El conquistador español Don Jerónimo de Retes, en 1640, visitó la región, bautizando a uno de los más importantes emplazamientos de los aborígenes, ubicados a orillas del río Cutris (hoy San Carlos), con el nombre de San Jerónimo de Votos.

En 1850, una expedición de vecinos de San Ramón al mando de don Francisco Martínez, abrió una vereda a la zona, que posteriormente se convirtió en la base para el camino viaje a San Carlos. Al año siguiente don Victorino Fernández, morador de San José, fue el primer colono que se estableció en la bajura; posteriormente lo hicieron los señores Alfonso Carit, Teodoro Koschny, Pedro Nelson y Ramón Quesada. Los pocos asentamientos que se realizaron se ubicaron de preferencia en el tramo comprendido entre Florencia y Terrón Colorado.

Entre los años 1856 y 1857 se movilizó la vanguardia del ejército nacional que corto el ingreso de hombres y armas que recibió William Walker, desde 1851 a 1853 se inició la colonización “blanca” del territorio de San Carlos. Se tramitan alrededor de 67 denuncias de tierras hechos por nacionales y extranjeros. La mayoría son propietarios ausentes.

Don José María Quesada Ugalde, Baltazar y Joaquín Quesada Rodríguez, vecinos de Grecia, en 1882, efectuaron denuncias de los terrenos ubicados a lo largo de la angosta terraza, comprendida entre los ríos Peje y Platanar, en lo que hoy constituye Ciudad Quesada. Con el tiempo muchas familias llegaron a este paraje, en el que se fue conformando un rústico caserío tipo hacienda. A la muerte de don José María Quesada, gran parte de los terrenos que fueron propiedad de él, fueron adquiridos por don Joaquín Quesada, con el propósito de formar el caserío de La Unión.



Fue así, como realizó un trazado de cuadros y empezó a abrir calles; regaló la manzana para el cementerio y otra para la iglesia; así como un solar para la escuela y otro para la casa cural. Los trabajos de construcción de las aceras, calles, postes, fueron efectuados por don Joaquín con la colaboración de sus hijos, otras familias y muchos vecinos del lugar. Este incipiente caserío se denominó La Unión.

En decreto No. 31 del 21 de agosto de 1893, se dispuso a realizar el primer intento de colonización dirigida por parte del estado, al crear una colonia en Aguas Zarcas compuesta por un centro y 486 parcelas de tierra. Durante la administración de don Rafael Iglesias Castro (1894-1898), en vista de la importancia de la región y a fin de unir la vía fluvial del Río San Carlos con la red de caminos, se abrió una trocha desde Naranjo pasando por Zarcero, Buena Vista, Los Bajos, terminando en el sitio denominado Muelle; lugar en el margen del río, donde se construyó el embarcadero y una casa para el resguardo fiscal.

La primera escuela se construyó en 1900. Tiempo después en 1927, se abrió un nuevo centro educativo, que actualmente se denomina Escuela Juan Chaves Rojas, en el segundo gobierno de don Ricardo Jiménez Oreamuno. El Liceo San Carlos, empezó a funcionar en el año de 1945, en un edificio particular con el nombre de escuela complementaria; diez años después se estableció como Liceo, en la primera administración de don José Figueres Ferrer.

La primera ermita se construyó en 1895. Durante el episcopado de Monseñor don Juan Gaspar Stork Werth, tercer obispo de Costa Rica, en el año 1912, se erigió la Parroquia, dedicada a San Carlos Borromeo; la cual actualmente es sufragánea de la Diócesis de Alajuela, de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica. En la primera administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno, el 26 de setiembre del 1911, en ley No.17, se le otorgó el título de Villa a la población La Unión, cambiándole el nombre por Quesada, cabecera del cantón creado en esa oportunidad. Posteriormente, el 8 de julio de 1953, en el gobierno de don Otilio Ulate Blanco, se decretó la ley No.1601, que le confirió a la Villa la categoría de Ciudad.



En el año 1907 por decreto número 295 se dispone a crear una plaza de médico en San Carlos que asumió el doctor Sergio Fallas posteriormente en el año 19250 se inauguró el primer hospital de San Carlos, domiciliado en Naranjo, en 1914 se creó la Alcaldía de San Carlos y se instaló la Primera Junta de Caridad, electa por la hermandad de la caridad que la integraban 129 varones distinguidos.

Un dato importante fue que en el año 1947 se inauguró el viejo Palacio Municipal que tuvo un costo aproximado de ₡30.000, en 1970 se inauguró el nuevo Palacio Municipal. La ciudad de San Carlos fue evolucionando y para el año 1965 se fundó a Cooperativa de Electrificación Rural (COOPELESCA R.L), se estableció el Juzgado Civil y COOCIQUE, primera cooperativa de ahorro y crédito.

En 1950 la actividad comercial y financiera experimenta un gran auge con el establecimiento de las sucursales del Banco de Costa Rica y la del Banco Nacional.

De igual manera años más tarde en 1991 se inauguró el edificio de los Tribunales de Justicia de San Carlos, se creó el colegio científico (año 1993), el edificio del INA (año 1994), el hospital privado Centro Cooperativo San Carlos Borromeo (año 1994), diócesis de San Carlos (año 1995), entre otras importantes entidades que han ayudado a la evolución de este preciado cantón.

1.2. POSICIÓN GEOGRÁFICA

Las coordenadas geográficas de acuerdo con los valores de latitud y longitud, el cantón de San Carlos se sitúa entre los 10° 14' y los 59' de latitud norte y los 84° 10' y 84° 56' de longitud occidental.

El territorio del cantón de San Carlos es de 3.348 kilómetros cuadrados, lo que representa un 34% del área total de la Región Huetar Norte, el 29.1% de la superficie de la provincia de Alajuela y el 6.5% de la extensión total de Costa Rica. Determinándose el cantón más extenso de los 81 cantones en que se dividen las 7 provincias del país. San Carlos es el cantón número 10 de la provincia de Alajuela.



Este territorio ocupa la parte central de un vasto espacio geográfico denominado Región Huetar Norte, que tiene una superficie de 9804 Km cuadrados, ubicado al noreste del territorio nacional. Actualmente el cantón limita al norte con Los Chiles, río San Juan, y República de Nicaragua; al sur con los cantones de Poás, San Ramón y Alfaro Ruiz; al este con el Río Cuarto de Grecia y la provincia de Heredia; al oeste con los cantones de Miramar de Puntarenas y Tilarán de Guanacaste.

La base de este territorio en el que destacan llanuras y montañas está configurada por antiguas rocas de origen sedimentarias e ígneas que datan de la era terciaria sobre los cuales reposan emisiones volcánicas. Actualmente en el territorio de San Carlos se reconocen cinco formaciones, a saber: Venado, Buena Vista, Cote, Cureña y Volcánica Cuaternaria.

Consta de 13 distritos, entre los cuales los más densamente poblados y urbanizados, en términos infraestructurales y de servicios, son Ciudad Quesada, Florencia, Aguas Zarcas y Venecia. En general, se trata de un cantón con un clima húmedo y abundantes precipitaciones durante el año. Los contrastes climáticos, las extensas llanuras, los numerosos ríos, el suelo rico en sedimentos y sobre todo su famosa lluvia, convierten a San Carlos en una de las zonas más productivas del país, tanto en cantidad como en variedad. Con respecto a las actividades económicas la industria ganadera es la principal, debido a que el cantón produce aproximadamente el 65% de la leche y más de la mitad de la carne que se consume en nuestro país. Igualmente, entre los principales productos que se siembran destacan la caña de azúcar, piña, cítricos y tubérculos en grandes partes, así como la producción forestal.

Ilustración IX División territorial administrativa de San Carlos




Fuente: SIR-ZEE (2011) Extraído de www.sir-zee.itcr.ac.cr

2. DATOS DEMOGRÁFICOS DEL CANTÓN

3.4. ASPECTOS POBLACIONALES RELEVANTES

La población del cantón de San Carlos se ubica en 13 distritos, para el presente año 2018 de acuerdo con las estadísticas del INEC la misma es de 194 207 personas. Según el censo más reciente corresponde al 2011, indicando del total de la población en San Carlos un 49% son mujeres y un 51% son hombres como se puede visualizar en el siguiente gráfico.

Gráficos I. Distribución proporcional de la población del Cantón de San Carlos,

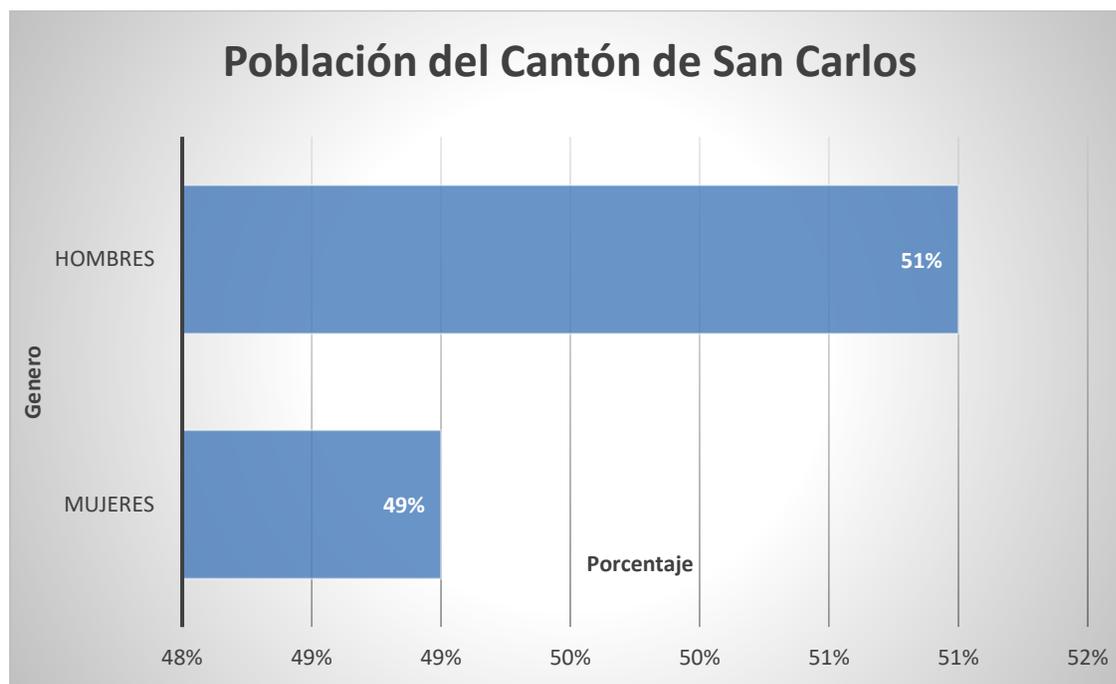


Fuente: Elaboración propia con base en proyecciones realizadas por el INEC (2011)

Seguidamente se muestra el siguiente gráfico basado en el Apéndice 1, de las proyecciones de población realizadas por el INEC, durante el quinquenio del 2018 al 2022, actualmente para el 2018 existe una población proyectada de 194207 y para el 2022 se estima una población de 206115 lo cual representa un aumento de 11908 personas, como se puede visualizar de manera gráfica a continuación:

(Ver Apéndice 1. Proyección de la población de San Carlos al 201).


Gráficos II. Estimación de la población total cantonal de San Carlos al 2018-2022

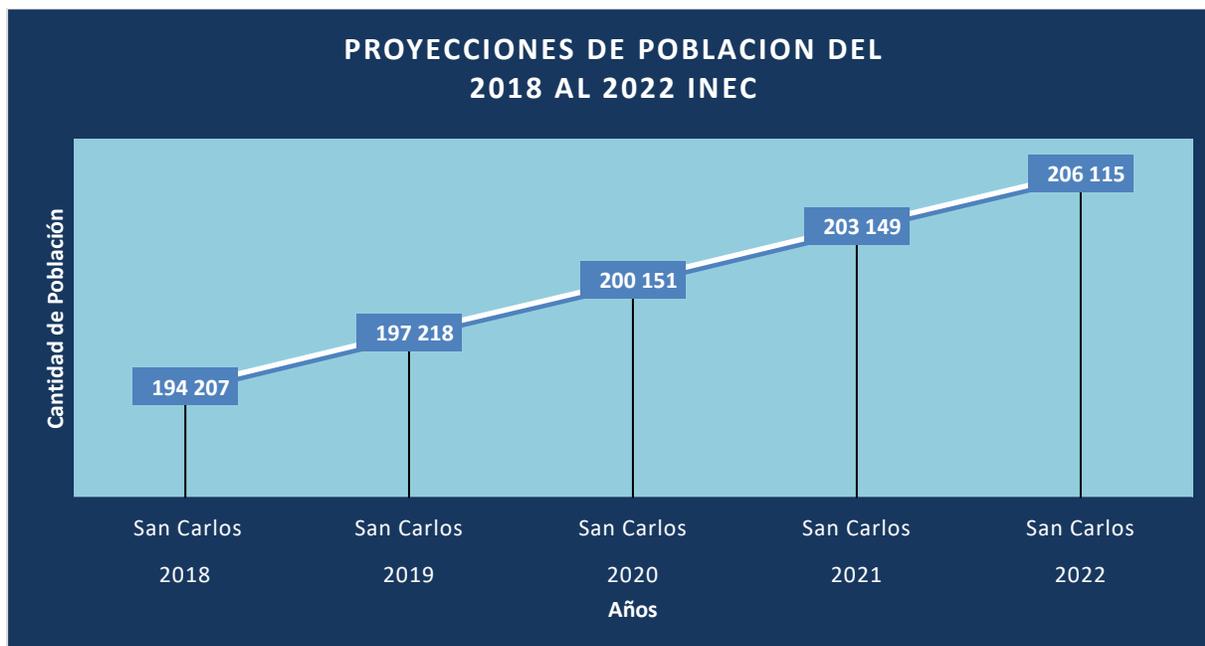

Fuente: Elaboración propia con base en proyecciones realizadas por el INEC (2018)

El cantón de San Carlos está conformado por 13 distritos dentro de los cuales se fragmenta la población de manera heterogénea, el siguiente gráfico muestra las proporciones de la población en cada distrito de la mayor población a menor, siendo Ciudad Quesada el distrito de mayor población y Buena Vista el de menor:

Gráficos III Proporción de la población cantonal según distrito del 2018-2022

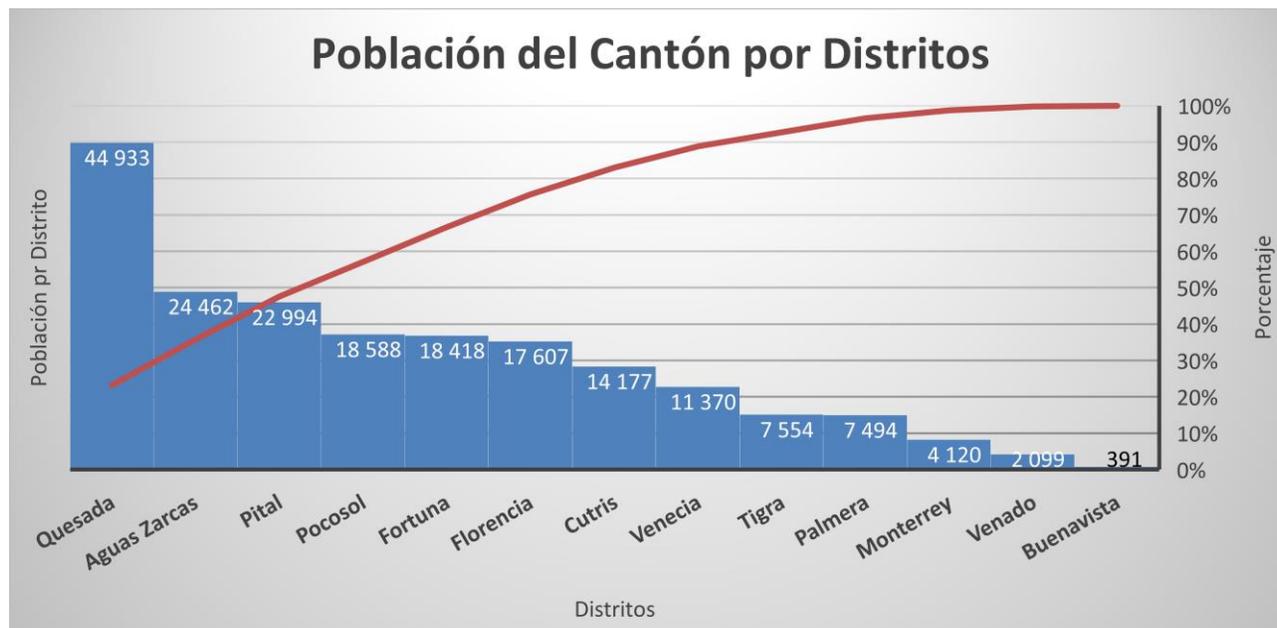


Fuente: Elaboración propia, con base en estadísticas del INEC (2018)

Se verifico la información con el INEC y el último censo realizado con respecto a la información rural y urbana corresponde al censo del 2011, el cual muestra los siguientes datos

En los últimos años, el cambio en la distribución de la población según la zona de residencia (urbana o rural) se ha debido en parte al desplazamiento significativo de los habitantes de las zonas rurales a los centros urbanos, así como al desarrollo y crecimiento de han tenido ciertas zonas rurales pasando a catalogarse como urbanas. Según el censo realizado por el INEC en el año 2011, el 47% de la población del cantón se encuentra distribuida en centros urbanos como Quesada, Florencia, Aguas Zarcas, Pital, y Fortuna en donde se distribuyen casi el 90% de la población urbana del cantón. Por su parte el 53% de la población sancarleña está concentrada en zonas rurales. Quesada, Aguas Zarcas, Pital, La Palmera, Cutris, y Pocosol concentran el 75% de la población rural siendo además los cantones de La Palmera, Monterrey, Venado y Buena Visto los únicos con población 100% rural.

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de la población y cantidad de personas en los 13 distritos del cantón.


Gráficos IV Población Rural y Urbana en los distritos del cantón de San Carlos.

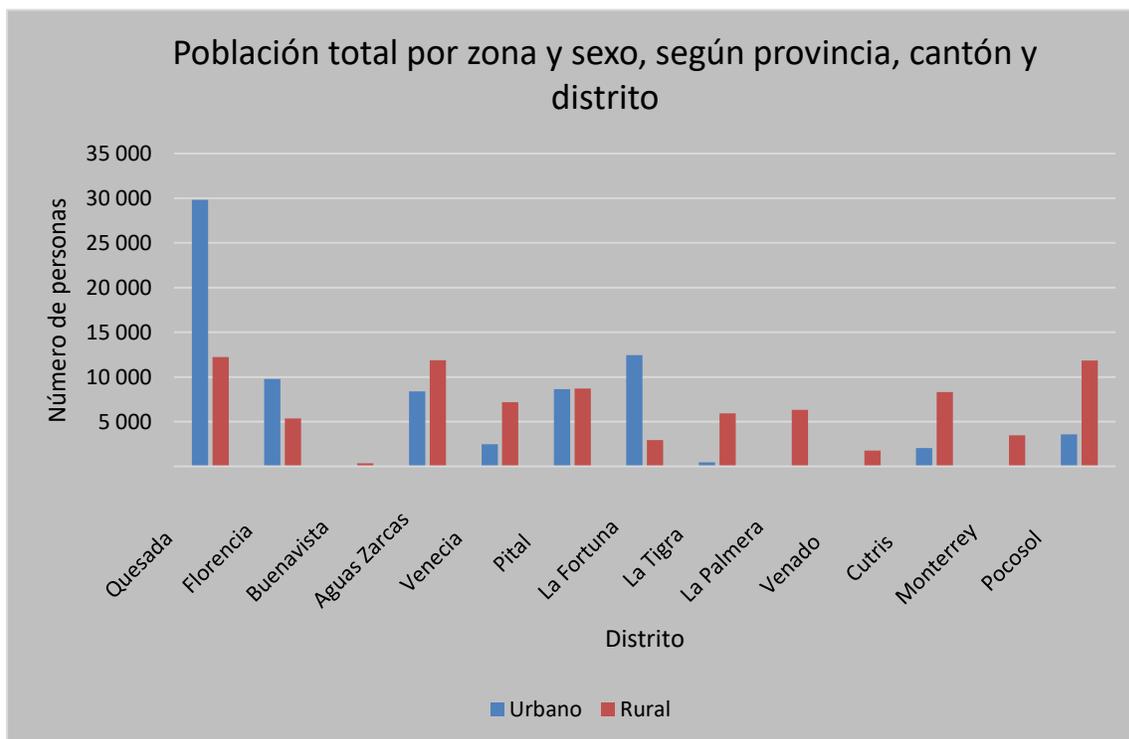

Fuente: Elaboración propia, con base en estadísticas del INEC (2011)

Por su parte, la proporcionalidad en distribución urbana o rural en los distritos queda en evidencia en el gráfico V a continuación:

Gráficos V Proporción de la población según Distrito

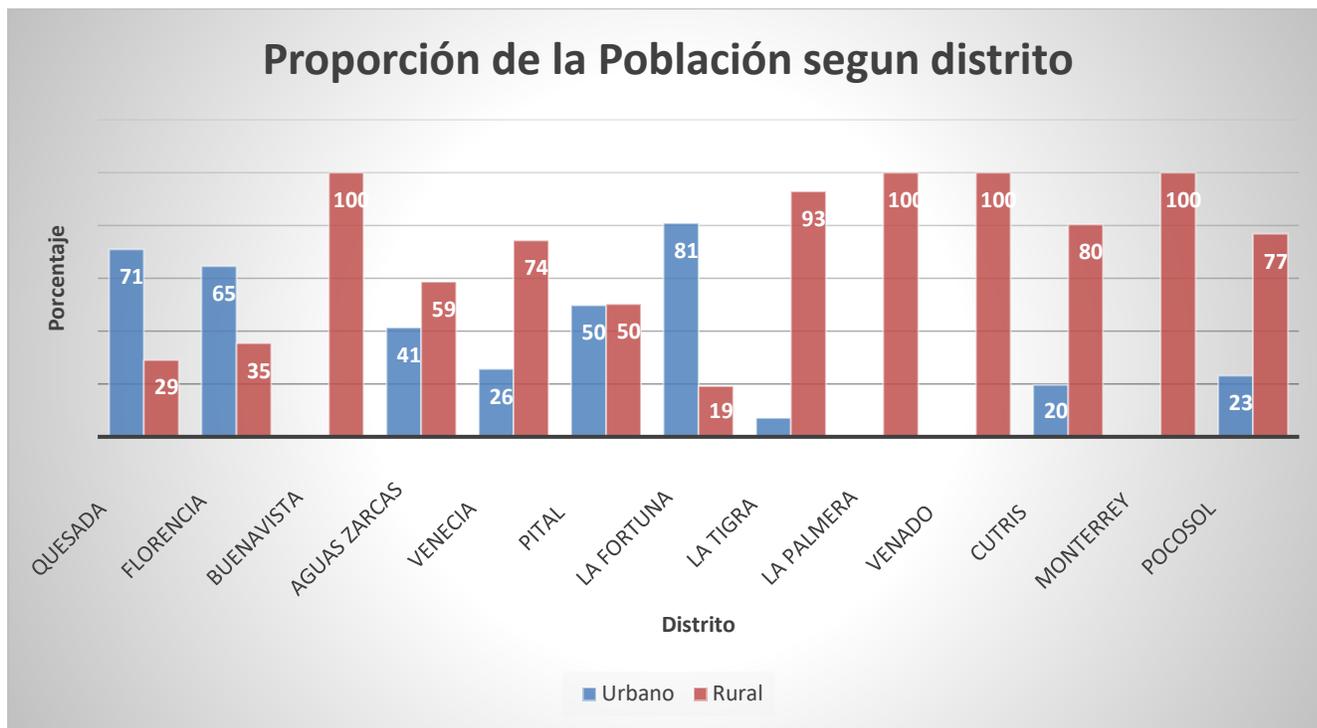

Fuente: Elaboración propia, con base en estadísticas del INEC (2011)


3. ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL

El Índice de Desarrollo Social (IDS), constituye un indicador resumen que mide las brechas sociales entre las diferentes áreas geográficas del país (cantones y distritos), está compuesto por las siguientes variables:

- Económica
- Participación Social
- Salud
- Educación

En la siguiente ilustración se puede visualizar el más reciente estudio de IDS realizado por el MIDEPLAN en el 2013, en el cual se puede apreciar como estas cuatro áreas se subdividen en varios indicadores los cuales varían dependiendo de la cantidad que lo conforman.

Ilustración X Composición del Índice de Desarrollo Social 2013

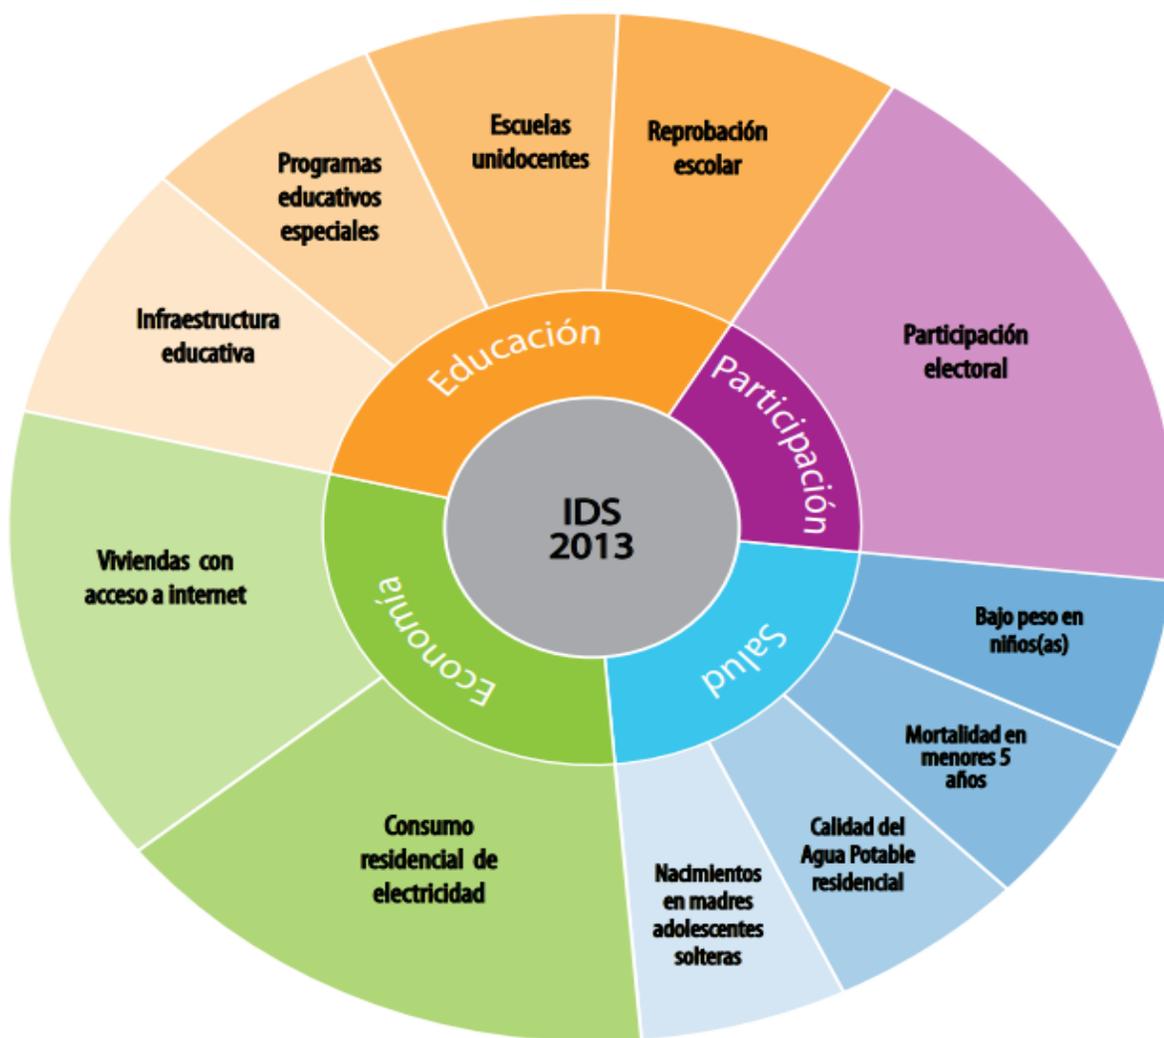

Fuente: MIDEPLAN (2013), extraído de www.mideplan.go.cr

3.1. DIMENSIÓN ECONÓMICA

La dimensión económica es una parte importante que considerar para la formulación del plan quinquenal, la población requiere un conjunto de medios a fin de lograr satisfacer las necesidades básicas para vivir, es por esta razón que se ha presentado un importante crecimiento económico fundamental para el desarrollo, el cual es medido por la capacidad adquisitiva de las personas.

Como se puede apreciar en la ilustración anterior la dimensión económica está dividida en dos indicadores: el promedio de consumo mensual de electricidad el cual posee una relación directa entre el nivel socioeconómico y su consumo de energía eléctrica y como segundo indicador posee el porcentaje de viviendas con acceso a internet, la adquisición de este servicio se ve condicionada por el ingreso al hogar en una familia.

3.2. DIMENSIÓN DE PARTICIPACIÓN ELECTORAL

En la dimensión de participación electoral se utilizan los indicadores de abstencionismo electoral, suministrados por el Tribunal Supremo de Elecciones. Se considera que la población que se encuentra motivada y representada en la toma de decisiones estará más interesada en ejercer el derecho y participar en las elecciones.

Para efectos operativos, se conceptualiza la participación como una acción social individual por la cual se es parte de un cuerpo social donde se puede emitir opinión sobre los temas de decisión colectiva.

3.3. DIMENSIÓN DE SALUD

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución de 1946, define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social; no solamente corresponde a la ausencia de dolencia o enfermedad, para lograr tener una buena salud es necesario condiciones de desarrollo físico-biológico adecuadas y también acceso de la población a condiciones de vida que incluyan servicios de calidad.



El derecho a la salud debe entenderse como un acceso al disfrute de una gran gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar un alto nivel de bienestar, de aquí parte la importancia de involucrar a este indicador en el IDS, ya que permite evidenciar alertas que pueden ser consideradas desde la perspectiva de la promoción de la salud, así como la prevención y atención de enfermedades.

En la dimensión de salud se consideran cinco indicadores: el porcentaje de niños y niñas con bajo peso al nacer, todos aquellos niños que posean un peso mejor a 2.500 gramos al nacer; como segundo indicador está el porcentaje de estudiantes de primer grado que asisten a la escuela y poseen delgadez o un bajo índice de masa corporal (IMC), lo cual representa deficiencias alimenticias en un alumno afectando tanto su salud como desempeño en el centro educativo; la tasa de mortalidad en personas menores de cinco años, midiendo así la vulnerabilidad a las enfermedades de los niños y niñas, a las condiciones que viven con sus familias y a las condiciones comunales deficientes; porcentaje de nacimientos en madres solteras menores de diecinueve años, procurando medir la condición del grupo familiar y la vulnerabilidad socioeconómica de los y las niñas; finalmente se considera el porcentaje de viviendas con cobertura residencial de agua potable, aspecto importante para la calidad de vida de toda persona.

3.4. DIMENSIÓN EDUCATIVA

La educación constituye un factor determinante para el progreso económico y social de toda sociedad. En nuestro país se encuentra en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se inscribe el derecho a la educación, cuyo respeto es parte ineludible de toda concepción de desarrollo, también el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos lo reafirma al señalar que: “Toda persona tiene derecho a la educación (...) la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos” (UNESCO-CEPAL). Por su parte, la Constitución Política de la República de Costa Rica en el artículo 78, destaca la obligatoriedad de la educación preescolar y la general básica y señala que estas y la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la Nación (República de Costa Rica, 2006).

Como se puede apreciar en la Ilustración la dimensión económica está conformada por 4 índices: programas educativos especiales, infraestructura educativa, reprobación en primaria y unidocentes. Se tomaron en consideración los siguientes indicadores, porcentaje de matrícula del programa de segundo idioma, informática, porcentaje de escuelas sin servicio de electricidad y sin servicio de agua por cañería, porcentaje de aulas escolares en regular y mal estado y finalmente el porcentaje de escuelas unidocentes.

El desarrollo de una nación y su educación van de la mano, se manifiesta en los países con mayor nivel de desarrollo humano ya que poseen alto grado de educación y han atendido la educación desde temprana edad, por el contrario, los países con mayores índices de pobreza son lo que registran, generalmente, los mayores índices de analfabetismo y baja escolaridad. Desde esta perspectiva, se ha visualizado a la pobreza como un fenómeno íntimamente vinculado al de desarrollo humano.




4. IDS DEL CANTÓN DE SAN CARLOS

El Índice de Desarrollo Social es el único índice que se calcula a nivel de distritos en nuestro país, esta medida ayuda a la toma de decisiones considerando las áreas de mayor y menor desarrollo, garantizando igualdad de condiciones para los distritos del país. El valor del IDS oscila entre cero y cien, correspondiendo el valor más alto al cantón en mejor situación sociodemográfica y el más bajo al que presenta el mayor rezago en su nivel de desarrollo.

De acuerdo con el estudio de Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), los datos del índice de desarrollo social en el Cantón de San Carlos son bastante bajos. Es importante recalcar que los cantones de la Región Huetar Norte se encuentran entre los 20 cantones con más bajo Índice de Desarrollo Social. Rescatando que San Carlos forma parte de la Región Huetar Norte no se exime de dicha situación, sin embargo, es importante mencionar que San Carlos con respecto a los demás cantones de la región se encuentra mejor en muchos aspectos.

El siguiente gráfico muestra el valor del IDS de cada uno de los 13 distritos del cantón de San Carlos en una forma clara.

Gráficos VI Índice de Desarrollo Social Distrital 2013, según División Territorial Administrativa

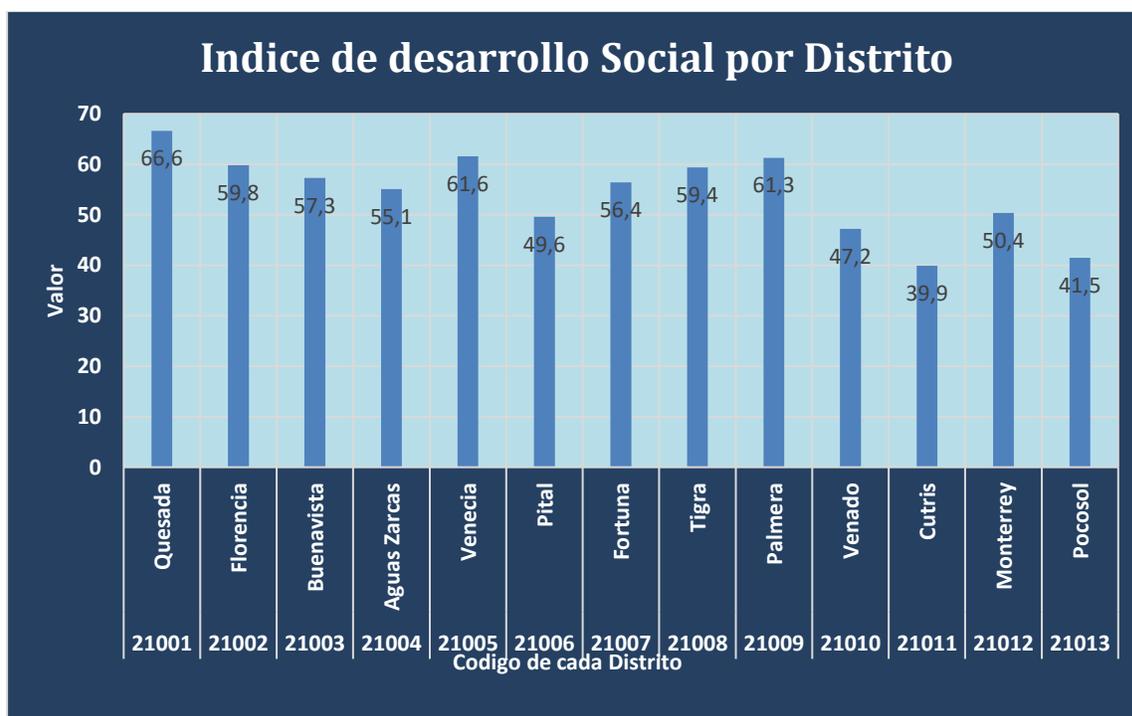


Fuente: Elaboración propia, con base en estadísticas del INEC (2013)

En el gráfico se puede apreciar como el distrito de Ciudad Quesada es el que posee mayor Índice de desarrollo Social, lo cual es una representación congruente ya que es el principal centro socioeconómico del cantón, seguidamente se encuentran Venecia, la Palmera, Florencia en menor rango y se puede visualizar como el distrito de Cutris es el que posee el menor IDS. En general el IDS del cantón de San Carlos es 54.32%

En la siguiente Ilustración se puede apreciar el Índice de Desarrollo Social de cada uno de los distritos desde una perspectiva diferente, con respecto a la ubicación en el mapa de cada uno de los distritos:

Ilustración XI Índice de Desarrollo Social Distrital 2013, según División Territorial Administrativa

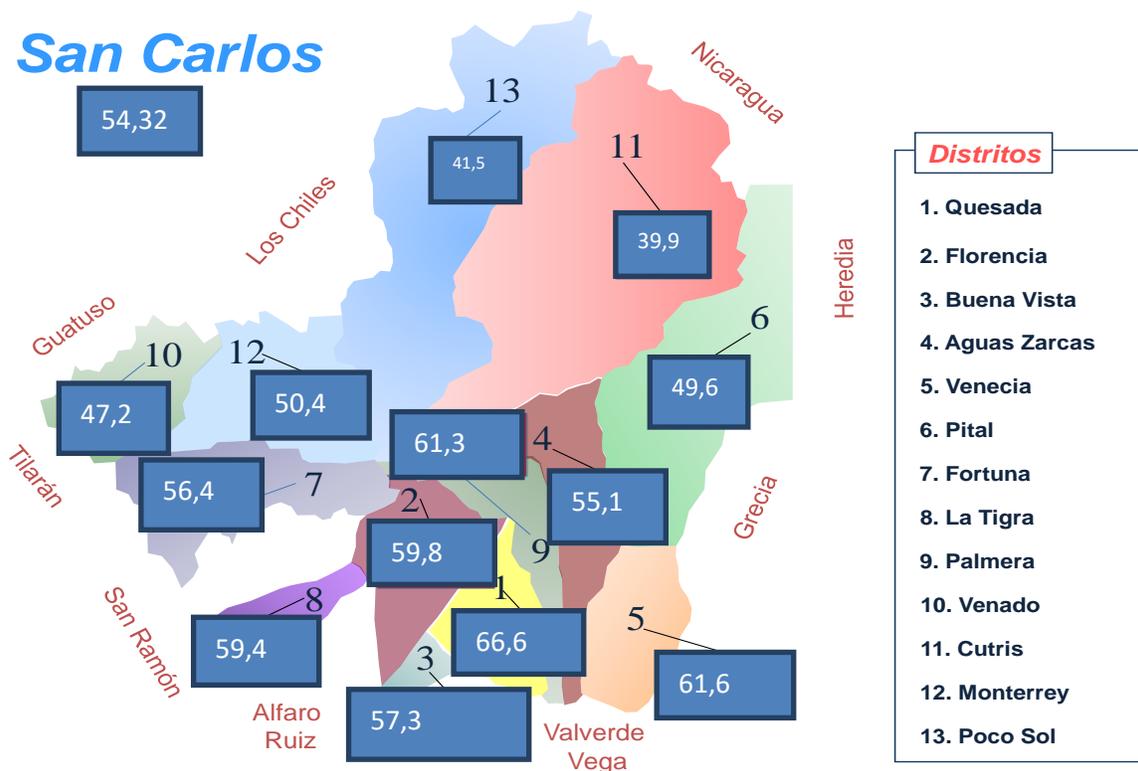

Fuente: Elaboración propia, con base en estadísticas MIDEPLAN (2013)

5. PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

San Carlos es considerada una de las zonas más productivas del país brindando gran variedad y cantidad de productos de muy alta calidad.

La mayoría de las actividades que se realizan son de carácter agropecuario. De manera generalizada, la ganadería extensiva para producción de leche y carne son las actividad más importantes y difundidas en toda la zona, lo que ha provocado que la frontera agrícola haya avanzado del sur hacia el norte del cantón, dejando algunas áreas con bosque natural en los sectores norte que son los que presentan mayores dificultades de acceso.

También se pueden destacar las plantaciones forestales como otra de las actividades productivas de mayor relevancia en el cantón. Las áreas reforestadas con diversas especies se distribuyen sin un patrón definido en toda el área, sin embargo, se nota una concentración en aquellas áreas que se encuentran más alejadas de los centros de población y vías de acceso principales.

En los últimos años, las áreas dedicadas al cultivo de la naranja y de la piña se han incrementado notablemente. Estos cultivos se han expandido sobre todo en terrenos con características aptas para la mecanización del suelo, desplazando a los pastizales y otros cultivos. Su distribución está concentrada en el sector sur este del cantón (Pital), sin embargo, se está presentando una expansión importante hacia el norte, sobre todo del cultivo de piña, ocupando parte del distrito de Cutris.

La producción de raíces y tubérculos, pese a haber disminuido en los últimos años por dar paso a la producción de piña, se mantiene como una de las actividades agrícolas significativas del Cantón y que además aporta de manera notable a la exportación de productos. Por otro lado, el cultivo de la caña de azúcar es el cultivo más importante en la zona central del Cantón existiendo grandes áreas dedicadas a esta actividad, complementados por pequeños bloques diseminados alrededor de los principales ingenios del área.



En menor proporción y de manera dispersa en el área geográfica, principalmente en el sector norte y noroeste, el cultivo de granos básicos (frijoles y arroz) es otra de las actividades agrícolas importantes. Por último, el cultivo del café únicamente se da en las partes altas de Aguas Zarcas y algunos sectores de Pital.

La industria en el Cantón se ubica fundamentalmente dentro de un contexto de pequeños y medianos empresarios, siendo muy pocas las industrias que se puedan calificar de grandes o que completen el proceso de transformación de materias primas. Se distinguen: Ticofrut, Dos Pinos, Maderas Cultivadas de CR, Frutas Tropicales Venecia, Flor y Fauna, Constructora Santa Fe, Frutex SA, Industria Cartonera INCA SA, Inversiones y Procesadora Tropical, Ingenio Quebrada Azul, Ingenio Santa Fe, Productos de Concreto, La Calcaria en el Distrito Palmera, Fábrica de lanchas de fibra plástica en el Distrito Fortuna, entre otras.

Finalmente, el turismo tiene un importante papel dentro de las actividades productivas principalmente en el área de la Fortuna debido al Volcán Arenal y la gran cantidad de atracciones que brinda el lugar, de igual manera se pueden observar centros turísticos en varios sectores como al sur del cantón con sus verdes montañas (San José de la montaña) y en el este por las desembocaduras de los ríos San Juan y San Carlos (Boca Tapada y Boca San Carlos)

6. EXTENSIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL

La Red Vial en el país está dividida en Red Nacional y la Red Cantonal, la primera tiene una extensión a nivel nacional de 7429 Km y la segunda tiene una extensión de 24 721 Km, de los cuales 2252.05 Km pertenecen al cantón de San Carlos, situación que caracteriza a dicho cantón por poseer la Red Vial Cantonal más amplia en el país.

En la siguiente ilustración se puede visualizar como está clasificada la Red Nacional la cual es administrada por CONAVI y la Red Cantonal la cual es administrada por los Municipios y el MOPT.

Ilustración XII Red Vial de Costa Rica



Fuente: CONAVI (2018) Extraído de www.conavi.go.cr

La Red Vial Cantonal de San Carlos cuenta con un total de 1115 caminos, los cuales suman 2393.03 Km de longitud y se distribuyen de la siguiente manera en los trece distritos del cantón:

Tabla I. Total de longitud de caminos en Km por distrito en el Cantón de San Carlos.

DISTRIBUCIÓN DE LOS CAMINOS POR DISTRITOS		
Nº	Distrito	Km
1	Quesada	256,41
2	Florencia	146,47
3	Buena Vista	26,00
4	Aguas Zarcas	138,83
5	Venecia	111,00
6	Pital	208,05
7	La Fortuna	135,36
8	La Tigra	69,50
9	La Palmera	76,65
10	Venado	100,11
11	Cutris	443,38
12	Monterrey	174,90
13	Pocosol	506,38
TOTAL		2393.03

Fuente: Municipalidad de San Carlos, Unidad Técnica de Gestión Vial (2018)

En la tabla anterior se pueden apreciar como Pocosol es el Distrito que posee más Kilómetros de camino con 506.38 Km, seguido de Cutris con 443.38 Km y los más pequeños con respecto a la longitud corresponden a La Tigra como 69.50 Km y Buena Vista con 26.00 Km.

Los 1115 caminos del cantón se dividen en caminos de asfalto, concreto, tratamiento, lastre, tierra y adoquín la siguiente tabla brindada por la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de San Carlos, detalla la longitud en Km de cada una de las clasificaciones de caminos públicos que se encuentra en cada distrito del cantón:


Tabla II. Distribución de los Caminos por Distrito.

DISTRIBUCIÓN DE LOS CAMINOS POR DISTRITOS Y CLASIFICACION								
No	DISTRITO	Asfalto	Concreto	TSB	Lastre	Tierra	Adoquín	Total
		1	2	3	4	5	6	
		(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)
1	Quesada	68,60	24,64	5,46	135,84	16,25	5,62	256,41
2	Florencia	9,66	4,69	10,63	114,19	7,30	0,00	146,47
3	Buena Vista	1,82	0,20	0,00	18,41	5,57	0,00	26,00
4	Aguas Zarcas	6,17	5,36	2,62	116,35	8,33	0,00	138,83
5	Venecia	17,23	7,12	3,20	80,35	3,10	0,00	111,00
6	Pital	12,01	1,21	6,16	153,90	34,77	0,00	208,05
7	Fortuna	12,80	1,57	12,51	100,98	6,70	0,80	135,36
8	La Tigra	7,16	5,00	3,40	49,98	3,95	0,00	69,50
9	Palmera	7,04	5,82	0,00	60,09	3,70	0,00	76,65
10	Venado	1,30	0,00	0,00	89,21	9,60	0,00	100,11
11	Cutris	5,35	0,00	6,92	296,42	134,36	0,33	443,38
12	Monterrey	2,09	0,34	1,14	149,57	21,77	0,00	174,90
13	Pocosol	6,85	2,62	2,31	304,07	190,53	0,00	506,38
TOTAL		158,07	58,56	54,35	1 669,36	445,94	6,75	2 393,03
Porcentaje		6,61%	2,45%	2,27%	69,76%	18,64%	0,28%	

Fuente: Municipalidad de San Carlos, Unidad Técnica de Gestión Vial (2018)

En el siguiente gráfico se puede apreciar de forma visual como está el cantón de San Carlos con respecto a la longitud de los caminos y su clasificación de acuerdo con el tipo de superficie que posee la red vial, siendo en su gran mayoría lastre con 1669.36 km, seguido de caminos de tierra con 445.94 km, seguido de caminos de tierra con 445.94 km, asfalto con 158.07 km, concreto con 58.56 km, tratamiento con 54.35 km y 6.75 km que corresponden a adoquín.

Gráficos VII Distribución de los Caminos del Cantón de San Carlos Según su Clasificación

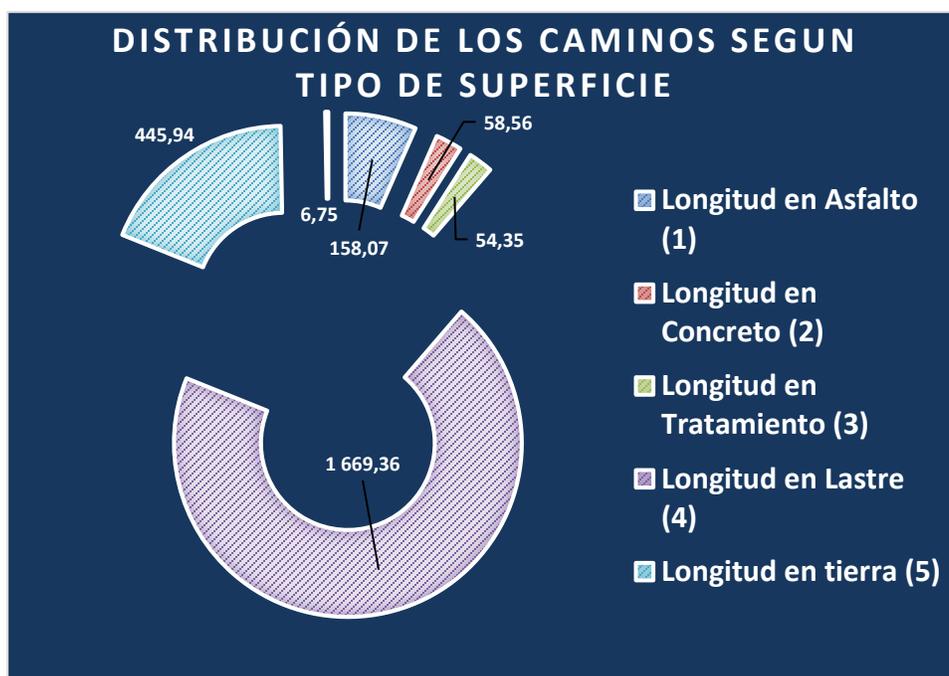

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Unidad Técnica de Gestión Vial (2018)

7. EXTENSIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL EN EL CANTÓN

En cuanto al total de la Red Vial Nacional del país, San Carlos tiene solamente 625,11 Km de rutas nacionales que atraviesan el cantón, las cuales se especifican a continuación:

Tabla III. Red Vial Nacional en el Cantón

Ruta	Sección de Control	DE	A	Long. Km.
0	23333-90	FUENTE DE MATERIALES	SAN CARLOS (2-3)	1
4	21000-00	LIMITE PROV. HEREDIA-ALAJUELA	SAN JOSE O VUELTA DE KOOPER (R.751)	1
4	21011-00	SAN JOSE A VUELTA KOOPER (R.751)	MUELLE DE SAN CARLOS (R-35)	13,93
4	21012-00	MUELLE DE SAN CARLOS (R.35)	EL TANQUE - FORTUNA (R.142)	16,21
4	21351-00	EL TANQUE, FORTUNA (R.142)	MONTERREY, SAN CARLOS (R.752)	12,14
4	21352-00	MONTERREY, SAN CARLOS (R.752)	EL EDEN (LIM. CANTONAL SN. CAR./GUAT).	18,41
35	20640-00	FLORENCIA, SAN CARLOS (R.141)	QUEBRADA AZUL(IGLESIA)	4,76
35	20650-00	QUEBRADA AZUL, FLORENCIA(IGLESIA)	EL MUELLE DE SAN.CARLOS (IGLESIA)	9,84
35	20760-00	PALMARES, ALAJUELA (R.1)	FLORENCIA (R.141) (PROYECTO)	1
35	21060-00	MUELLE, FLORENCIA (IGLESIA)	TERRON COLORADO, POCOSOL (ESC.)	11,4
35	21071-00	TERRON COLARADO. POCOSOL(ESC.)	SANRA ROSA DE POCOSOL (R.752)	8,51
35	21072-00	SANTA ROSA DE POCOSOL (R.752)	RIO POCOSOL. LIM.CANT. SN. CAR./CHILES	7,65



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal



35	21081-00	RIO POCOSOL (LIM. CANT.SC./LOS CHILES	PAVON EL AMPARO (IGLESIA)	19,58
35	21082-00	PAVON. EL AMPARO (IGLESIA)	EL PARQUE. LOS CHILES (IGLESIA)	13,99
35	21083-00	EL PARQUE, LOS CHILES (IGLESIA)	LOS CHILES (MUELLE) (R.138)	11,35
138	21172-00	VERACRUZ (ESCUELA)	CAÑO NEGRO (CRUCE CENTRO POBLAC.)	11,05
138	21173-00	CAÑO NEGRO (CRUCE CENTRO POBLAC.)	LOS CHILES (R.35).	18,58
139	20910-00	MONICO(ESCUELA)	CABAÑAS (R.4-RIO BUENA VISTA)	1
139	21201-00	MONICO (ESCUELA)	CABAÑAS (R.4-RIO BUENAVISTA)	13,23
139	21202-00	VERACRUZ (R-130)	MONICO (ESCUELA)	6,08
140	20661-00	CIUDAD QUESADA (R.141)	LA MARINA (R.748)	10,94
140	20662-00	LA MARINA (R.748)	AGUAS ZARCAS (R.250)	3,98
140	20931-00	AGUAS ZARCAS, SN CARLOS (R.250)	VENEZIA, SN CARLOS (CUADR.IGLESIA)	10,62
140	20932-00	VENEZIA (CUADR. IGLESIA)	LIN.CANT.SN CARLOS/GREC.RIO TORO	3,7
141	20630-00	CIUDAD QUESADA (R.140)	FLORENCIA (R.35)	9,73
141	20681-00	FLORENCIA (R.35)	SANTA CLARA(IGLESIA)	4,72
141	20682-00	SANTA CLARA(IGLESIA)	JAVILLOS (R.738)	4,25
141	20980-00	JAVILLOS (R.738)	EL TANQUE (R.142)	18,88
141	21550-00	LIM. ALF. RUIZ/S. CARLOS (R. LA VIEJA)	CIUDAD QUESADA (R.140)	7,81



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal



142	21341-00	TABACON, FORTUNA (RIO TABACON)	LA FORTUNA (R.702)	11,63
142	21342-00	LIM. GUANA. /ALAJUE.3+600 D. HOTEL	TABACON FORTUNA (RIO TABACON)	9,92
142	21490-00	LA FORTUNA (R-702)	EL TANQUE. FORTUNA (R.4)	9,84
227	21191-00	BUENOS AIRES (R.35)	SAN JOAQUIN (ESC.)	17,16
227	21192-00	SAN JOAQUIN (ESC.)	COOPEVEGA (IGLESIA)	11,04
227	21193-00	COOPEVEGA (IGLESIA)	MORAVIA (ESCUELA)	8,59
250	20671-00	LOS CHILES (R.751)	PITAL (R.744)	8,97
250	20672-00	PITAL (R.744)	SAHINO(IGLESIA)	15,63
250	20673-00	SAHINO (IGLESIA)	BOCA TAPADA (IGLESIA)	15,36
250	20870-00	AGUAS ZARCAS (R.140)	LOS CHILES (R.751)	3,51
702	20880-00	BAJO RODRIGUEZ R-739	CHACHAGUA ENTRADA PRICIPAL	21,73
702	21370-00	CHACHAGUA (ENTRADA PRINCIPAL)	LA FORTUNA (R.142)	12,22
733	21150-00	CHIMURRIA (R.35)	LIM. CANT. L.CHILES/GUAT.O.BOCA TAPA.	22,09
734	21360-00	JICARITO (R.4)	VENADO (IGLESIA)	8,39
734	21120-00	VENADO IGLESIA	CRUCE ST. LUCIA LIMIT PROV. ALA.-GUAN.	11,8
738	20690-00	JAVILLOS (R.141)	SAN ISIDRO DE LA TIGRA (R.702)	5,7
739	20860-00	ESTA ELIMINADA	ESTA ELIMINADA	0
739	21580-00	LIM. CANT. S. RAMON/S. CARL. R. BALSA	FLORENCIA, SAN CARLOS (R.141)	9,32
744	20952-00	PITAL (R.250)	LA TABLA (R.745)	6,47
745	21050-00	PITAL (R.250)	VERACRUZ (R.746)	8,93



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal



745	21401-00	VERACRUZ (R. 746)	CHAPARRON (IGLESIA)	6,83
745	21402-00	CHAPARRON (IGLESIA)	CHAPARRON (FINCA MAJAGUA. LIMIT.)	5,6
746	20970-00	LA LEGUA, EL PEGON (R.250)+C42	VERACRUZ (R.745)	4,98
747	21101-00	SAN FRANCISCO (R. 748)	SAN FRANCISCO (R.4)	2,82
747	21102-00	SAN FRANCISCO (R.4)	LOS LLANOS (R.751)	5
748	20941-00	LA PALMERA, SN CARLOS(IGLESIA)	LA MARINA, PALMERA (R.140)	5,32
748	20942-00	SAN FRANCISCO (R.747)	LA PALMERA, SAN CARLOS (IGLESIA)	4,1
748	20943-00	PLATANAR, FLORENCIA (R.35)	SAN FRANCISCO, PALMERA (R.747)	8,75
749	21380-00	LOS LLANOS (R.751)	LA GLORIA CRUCE COOP. SAN JUAN	12,18
750	21390-00	HACIENDA ALTAMIRA (R. 751)	VASCONIA (ESCUELA)	8,56
751	20991-00	SAN JORGE (R.753)	BOCA ARENAL (R.35)	7,82
751	20992-00	HACIENDA ALTAMIRA (R.750)	SAN JORGE (R.753)	10,1
751	20993-00	VUELTA DE KOOPER (R.4)	HACIENDA ALTAMIRA (R.750)	7,79
751	20994-00	LOS CHILES (R.250)	VUELTA DE KOOPER (R.4)	3,77
752	21141-00	MONTERREY (R.4)	CHAMBACU (IGLESIA)	6,08
752	21142-00	CHAMBACU (IGLESIA)	SAN BOSCO (IGLESIA)	7,71
752	21143-00	SAN BOSCO (IGLESIA)	SANTA ROSA (R.35)	7,43
753	21091-00	SAN JORGE (R.751)	SAN MARCOS (IGLESIA)	9,77
753	21092-00	SAN MARCOS (IGLESIA)	BETANIA (ESCUELA)	6,86

Fuente: Municipalidad de San Carlos, Unidad Técnica de Gestión Vial (2018)

B. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED VIAL DEL CANTÓN

Seguidamente se detallan características de la RVC del cantón:

1. EXTENSIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL CLASIFICADA, NO CLASIFICADA Y CUADRANTES Y CALLES URBANAS

La Red Vial Cantonal de San Carlos está constituida por: Caminos Vecinales o Clasificados, Calles Urbanas o Locales y Caminos no Clasificados.

Los 2393,03 Km corresponden a 1115 caminos de la Red Vial del Cantón se dividen por Km de la siguiente manera de acuerdo con caminos Clasificados, no Clasificados y Cuadrantes y Calles Urbanas:

Tabla IV. Extensión y Clasificación de la Red Vial Cantonal

Extensión de la Red Vial	(Km)
Caminos Clasificados	613,16 km
Caminos no Clasificados	1587,98 Km
Cuadrantes y Calles Urbanas	191,89 km
Total	2393,03 km

Fuente: Municipalidad de San Carlos, Unidad Técnica de Gestión Vial (2018)

Un detalle más minucioso de la Red Vial Cantonal se detalla en la siguiente tabla, al expresar la longitud en Km de los Caminos Clasificados, Caminos no Clasificados, Cuadrantes y Calles Urbanas, por cada uno de los distritos del Cantón de San Carlos.

Tabla V. Extensión y Clasificación por distrito de la Red Vial Cantonal

Nº	Distrito	Caminos Clasificados	Caminos no Clasificados	Cuadrantes y Calles Urbanas
1	Quesada	106,60	70,87	78,94
2	Florencia	83,80	15,00	47,67
3	Buenavista	19,80	0,00	6,20
4	Aguas Zarcas	94,33	21,00	23,50
5	Venecia	68,30	8,40	34,30
6	Pital	129,30	21,60	57,15
7	La Fortuna	76,37	12,39	46,60
8	La Tigra	48,10	4,40	17,00
9	La Palmera	62,25	5,30	9,10
10	Venado	91,20	2,61	6,30
11	Cutris	338,08	8,60	96,70
12	Monterrey	144,30	5,30	25,30
13	Pocosol	325,55	16,43	164,40
	Total	1 587,98	191,89	613,16

Fuente: Municipalidad de San Carlos, Unidad Técnica de Gestión Vial (2018)

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA RED VIAL DEL CANTÓN

La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de San Carlos, realiza evaluaciones periódicas de la Red Vial Cantonal que le permite clasificar los distintos caminos que tiene el cantón de acuerdo con su estado en las siguientes categorías: Excelente, Bueno, Regular, Malo y Muy Malo.

En el año 2017 se realizó la última evaluación por la UTGV para la Red Vial Cantonal y es la que se encuentra vigente, la siguiente tabla muestra los resultados de este diagnóstico:

Tabla VI. Estado de la Red Vial de San Carlos 2017

Característica	Excelente	Bueno	Regular	Malo	Muy Malo	Total
Código de Clasificación	5	4	3	2	1	
	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)
Longitud Asfalto	102,82	61,62	1,37	2,92	0,00	168,72
Longitud Concreto	49,11	6,97	2,57	0,00	0,50	59,15
Longitud Tratamiento	14,16	18,87	12,58	2,00	0,00	47,61
Longitud Lastre	161,14	679,25	670,61	118,38	36,80	1 666,18
Longitud Tierra	10,00	32,96	189,94	104,50	107,55	444,94
Longitud Adoquines	2,16	0,16	4,10	0,00	0,00	6,42
Total	339,39	799,82	881,17	227,79	144,85	2 393,03

Fuente: Municipalidad de San Carlos, Unidad Técnica de Gestión Vial (2018)

C.SUPUESTOS DE LA FORMULACIÓN

Cada proyecto implica la posibilidad de riesgos de diferentes tipos, que pueden afectar la ejecución del mismo, esos riesgos son los supuestos de la formulación, los cuales se refieren a aquellas variables (financieras, macroeconómicas, técnicas y de vulnerabilidad), que pudieran afectar el cumplimiento del Plan Quinquenal, por lo que a la hora de formularlo se deben tomar las previsiones correspondientes bajo el supuesto de que si llevamos a cabo las actividades indicadas y ciertos supuestos se cumplen, entonces produciremos los componentes y por ende el propósito del proyecto.

Por estas razones se identifican los siguientes posibles hechos con un grado razonable de probabilidad:

3. FINANCIEROS

Los supuestos financieros hacen referencia a las situaciones que pueden cambiar el monto de los recursos financieros destinados para dar cumplimiento al Plan Quinquenal, seguidamente se especifican:

✓ SUPUESTO FC-1.

La Modalidad Participativa de Ejecución de Obras, establecida en la Ley 8114, es uno de los ejes fundamentales que se deben tomar en consideración en las comunidades para organizarse y formar los Comités de Caminos, permitiendo que el trabajo en equipo entre la municipalidad y las comunidades para la realización de los proyectos en la RVC. De acuerdo con esto se estima que el aporte Comunal para el próximo quinquenio es de 2,16% anual del total del monto de los recursos financieros destinados para dar cumplimiento al Plan Quinquenal.

✓ SUPUESTO F8114-1.

La Ley 8114 establece que, del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único del combustible, se destinará el 75% a la Red Vial Nacional (RVN) y el restante 25% a la Red Vial Cantonal (RVC), de esta manera se justifica que la Municipalidad de San Carlos, como responsable directa de la conservación de la RVC, se estima para el 2018 un aporte general de $\text{C}\$108\,718\,942\,600,00$ millones de colones, de los cuales le corresponde a la municipalidad para el 2018 un monto es de $\text{C}\$4\,418\,146\,625,00$ millones de colones. Se presume un crecimiento anual de 10% para los próximos 5 años.

✓ SUPUESTO FM-1.

La Ley 7729, que respalda la recaudación de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, permite que de los impuestos percibidos se asigne, de acuerdo con las necesidades del cantón, un porcentaje para el Mantenimiento de Caminos y Calles, así también como para la Atención de Emergencias Cantonales, Obras de Infraestructura en Caminos del Cantón, Cementados en el Cantón y Obras Menores de Infraestructura. En promedio el monto estipulado para dichos servicios e inversiones comunales para el 2018 es equivalente a ₡1.707.623.377,34 anuales y este monto va a tener un aumento anual del 10% aproximadamente para los próximos 5 años, considerando el crecimiento en las necesidades del cantón.

✓ SUPUESTO F6909-1.

La venta del antiguo Palacio Municipal de San José favorece y crea un Impuesto de Ruedo a favor de las Municipalidades del país (Ley 6909). Esta ley decreta un impuesto por la suma fija de doscientos colones, por cada vehículo automotor, suma que se cancelará anualmente junto con los derechos de circulación. La distribución de lo recaudado por este concepto se hará en la misma proporción que el impuesto territorial que corresponde a cada municipalidad. El producto de este impuesto deberá dedicarse exclusivamente a los programas de mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales, adquisición de maquinaria y equipo para esos efectos. El monto que se otorga a la municipalidad es contemplado en el presupuesto de obras de infraestructuras y calles.



✓ SUPUESTO FBN-01.

Se realizó un financiamiento con el Banco Nacional de Costa Rica, el cual va a utilizar en la implementación de varias actividades en diferentes caminos del cantón para el 2018. El monto que se va a utilizar es de $\text{C}\$5\,413\,600\,000,00$, el cual se contempla en el presupuesto.

✓ SUPUESTO FBID-1.

De acuerdo con la Ley N^o8757 “Ley de Aprobación del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CR-X1007) entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Programa de Infraestructura de Transporte (PIT)”, se permitirá la transferencia de \$200 millones de dólares a las Municipalidades del país, para que los gobiernos locales ejecuten sus respectivos proyectos.

De la totalidad de esta suma, las municipalidades tendrán una asignación de recursos disponibles para proyectos de caminos, de acuerdo con los siguientes parámetros: el sesenta por ciento (60%) según la extensión de la red vial de cada cantón, y un cuarenta por ciento (40%) según la cantidad de población de cada cantón, conforme las cifras más actualizadas del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La Municipalidad de San Carlos de acuerdo con este convenio va a recibir un monto de $\text{C}\$2\,635\,592\,068,00$ de colones para los primeros 3 años del quinquenio, que se distribuirá en la ejecución de varias obras programadas de acuerdo con los parámetros establecidos por ley. Los siguientes años se espera recibir un monto similar con un aumento aproximado de un 10% anual.

En la siguiente tabla se detallan los caminos que están programados a ejecutar para los primeros tres años.

Tabla VII. Distribución del Aporte BID primeros 3 años del quinquenio

Descripción de Inversión para los recursos del BID PRVC-11			
Actividades por ejecutarse para el año 2018			
Número de Camino	2-10-069	2-10-075	2-10-520
Distrito	Fortuna	Fortuna	Fortuna
Ruta	DE: Ent. Ruta#4, San Cristóbal. A: Ent. R 141, Los Ángeles, plaza.	DE: Ent. R 141, Los Ángeles. A: El Bosque Lim Cantonal	DE: Cruce Tres Esquinas, A: Lim Río Burro
Comunidades Beneficiadas	San Isidro, Los Ángeles, Santa Cecilia, Calle del Amor.	Los Ángeles, El Burro, Tres esquinas, Santa Lucía.	Los Ángeles, El Burro, Tres esquinas, Santa Lucía.
Tipo de intervención	Colocación carpeta Asfáltica.	Refuerzo de la estructura de pavimento, y la construcción de una carpeta de concreto asfáltico caliente.	Refuerzo de la estructura de pavimento y la construcción de una carpeta de concreto asfáltica en caliente.
Longitud de intervención (Km)	4+700Km	4+640Km	
Monto asignado	De la estación 0+000 a 4+700 ₡ 573.670.996,61	De estación 4+700 a 9+340 ₡ 500.881.719,55	
Estado de avance	Consulta Socio Ambiental realizada el 14/12/17. Se cuenta con la pre aprobación del BID		
Total Km a intervenir	9+340 Km		
Total aporte BID	₡ 1.074.552.716,16		

Descripción de Inversión para los recursos del BID PRVC-11			
Camino que implementarse para el 2019 y 2020			
Número de Camino	2-10-175	2-10-148	2-10-041
Distrito	Pital	Venecia	Aguas Zarcas
Ruta	De: (Ent. Ruta#250, Calle Palmar, A: Ent.	De: Ent. Ruta#140, Calle San Cayetano (De: Ent. Ruta#140, Los negritos, A: Ent.

	Ruta #746, Veracruz)	0,9 Km cam #49), A: Fin camino, Finca Fernando Obando.	Ruta#250, Los Chiles.
Comunidades Beneficiadas	Sahino, El Pegón, el Palmar, Veracruz, Castelmare, Boca tapada y Boca San Carlos.	Por definir	Pitalito, Esquipulas y Aguas Zarcas.
Tipo de intervención	Refuerzo de la estructura de pavimento, y la construcción de una carpeta de concreto asfáltico en caliente y construcción cunetas revestidas, además señalamiento horizontal y vertical.	Por definir	Rehabilitación del sistema de drenaje y construcción de una carpeta asfáltica entre las estaciones 3+900 a 7+600.
Longitud de intervención (Km)	4+085 Km	Por definir	3+700Km
Monto asignado	De estación 0+000 a a4+085 ¢767.627.301,86	Por definir	De estación 3+900 a 7+600 ¢793.412.050,00
Estado de avance	Aún <u>no se ha realizado</u> la Consulta Socio Ambiental. <u>Se cuenta</u> con pre aprobación del BID.	Aún <u>no se ha realizado</u> la Consulta Socio Ambiental. <u>No se cuenta</u> con pre aprobación del BID.	Aún <u>no se ha realizado</u> la Consulta Socio Ambiental. <u>No se cuenta</u> con pre aprobación del BID. Es un Remanente del PRVC-1+
Total Km a intervenir	4+085 Km	Por definir	3+700Km
Total aporte BID	¢607.796.997,40 (total con contrapartida: ¢767.627.301,86)	Por definir	¢512.719.550,00 (total con contrapartida: ¢793.412.050,00)

Fuente: Municipalidad de San Carlos

En síntesis, se afirma que este dinero destinado para la Municipalidad por parte del “Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión” es un aporte fijo con el que podrá disponer la Municipalidad para el próximo quinquenio.

4. MACROECONÓMICOS

En los supuestos macroeconómicos se toman en consideración como está siendo la situación de la economía, su estructura, su nivel de complejidad y hacia dónde se dirige o como se prevé va a evolucionar. En este trabajo se refiere a los aspectos de la economía del país que podrían afectar el cumplimiento del Plan Quinquenal.

Uno de los principales aspectos macroeconómicos es el precio del petróleo, ya que el combustible da sustento al contenido económico del financiamiento para la atención de la Red Vial Cantonal.

✓ SUPUESTO MEC-2.

Según el informe presentado por el Banco Central de Costa Rica a diciembre 2017, la economía mundial continuó recuperándose para este año, presentándose una mayor estabilidad a nivel internacional. Algunas organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman que continuara creciendo, no obstante, hay riesgos que pueden propiciar un descenso como el proteccionismo comercial, la desmejora en las condiciones financieras y tensiones geopolíticas.

La inflación de Costa Rica en el 2016-2017 mostro una aceleración pasó de 0.8% en diciembre del 2016 a 2,5% en noviembre del 2017, sin embargo, aunque aumento estuvo por debajo del límite programado a nivel macroeconómico el cual es del (3% \pm 1 p.p.), y fue hasta setiembre del año anterior que logro alcanzarlo. Este incremento de la inflación general se presentó debido a la recuperación en el precio de las materias primas, (especialmente el petróleo), a la depreciación del colon y a la evolución de sus determinantes macroeconómicos.

La inflación, la cual es medida por la variación interanual de precios al consumidor, se estima según las proyecciones para el 2018 y 2019 continuará dentro del rango meta para nuestro país. Sin embargo, se establecen riesgos que podrían afectar este rango como lo son el deterioro de las finanzas públicas y la incertidumbre internacional.

Dos de los factores de la inflación presentada en el 2017 fueron el aumento generado en el precio del petróleo y el alza en el tipo de cambio, generando un aumento en los combustibles; lo cual en nuestro país representa un cambio potencial de las tarifas y precios establecidas en el Índice de Precios del Consumidor, así como la electricidad y el transporte público.


En Costa Rica, la subida de precios del petróleo y de los alimentos impactó minuciosamente, como se puede observar en la siguiente tabla según datos de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), el alza en los combustibles ha ido aumentando consecutivamente, en el gráfico VII se aprecia el crecimiento de manera ilustrativa.

Tabla VIII. Precio del Combustible Años 2016-2017 y 2018

Precio de Consumo Final			
Colones por Litro			
	Súper	Plus	Diesel
AÑO 2016	559	536	449
AÑO 2017	592	562	475
AÑO 2018	604	593	514

Fuente: RECOPE

Gráficos VIII Precio del Combustible Años 2016-2017 y 2018

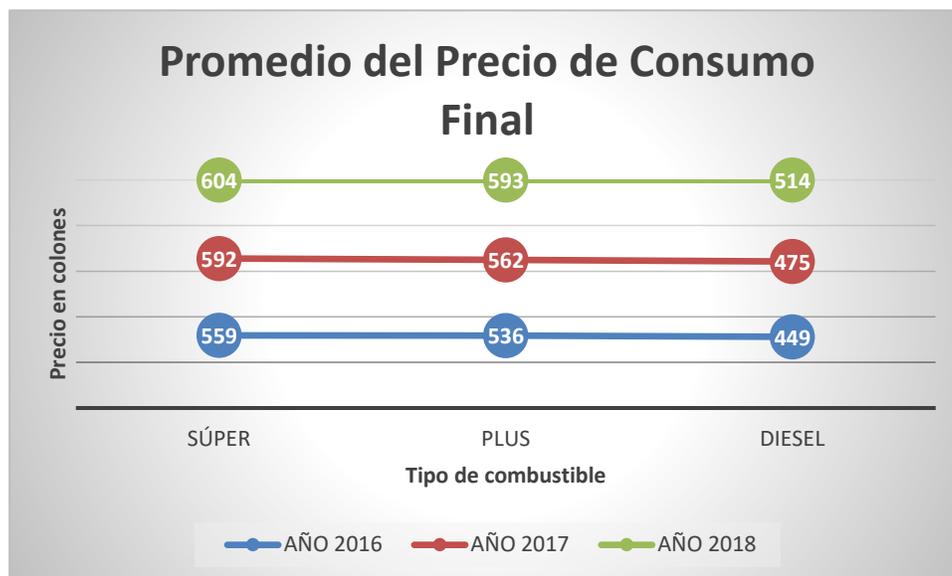

Fuente: Elaboración propia con información de RECOPE

En Costa Rica los precios de los combustibles están controlados al nivel de productor y son definidos utilizando una relación paramétrica con base en los precios internacionales, con reajuste periódico. Para la distribución y la venta al por menor, los precios están liberados (los precios del combustible no los controla el productor porque se trata de un monopolio, ni están liberados por el contrario los mismos son regulados por la ARESEP Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos). Los precios para noviembre 2017 se pueden visualizar en la siguiente tabla:

Tabla IX. Precios al consumidor para noviembre 2017

PRODUCTOS	Precio / litro total
Gasolina Super	605,00
Gasolina Plus 91	581,00
Diesel 50	513,00
Keroseno	432,00
Av-Gas	887,00
Jet fuel-A1	514,00

Fuente: RECOPE. Precios publicados en La Gaceta No. 210, del 07 de noviembre 2017.

La estabilidad de la inflación trae beneficios positivos para la sociedad costarricense, reflejada en la estabilidad de las tasas de interés, tipo de cambio y salarios, crea un ambiente confianza y estabilidad para la población con beneficios al crecimiento, la generación de empleo, equidad y eficiencia de la economía.

En la siguiente ilustración se pueden visualizar las proyecciones de inflación que realiza el Banco Central para el 2018 y 2019. En la imagen se aprecia como la variación se estimada va ser muy pequeña de un año a otro.

Ilustración XIII Proyecciones de inflación subyacente y medida por IPC

Cuadro 9. Proyecciones de inflación: subyacente y medida por IPC
-variación interanual, en porcentaje-

Trimestre	Valor central	
	Subyacente	Medida por IPC
IV-2017 ¹	2,2	2,5
I- 2018	2,6	2,7
II- 2018	2,9	3,5
III-2018	3,1	3,9
IV-2018	3,2	4,0
I- 2019	3,2	3,7
II- 2019	3,2	3,3
III-2019	3,2	3,3
IV-2019	3,2	3,4

¹ Preliminar.

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Fuente: Banco Central de Costa Rica

De acuerdo con la información anterior se puede afirmar que el combustible va a presentar un aumento considerable con pocas variaciones anuales en el precio para los próximos años, lo que significa por consiguiente que la recaudación del impuesto único de combustible también se va a acrecentar, lo que trae como consecuencia que la Ley 8114 logre recaudar más fondos para la conservación vial.

Finalmente, de acuerdo con los datos recolectados se afirma que el precio del petróleo es un aspecto de la economía del país que puede afectar el cumplimiento del Plan Quinquenal, ya que este es uno de los aspectos que dan sustento del contenido económico del financiamiento para la atención de la Red Vial Cantonal, de ahí surge la importancia de que si aumenta el precio del combustible aumenta por consiguiente el monto que la Ley 8114 destina para el mantenimiento de Red Vial Cantonal y el desarrollo del cantón.

5. TÉCNICOS

Dentro del marco macroeconómico se encuentran los criterios técnicos los cuales corresponden a (opinión profesional) para identificar y priorizar los proyectos y componentes que necesitan ser intervenidos.

✓ SUPUESTO IVTS-3.

El Índice de Viabilidad Técnico Social (IVTS) determina la importancia relativa de una calle o camino dentro del cantón. El IVTS se calcula con base en la información recopilada mediante un inventario socioeconómico que brinda información sobre el impacto social y económico del camino. La cuantificación de cada uno de los criterios ahí considerados permite la obtención del índice relativo entre 0 y 100, que indica el grado de importancia de la vía. Entre mayor es el índice, mayor importancia reviste el camino o calle en estudio.



El cálculo del IVTS se basa en 6 componentes principales que son: 1. Infraestructura local. 2. Cantidad de viviendas por kilómetros. 3. Proyectos de desarrollo nacional. 4. Proyectos de desarrollo social. 5. Criterios económicos. 6. Accesibilidad, grado de desarrollo actual del camino y fuentes de material. (Ver

Anexo 1. Formulario de Evaluación Técnico-Social).

Este parámetro está orientado fundamentalmente a la evaluación de los caminos de la Red Vial Cantonal, a pesar de que con algunas adaptaciones también puede aplicarse a la evaluación socioeconómica de calles urbanas.

Con base en este IVTS se hace una priorización de los proyectos para las intervenciones de la Red Vial Cantonal, sin embargo, también se toma en cuenta la organización comunal, este es un punto significativo para realizar las intervenciones en las vías, ya que la facilidad para intervenir en una comunidad organizada es mayor que en una comunidad que no posee el interés de colaborar.

Es decir, para la UTGV es preferible trabajar en comunidades que, aunque no tengan un IVTS alto, si tienen una gran organización comunal, así mismo mediante esta distinción la UTGV incentiva a cumplir con la Modalidad Participativa de Ejecución de Obras, establecida en la Ley 8114. A esta Modalidad se le conoce también como Conservación Vial Participativa y se refiere a la coordinación y cooperación que se establece entre la Municipalidad, el Gobierno Central, las organizaciones comunales y la sociedad civil de un cantón; con la finalidad de planificar, ejecutar, controlar y evaluar obras de diversa índole, contempladas dentro de la conservación y construcción vial, en el entendido que la ejecución de recursos no implica el traslado horizontal de los mismos de una organización a otra. Su aplicación contribuye a garantizar la sostenibilidad de las vías, ya que además de los recursos del Gobierno y la Municipalidad, permite incorporar los valiosos aportes de las comunidades y la sociedad civil en general, en efectivo o en especie. Esta modalidad, requiere acompañar las obras técnicas con otros elementos como organización, capacitación, promoción y control social, que motiven el interés de los usuarios, la cooperación y la solidaridad.

6. VULNERABILIDAD A LOS DESASTRES NATURALES

Los desastres naturales se han presentado durante los años, muchos de ellos como producto de la acción del hombre en su entorno con la manipulación de la tecnología o avances científicos, los desastres generan enormes pérdidas materiales y vidas humanas, ejemplo de ello son los eventos o fenómenos en las comunidades como los terremotos, inundaciones, deslizamientos deforestación, contaminación ambiental y otros.

De igual manera cuando se afecta el normal desarrollo social de una comunidad debido a peligros naturales, causando incalculables pérdidas de vidas humanas y materiales es considerado un desastre.



Los desastres naturales pueden afectar la Red Vial Cantonal, la fuerza de naturaleza no libera a los caminos de peligro, ni de la vulnerabilidad a los mismos. Recordemos las municipalidades son las responsables directas de la Red Vial Cantonal, por ende, los gobiernos locales les corresponde organizarse y arreglar las vías afectadas por una catástrofe, cabe recalcar que en estos casos se recibe el apoyo económico de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para sobrellevar las consecuencias que se generen. El aporte solo es brindado por la CNE en estos casos de emergencia.

El cantón de San Carlos es muy vulnerable a los desastres naturales, muestra de ello es el actual sistema de comunicación vial terrestre, el cual tiene varios factores que aumentan su vulnerabilidad como lo son: la alta precipitación pluvial, suelos inestables, sismicidad, erupciones volcánicas y deforestación. Estos factores producen fragilidad de las laderas, quebradas y suelos, afectando las carreteras y puentes principalmente. Además, son responsables de inundaciones, deslizamientos, avalanchas, desprendimientos, erosiones, destrucciones de rellenos y colapsos de infraestructuras existentes, que afectan el cantón especialmente en época de invierno.

De acuerdo con la información registrada por la Unidad Técnica de Gestión Vial, la mayoría de los desastres que se han generado en el cantón son por causa de la alta precipitación pluvial.

El Cantón de San Carlos posee una red fluvial caracterizada por ser muy dispersa y muy baja, la misma cuenta con el mayor grupo de ríos y quebradas del país que se pueden considerar junto con la precipitación pluvial el punto focal de las amenazas hidrometeorológicas, dicha red de drenaje está compuesta por:



- Río San Carlos
- Río Toro
- Río Tres Amigos
- Río Kopper
- Río Aguas Zarcas
- Río Guayabo
- Quebrada Providencia
- Río San Juan
- Quebrada San Pedro
- Quebrada San Isidro
- Río Platanar
- Quebrada Florida
- Río Peñas Blancas
- Quebrada Pital
- Río Peje
- Río Ron Ron

La ocupación de las planicies de inundación y el desarrollo urbano sin planificación son dos de los motivos que han producido que algunos de estos ríos y quebradas hayan disminuido el periodo de recurrencia de inundaciones.



El deterioro de las cuencas hidrográficas producido por el desarrollo agropecuario, sin tomar en consideración las leyes que regulan el desarrollo urbano y forestal, así como el lanzamiento de basura a los ríos, generado por la construcción de viviendas en forma muy cercana a los cauces, han generado la reducción de la capacidad hidráulica de los ríos y como consecuencia el desbordamiento de ríos y quebradas.

Seguidamente se detallan las zonas o barrios que pueden ser afectados y poseen alto riesgo por las inundaciones o avalanchas de los ríos y quebradas antes mencionadas:

- Quebrada Santa Clara: Santa Rita de Florencia
- Río Peñas Blancas: San Isidro, Trinidad, La Perla, Bonanza
- Río Peje: Peje Viejo
- Río Ron Ron: Ron Ron
- Río San Carlos: Javillos, Platanar, Muelle, Boca Arenal, Terrón Colorado, Santa Cecilia, Boca Tapada, Boca San Carlos
- Río Turo: Pital, Veracruz, Chaparrón
- Río Tres Amigos: Cantarrana, Gloria, Vegas, V. Barva, V. Tablón
- Río Kopper: Cerro Cortés, Kopper
- Río Aguas Zarcas: Aguas Zarcas, V. Kopper, Llano, Altamira
- Quebrada Providencia: San Gerardo, Providencia
- Quebrada San Pedro: Corazón de Jesús, B, Quesada

- Río Platanar: Platanar
- Quebrada Pital: Pital, Encanto, Bellavista, Los Ángeles, Q. Grande

El cantón también posee amenazas geológicas que pueden propiciar daños en la RVC, entre estas están:

6.1 AMENAZAS SÍSMICAS

El cantón de San Carlos posee una serie de fuentes sísmicas de importancia, que en caso de sismo o terremoto pueden generar daños considerables para la población e infraestructura. Seguidamente se menciona los efectos geológicos de un evento sísmico importante cerca del cantón:

- En aquellos sitios donde hay rellenos poco compactos o bien suelos que por su origen favorecen este proceso se pueden generar amplificaciones de la intensidad sísmica. Los poblados que tienen vulnerabilidad son: Ciudad Quesada, Fortuna, Muelle de San Carlos, Santa Eulalia, El Tanque, Los Ángeles, San Cristóbal, Boca Arenal, Terron Colorado, Boca Providencia, Santa Clara, San Rafael, Platanar, Boca San Carlos, La Flor, Santa Rita, Gloria, Josefina.

- El norte del cantón posee una topografía y tipo de suelo que es más propensa a deslizamientos de diversa magnitud. Los poblados más vulnerables son: Cedral, Florencia, San Juan, Platanar y Santa Teresa.
- Existe una alta probabilidad de que se generen derrumbes pequeños en cortes de caminos.
- Hay fracturas en el terreno, las cuales pueden causar daños a viviendas, líneas vitales, etc.
- Asentamientos de terreno, se dan en suelos poco compactos y donde se han hecho rellenos.

6.2 AMENAZA VOLCÁNICA

Uno de los principales atractivos turísticos del cantón corresponde al Volcán Arenal, el cual se encuentra ubicado en la zona de la Fortuna a unos 25 km al Noreste de Ciudad Quesada, dentro de los límites del cantón de San Carlos y en la cordillera volcánica, el cual en 1968 presentó violentas explosiones, emisiones de gases, cenizas, lavas y lanzamiento de bloques, afectando severamente áreas ubicadas hasta a 15 km de la erupción y dejando 87 personas fallecidas.

Después de este lamentable hecho el volcán permaneció 42 años activo generando un espectáculo que llamó la atención de miles de turistas, pero desde el 2010 el volcán ha permanecido en reposo y es constantemente monitoreado para la seguridad de sus habitantes y visitantes.

Los poblados más importantes vulnerables a actividad de este volcán son: Fortuna, La Guaria, La Palma.

6.3 DESLIZAMIENTOS (INESTABILIDAD DE SUELOS):

Las características topográficas y geológicas propias del cantón de San Carlos hacen que este sea vulnerable a procesos como la inestabilidad de suelos. Lo poblados que se encuentran ubicados al norte y al noreste de Ciudad Quesada son los más propensos a deslizamientos como lo son Cedral Sur y Norte, Florencia, San Juan, Platanar y Santa Teresa. Además, cualquier lugar del cantón donde se hallan hecho cortes de caminos y tajos tienen más probabilidades de sufrir de este tipo de proceso.

La calidad en los estándares de diseño y construcción la infraestructura juega un papel fundamental para disminuir el impacto de los desastres naturales, otro factor es la ausencia de protecciones como muros, diques entre otros. En los diseños de muchas obras, con frecuencia se ignora el parámetro de la vulnerabilidad y a consecuencia de ello, las infraestructuras resultan afectadas, dañadas o destruidas a consecuencia de los desastres.

Se reconoce que la infraestructura del sector transporte es la que posibilita la movilidad de las personas y el manejo de cargas del comercio intrarregional, por lo que es de gran interés para el gobierno local procurar su permanente funcionamiento, más en un cantón tan productivo como lo es San Carlos. La vulnerabilidad de la infraestructura del sector transporte influye directamente en el incremento de los riesgos de otros sectores sociales, en especial la salud pública, el empleo, sectores productivos y la educación. Recíprocamente, la eficacia de los proyectos de mejoramiento que se emprenden con apoyo en las experiencias recogidas en situaciones de postdesastre, conduce a la recuperación y fortalecimiento de la infraestructura mencionada.

De acuerdo con lo anterior se afirma que la Municipalidad de San Carlos toma las provisiones necesarias para atender emergencias causadas por eventos naturales, de acuerdo con los siguientes supuestos:

✓ SUPUESTO VDS1-4.

La Municipalidad de San Carlos ha atendido importantes emergencias en el último quinquenio que han afectado la Red Vial Cantonal, de acuerdo con los datos de la UTGV se tiene un registro de los casos atendidos del año 2012 al 2017, durante este periodo surgieron 59 emergencias por desastres naturales. Las situaciones se presentaron principalmente en los distritos Ciudad Quesada, La Tigra, Aguas Zarcas, Cutris, Pocosol y Florencia, los mismos fueron atendidos, con recursos proporcionados por la Comisión Nacional de Emergencias y por contribuciones propias del municipio, en algunos casos se cuenta también con aporte de las comunidades. El monto aportado por la CNE es muy variable y va a depender de la dimensión de la situación.

En el siguiente grafico se detalla el comportamiento de los desastres naturales en el este periodo 2012 al 2017, en el cual se aprecia como el año 2013 fue el que presento mayores emergencias con un total de 16 casos registrados:

Gráficos IX Estadísticas registradas en la Municipalidad de San Carlos por Desastres Naturales 2012-2017



Fuente: Datos Proporcionados por la UTGV

✓ **SUPUESTO VDS2-4.**

La UTGV posee un presupuesto de ₡7 000000 millones de colones para este año y se prevé tendrá un crecimiento anual para el próximo quinquenio de un 10% anual, para emergencias surgidas por desastres naturales que afecten la Red Vial Cantonal.

✓ **SUPUESTO VDS3-4.**

El presupuesto destinado para emergencias provocadas por desastres naturales que afecten a la RVC es aportado por la recaudación de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, y por la Ley 8114. La CNE aporta de acuerdo con la magnitud del desastre y a la solicitud de recursos que la municipalidad le efectúe.

D.POLÍTICAS Y CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN

Las políticas y criterios de intervención, se refiere a políticas gubernamentales de desarrollo nacional y regional, ley y reglamentos de regulación que sustentan los proyectos del Plan Quinquenal.

1. CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN


En torno a la gestión vial del país, en Costa Rica los Planes Quinquenales tienen su asidero jurídico primordialmente en el Decreto N° 34624-MOPT, Reglamento al Artículo 5°, inciso b. de la Ley 8114, denominada Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, sin embargo también lo respaldan otras leyes y decretos tales como: Ley N° 7794 “Código Municipal”, Ley N° 5060 “Ley General de Caminos Públicos”, Ley N° 7755 “Control de las Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional”, Ley N° 7729 “Ley Impuestos Sobre Bienes Inmuebles”, Ley N° 7331” Ley de Tránsito por Vías Publica Terrestres”, Ley N° 8757 “Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el Programa de Infraestructura de Transporte”, Decreto N° 27917, Decreto N° 30263-MOPT, entre otros.



Una vez realizado un repaso de la legislación que se relaciona con el tema vial cantonal, se propone un esquema integrador que contiene las leyes y decretos de regulación más significativas que sustentan los proyectos del Plan Quinquenal de la Red Vial Cantonal. Dicho esquema se ha estructurado en forma de un mapa estratégico, donde se muestran: primero los recursos, luego el talento humano, los procesos y los beneficiarios. La lógica es esta: se deben gestionar adecuadamente los recursos financieros asignados por ley a la red vial cantonal, y para ello los actores involucrados (talento humano) deben conocer sus roles y ejecutarlos adecuadamente, para desarrollar apropiadamente los **procesos** que garanticen la mayor satisfacción y bienestar de los usuarios con su red vial **cantonal (beneficiarios)**. Por lo anterior, la secuencia lógica de lectura del esquema integrador es de abajo hacia arriba.

En el [Anexo 4](#), se muestra el acuerdo del lunes 22 de enero del 2018 del Concejo Municipal de San Carlos mediante el cual en el Artículo N 04, Acta N 05 acordó continuar con las políticas aquí establecidas ya que atienden lo que se requiere del Plan Vial Cantonal.

Ilustración XIV. Mapa estratégico de los asuntos legales relacionados con el tema de red vial cantonal

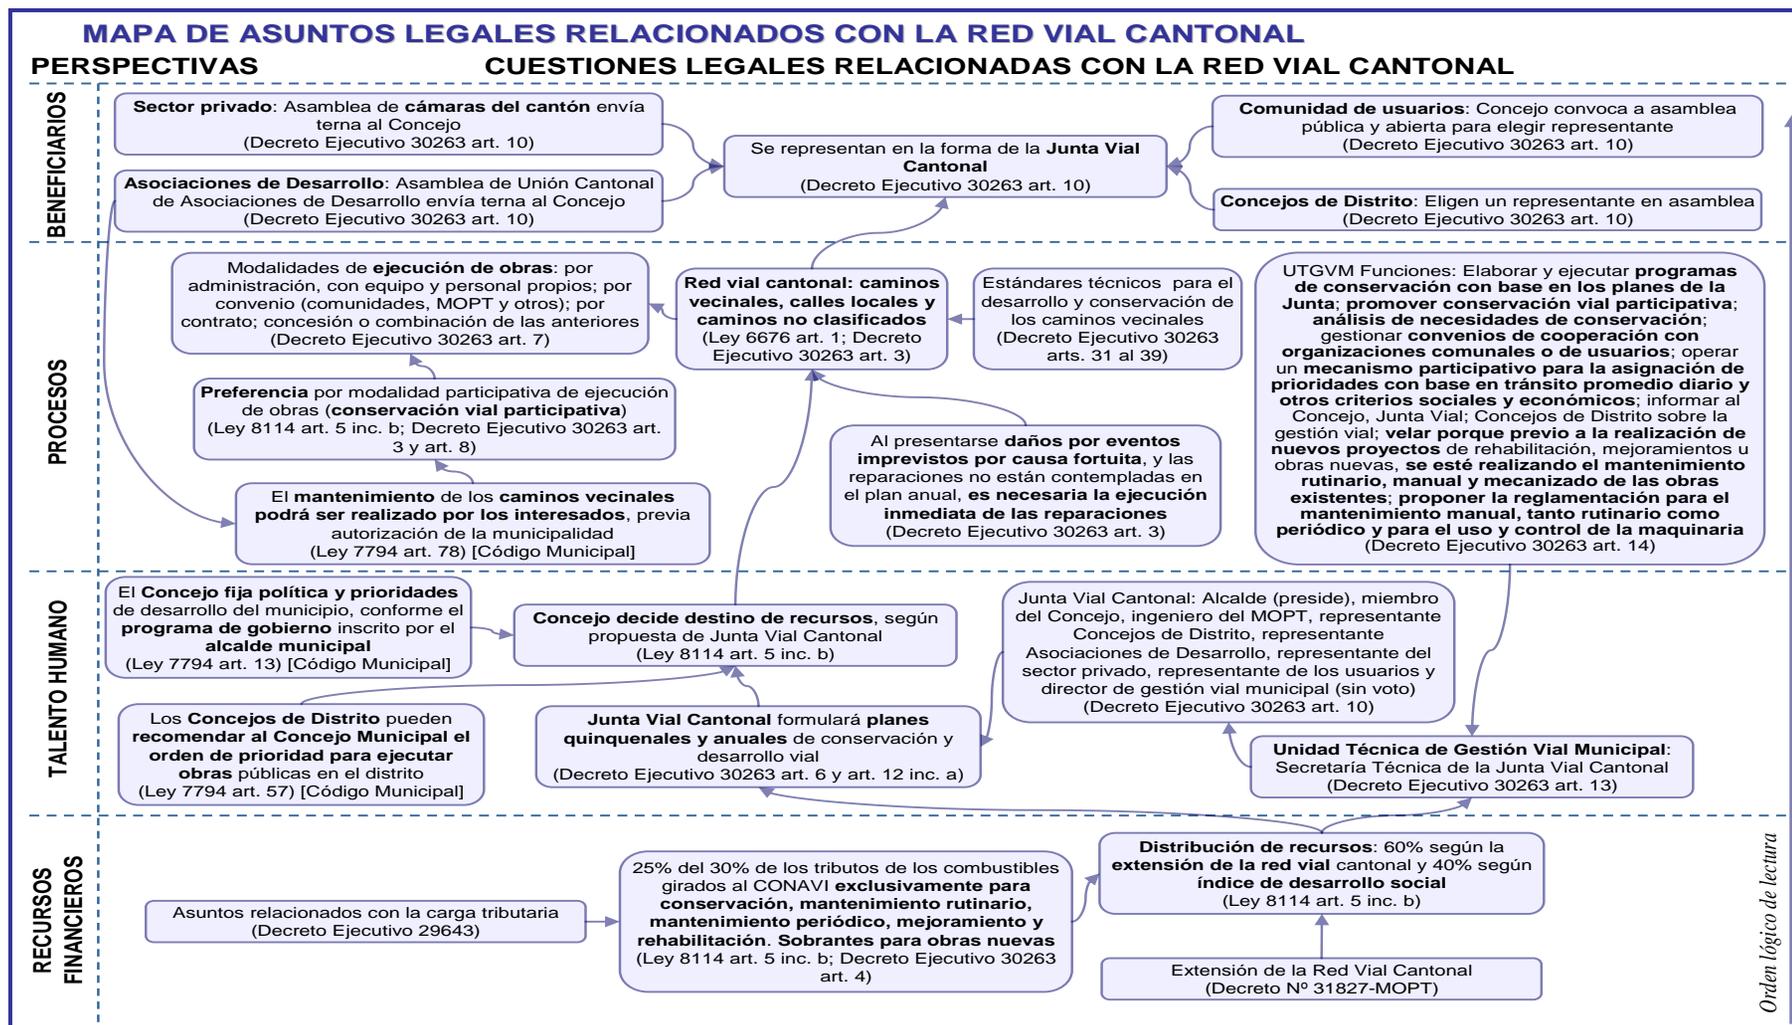

Fuente: Propuestas en políticas en materia Red Vial Cantonal (2007)



2. POLÍTICAS EN MATERIA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Considerando el ordenamiento jurídico que rige la materia de la red vial cantonal y la aprobación en la Municipalidad de San Carlos (Sesión N° 16, Artículo N° 3) de la “Propuesta de Políticas en Materia de Red Vial Cantonal” en el año 2007, se tienen las siguientes políticas generales.

Se presentan las políticas dentro de un marco lógico, en el cual la lectura se realiza de abajo hacia arriba, teniendo como premisa el hecho de que es necesario primero obtener los **recursos financieros**, para que los actores (**talento humano**) los administren y decidan, y se ejecuten **procesos** en materia vial cantonal que provean soluciones para los **beneficiarios**.

Ilustración XV. Políticas Generales en Materia de Red Vial Cantonal

	PERSPECTIVAS	POLÍTICAS
	VISIÓN: CANTÓN CON UN CRECIENTE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	
Beneficiarios	En aras de promover el desarrollo económico y social del cantón, para priorizar la asignación de recursos para la red vial cantonal, se tomarán como elementos decisorios el índice técnico vial de desarrollo social, la generación de empleo, el número de habitantes beneficiados y el tránsito promedio diario de las vías cantonales, salvo en caso de emergencia, donde se actuará de inmediato	Dada la importancia de la participación comunal en la toma de decisiones en materia de caminos, los planes que toquen este tema serán consultados a los concejos de distrito, las asociaciones de desarrollo y las cámaras empresariales con el fin de obtener retroalimentación oportuna
Procesos	Con el fin de utilizar los recursos de la mejor manera, toda intervención se llevará a cabo con un nivel de calidad que garantice el buen desempeño de la obra	Para la intervención de la red vial cantonal, se utilizarán tanto las modalidades de ejecución de obras por parte de la Municipalidad, así como por convenio con las comunidades y el MOPT, contrato o concesión, privando un criterio de técnico en cada asignación
Talento Humano	Los actores involucrados en materia vial cantonal deben conocer y dominar la normativa aplicable a esta temática, razón por la cual es prioritario para la Municipalidad de San Carlos abrir espacios de capacitación al respecto	Dada su cercanía con los usuarios de la red vial cantonal, los Concejos de Distrito jugarán un rol protagónico de articulación y unificación de requerimientos y propuestas con los actores correspondientes en materia vial de su distrito
Recursos Financieros	Con el fin de crear en las comunidades sentido de pertenencia y compromiso con el desarrollo local, se promoverá el que las mismas aporten a las obras viales que se desarrollen, como un mecanismo de conservación vial participativa	Como los recursos disponibles son escasos, la eficiencia en el uso de estos es prioritaria, y los mismos se invertirán según la ley prioritariamente para garantizar el adecuado funcionamiento de las vías existentes, desarrollando obras nuevas solo al haber recursos excedentes

Fuente: Propuesta de políticas en materia de Red Vial Cantonal (2007)

E. PROYECCIONES DE INGRESOS

El Plan Quinquenal de la Gestión Vial Municipal, debe contener el desglose de ingresos por cada fuente financiamiento y de acuerdo con los supuestos financieros establecidos anteriormente, a continuación, se detallan los principales ingresos en colones, a considerar para el próximo quinquenio:

Tabla X. Proyección de ingresos 2018-2022

PROYECCIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 -2022						
CONCEPTO DE INGRESO	SUPUESTO	2018	2019	2020	2021	2022
Ley 8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" y su reforma Ley 9329.	Supuesto F8114-1.	4 418 146 625,00	4 918 493 994,00	5 428 463 285,00	5 938 432 575,00	6 532 275 832,00
BID	Supuesto FBID-1.	878 530 689,33	878 530 689,33	878 530 689,33	913 671 916,90	959 355 512,75
Financiamiento BANCO NACIONAL	Supuesto FBN-01.	5 413 600 000,00				
Municipalidad (recursos propios *)	Supuesto FM-1	1 707 623 377,34	1 878 385 715,07	2 066 224 286,58	2 272 846 715,24	2 500 131 386,76
*Programa III de Obras de Infraestructura e inversiones y Programa II Servicio de Caminos y calles y Programa de Atención de Emergencias.						
	TOTAL	12 417 900 691,7	7 675 410 398,4	8 373 218 260,9	9 124 951 207,1	9 991 762 731,5

Fuente: Elaboración Propia con base a la información brindada por la UTGV y el Director Financiero



En la tabla V.XII, se especifican los montos de la proyección financiera para el quinquenio, los cuales se establecieron de acuerdo con la información brindada por el Director Financiero de la Municipalidad y la UTGV, se especifica la proyección de ingresos para cada uno de los años, especificándose de la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria y su reforma la Ley 9329 de la cual la Unidad Técnica de Gestión Vial va a recibir un $\text{C}\$4\,418\,146\,625,0$ con un incremento anual de un 10% aproximadamente.

El BID va a brindar un aporte de $\text{C}\$878530689,33$ durante los tres primeros años y posteriormente para el 2021 y 2022 va a tener un aumento de un 5% aproximadamente.

Se realizó un préstamo con el Banco Nacional, destinado a realizar varios proyectos de caminos para el 2018, por lo cual este monto por $\text{C}\$5413600000,00$ se detalla únicamente para este año.

Finalmente se detallan los ingresos por parte de los aportes de la municipalidad valorado en un ingreso de $\text{C}\$1707623377,34$ con una proyección de aumento anual del 10%, en la siguiente tabla se observan cada uno de los aspectos considerados para detallar el monto indicado.

Tabla XI Proyección de los ingresos de los Recursos Propios de la Municipalidad

Municipalidad Recursos Propios	
Programa III de Obras de Infraestructura e inversiones en caminos y calles	1 093 811 550,31
Programa II Servicio de Caminos y calles	576 811 827,03
Programa de Atención de Emergencias.	7 000 000,00
Construcción de Aceras, Cordón y caño en el cantón	15 000 000,00
Construcción y mantenimiento de cordón y caño en Ciudad Quesada (Con tarifa)	15 000 000,00
TOTAL	1 707 623 377,34

Fuente: Elaboración Propia con base a la información brindada por la UTGV y el Director Financiero

La proyección vista anteriormente es la que se prevé para el cumplimiento de las metas para este quinquenio.

Cabe destacar la distribución de los recursos a utilizar en cada uno de los caminos se va a establecer en los programas anuales.

F. OBJETIVOS DEL PERIODO POR TIPO DE INTERVENCIÓN

Los objetivos generales de este plan son:

1. Realizar el asfaltado programado para el 2018 con lo cual se busca mejorar en gran medida las condiciones de la Red Vial de San Carlos y continuar con los proyectos de asfaltado para los siguientes años del quinquenio.
2. Implementar las actividades propuestas para los seis caminos presupuestados para ejecución por el BID.
3. Realizar mantenimiento periódico de los caminos vecinales o clasificados ya sean estos en lastre o asfalto, además de los cuadrantes y calles urbanas de la Red Vial Cantonal de San Carlos.
4. Realizar el mantenimiento rutinario de los caminos vecinales o clasificados ya sean estos en lastre o asfalto, además de los cuadrantes y calles urbanas de la Red Vial Cantonal de San Carlos.
5. Mejorar los estándares horizontales y/o vertical de los caminos, el tipo de superficie y las estructuras de estos (puentes y alcantarillas) a fin de que se incremente la capacidad de la vía, la velocidad de circulación y la seguridad de los vehículos.
6. Reparar selectivamente el pavimento, los sistemas de drenaje, los puentes y muros de contención con previa demolición parcial de la estructura existente de los distintos caminos como medida para la mejora de la solidez estructural y la calidad de ruedo original.

G. METAS PARA EL PERÍODO POR TIPO DE INTERVENCIÓN

Cada uno de los proyectos plasmados en el Plan Quinquenal de Gestión Vial Municipal, debe tener una descripción meta de lo que pretende alcanzar al concluir el periodo (2018-2022). Con base a lo anterior se constituyen las siguientes metas para el período:

- Realizar para el 2018 el asfaltado de 60 km en diferentes caminos del cantón, con los recursos del financiamiento del Banco Nacional y en promedio 25 km de asfaltado para los siguientes años del quinquenio.
- Realizar para el año 2018 los caminos con el presupuesto establecido por el BID código 2-10-069, 2-10-075 y 2-10-520 ubicados en la Fortuna de San Carlos. Así mismo para el año 2019 y 2020 se van a realizar las actividades programadas para los caminos 2-10-175 (Pital), 2-10-148 (Venecia) y 2-10-041(Aguas Zarcas).
- Mantenimiento periódico de la Red Vial Cantonal en promedio de 30 km anuales, realizando actividades de bacheo en asfalto realizando actividades habituales de lastrado, recarpeteo, relastrado, mantenimiento de puentes, demarcación horizontal y vertical de caminos, entre otras.
- Mantenimiento rutinario de 350 km en promedio anuales de los diferentes caminos del cantón, por medio de actividades como: bacheo en lastre, bacheo en asfalto, bacheo con base, etc.
- Mejoramiento de 20 km anuales de la RVC, por medio de actividades como: adoquinado, lastrado, asfalto, rectificación de curvas H y V, movimiento de tierra, cementado, alcantarillado, construcción de puentes, entre otras.
- Rehabilitar 40 km de la RVC, por medio de actividades como alcantarillado, lastrado, aceras, cordón y caño, cunetas, cajas de registro, evacuación pluvial, entre otras.

H. INDICADORES PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN QUINQUENAL

Con la finalidad de tener una herramienta que permita evaluar y medir el progreso de las actividades del Plan Quinquenal del periodo 2018-2022 con respecto a las metas planteadas, se crearon los indicadores de evaluación de forma anual y quinquenal.

Se asignaron tres colores (verde, amarillo y rojo), los cuales corresponden a tres calificaciones distintas que hacen referencia al porcentaje avanzado de las metas instituidas para el Plan Quinquenal.

El porcentaje de progreso de cada actividad depende del resultado obtenido de la siguiente formula:

$$\text{Indicador} = \frac{\text{Kilometros Intervenido}}{\text{Kilometros Programados}} * 100$$

La siguiente tabla muestra los parámetros utilizados para determinar los valores de los indicadores para el control y evaluación del Plan Quinquenal, se detallan a continuación:

Tabla XII. Simbología de los Indicadores

Color	Calificación Porcentual
Verde	Indicador \geq 90%
Amarillo	70% \leq Indicador < 90%
Rojo	Indicador < 70%

Fuente: Elaboración propia



En los siguientes cuadros se presentan las metas establecidas, en los cuales se detallan los objetivos generales y las metas para el próximo quinquenio por tipo de intervención (2018-2022), así también muestra los nombres de los indicadores y la fórmula que ayuda a conocer el porcentaje de progreso en relación con la meta establecida. De igual manera paralelo a este documento se realizó un Excel, mediante el cual se realiza la evaluación de manera automática con respecto a los resultados que se vayan obteniendo, los cuales se brindan de manera anual y un resumen a nivel quinquenal.

Tabla XIII Indicador para el control y evaluación del Mantenimiento Periódico de la RVC	
OBJETIVO	Realizar el asfaltado programado para el 2018, mejorando en gran medida las condiciones de la Red Vial de San Carlos y continuar con los proyectos de asfaltado para los siguientes años del quinquenio.
METAS	Realizar para el 2018 el asfaltado de 60 km en diferentes caminos del cantón, con los recursos del financiamiento del Banco Nacional y en promedio 25 km de asfaltado para los siguientes años del quinquenio.
INDICADORES	<p>Porcentaje de Mantenimiento Periódico: Este tipo de indicador refleja el progreso de la actividad con respecto a la meta establecida.</p> <p>Fórmula: $\text{Indicador} * 100 = \frac{\text{Km intervenidos}}{\text{Km programados}}$</p> <p>Alto: $x \geq 90\%$ Medio $70 \leq \text{Indicador} < 90\%$ Bajo: $\text{Indicador} < 70\%$</p>
NIVEL DE AVANCE	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div> </div>

Fuente: Elaboración Propia

Tabla XIV Indicador para el control y evaluación de la ejecución de las metas con recursos del BID de la RVC	
OBJETIVO	Implementar las actividades propuestas para los caminos presupuestados para ejecución por el BID.
METAS	Realizar para el año 2018 los caminos con el presupuesto establecido por el BID código 2-10-069, 2-10-075 y 2-10-520 ubicados en la Fortuna de San Carlos. Así mismo para el año 2019 y 2020 se van a realizar las actividades programadas para los caminos 2-10-175 (Pital), 2-10-148 (Venecia) y 2-10-041(Aguas Zarcas).
INDICADORES	<p>Porcentaje de Ejecución de metas base a los recursos del BID: Este tipo de indicador refleja el progreso de la actividad con respecto a la meta establecida.</p> <p>Fórmula: $\text{Indicador} * 100 = \frac{\text{Km intervenidos}}{\text{Km programados}}$</p> <p>Alto: $x \geq 90\%$ Medio $70 \leq \text{Indicador} < 90\%$ Bajo: $\text{Indicador} < 70\%$</p>
NIVEL DE AVANCE	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div> </div>

Fuente: Elaboración Propia

Tabla XV Indicador para el control y evaluación del Mantenimiento Periódico de la RVC	
OBJETIVO	Realizar mantenimiento periódico de los caminos vecinales o clasificados ya sean estos en lastre o asfalto, además de los cuadrantes y calles urbanas de la Red Vial Cantonal de San Carlos.
METAS	Mantenimiento periódico de la Red Vial Cantonal en promedio de 30 km anuales, realizando actividades de bacheo en asfalto, actividades habituales de lastrado, recarpeteo, relastrado, mantenimiento de puentes, demarcación horizontal y vertical de caminos, entre otras.
INDICADORES	<p>Porcentaje de Mantenimiento Periódico: Este tipo de indicador refleja el progreso de la actividad con respecto a la meta establecida.</p> <p>Fórmula: $\text{Indicador} * 100 = \frac{\text{Km intervenidos}}{\text{Km programados}}$</p>
NIVEL DE AVANCE	<p>Alto: $x \geq 90\%$ Medio $70 \leq \text{Indicador} < 90\%$ Bajo: $\text{Indicador} < 70\%$</p> <p>    </p>

Fuente: Elaboración Propia

Tabla XVI Indicador para el control y evaluación del Mantenimiento Rutinario de la RVC	
OBJETIVO	Realizar el mantenimiento rutinario de los caminos vecinales o clasificados ya sean estos en lastre o asfalto, además de los cuadrantes y calles urbanas de la Red Vial Cantonal de San Carlos.
METAS	Mantenimiento rutinario de 350 km en promedio anuales de los diferentes caminos del cantón, por medio de actividades como: bacheo en lastre, bacheo en asfalto, bacheo con base, etc.
INDICADORES	<p>Porcentaje de Mantenimiento Rutinario: Este tipo de indicador refleja el progreso de la actividad con respecto a la meta establecida.</p> <p>Fórmula: $\text{Indicador} * 100 = \frac{\text{Km intervenidos}}{\text{Km programados}}$</p> <p>Alto: $x \geq 90\%$ Medio $70 \leq \text{Indicador} < 90\%$ Bajo: $\text{Indicador} < 70\%$</p>
NIVEL DE AVANCE	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div> </div>

Fuente: Elaboración Propia

Tabla XVII Indicador para el control y evaluación del Mejoramiento de la RVC	
OBJETIVO	Mejorar los estándares horizontales y/o vertical de los caminos, el tipo de superficie y las estructuras de estos (puentes y alcantarillas) a fin de que se incremente la capacidad de la vía, la velocidad de circulación y la seguridad de los vehículos.
METAS	Mejoramiento de 20 km de la RVC, por medio de actividades como: adoquinado, lastrado, asfalto, rectificación de curvas H y V, movimiento de tierra, cementado, alcantarillado, construcción de puentes, entre otras.
INDICADORES	<p>Porcentaje de Mantenimiento Rutinario: Este tipo de indicador refleja el progreso del a actividad con respecto a la meta establecida.</p> <p>Fórmula: $\text{Indicador} * 100 = \frac{\text{Km intervenidos}}{\text{Km programados}}$</p> <p>Alto: $x \geq 90\%$ Medio $70 \leq \text{Indicador} < 90\%$ Bajo: $\text{Indicador} < 70\%$</p>
NIVEL DE AVANCE	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div> </div>

Fuente: Elaboración Propia

Tabla XVIII Indicador para el control y evaluación de la Rehabilitación de la RVC	
OBJETIVO	Reparar selectivamente el pavimento, los sistemas de drenaje, los puentes y muros de contención con previa demolición parcial de la estructura existente de los distintos caminos como medida para la mejora de la solidez estructural y la calidad de ruedo original.
METAS	Rehabilitar 40 km de la RVC, por medio de actividades como alcantarillado, lastrado, aceras, cordón y caño, cunetas, cajas de registro, evacuación pluvial, entre otras.
INDICADORES	<p>Porcentaje de Mantenimiento en Rehabilitación: Este tipo de indicador refleja el progreso de la actividad con respecto a la meta establecida.</p> <p>Fórmula: $\text{Indicador} * 100 = \frac{\text{Km intervenidos}}{\text{Km programados}}$</p>
NIVEL DE AVANCE	<p>Alto: $x \geq 90\%$ Medio $70 \leq \text{Indicador} < 90\%$ Bajo: $\text{Indicador} < 70\%$</p> <p style="text-align: center;">    </p>

Fuente: Elaboración Propia

I. MATRIZ RESUMEN

Para efectos de estandarización de la información se realiza una “Matriz Resumen” del Plan Quinquenal 2018-2022, la misma es la que deben presentar las municipalidades a la Contraloría General de la Republica.

En la “Matriz Resumen” se detalla la siguiente información:

1. **Código de camino:** se refiere al número que identifica y ubica al camino. Corresponde a un identificador numérico compuesto de seis cifras que indican:

Primer dígito: Numero de provincia.

Segundos dos dígitos: Numero de cantón perteneciente a cada provincia.

Siguientes tres dígitos: Numero consecutivo del camino perteneciente a cada cantón.
2. **Descripción del camino:** los caminos pertenecientes a la Red Vial Cantonal se codifican indicando de forma detallada el inicio y el final de la vía.
3. **Extensión en kilómetros:** Se refiere a la extensión total en kilómetros que tiene el camino. La longitud se mide en el campo desde el punto de inicio de la vía hasta su finalización.
4. **Priorización (IVTS):** es el resultado del cálculo del Índice de Viabilidad Técnico Social, el cual se basa en seis componentes principalmente que son:

- ✓ **Infraestructura local:** Mide la cantidad de infraestructura local y servicios existentes a lo largo del camino o a las que el camino permite el acceso.
 - ✓ **Cantidad de viviendas por kilómetro:** se cuentan la cantidad de viviendas visibles por kilómetro del camino.
 - ✓ **Proyectos de desarrollo nacional:** se refiere a proyectos de emergencia o desarrollo regional como, por ejemplo: proyectos de seguridad nacional, hidroeléctricos, turismo, etc.
 - ✓ **Criterios de desarrollo social:** se refiere a proyectos de interés social como asentamientos agrícolas, indígenas y habitacionales.
 - ✓ **Criterios económicos:** se toman en cuenta variables tales como el uso del camino, producción visible, tránsito promedio diario (TPD), entre otros.
 - ✓ **Accesibilidad grado de desarrollo actual del camino y fuentes de materiales:** si el camino presenta aceptación y facilidad para su posterior desarrollo.
5. **Clasificación:** para el camino seleccionado se debe señalar el tipo de intervención que se ejecutara en conformidad con las siguientes opciones:
- ✓ Mantenimiento periódico
 - ✓ Mantenimiento rutinario
 - ✓ Mejoramiento
 - ✓ Rehabilitación
 - ✓ Reconstrucción

✓ Obra nueva

6. **Actividad programada:** la misma corresponde a la actividad que se pretende realizar en la vía señalada, la cual se especifica para cada uno de los caminos, en la matriz se detalla la lista de caminos por año y la acción proyectada a realizar.
7. **Tipo de Superficie:** Se detalla el tipo de superficie de acuerdo con el estado actual de camino, está representado mediante numeración del 1 al 5, correspondiendo 1 a Asfalto, 2 Concreto, 3 Tratamiento, 4 Lastre, 5 Tierra y 6 Adoquín.
8. **Clasificación:** se detalla la clasificación de cada uno de los caminos con la siguiente simbología Urbana (U), Vía Clasificada (VC), No Clasificada en Uso (NCU) y No Clasificada en Desuso (NC).
9. **Condición de Drenaje y Superficie:** en este aspecto se detalla la condición de la superficie de acuerdo con el número que se asigne se considera de la siguiente manera: Excelente (5), Bueno (4), Regular (3), Malo (2) y Muy Malo con el número (1).

Cabe destacar que los caminos públicos, no se detallan dentro de la Matriz Quinquenal, sin embargo, la municipalidad cuenta con presupuesto para su ejecución según demanda requerida.

3. ANÁLISIS DE LA MATRIZ RESUMEN DEL PLAN QUINQUENAL

La “Matriz Resumen” se encuentra en un Excel en el cual se puede apreciar la programación en detalle, es un documento bastante amplio que incluye mucha información, por lo tanto, a continuación, se realiza en manera de resumen un análisis de la misma:

3.1. EXTENSIÓN EN KILÓMETROS DE LOS CAMINOS INTERVENIDOS EN CADA DISTRITO.

Para la programación que se elaboró se tomaron en consideración varias variables como la condición de drenaje, la condición del camino, el IVTS, la clasificación y de esta manera hacer una proyección de lo que cada camino va a requerir durante el quinquenio.

De acuerdo con estas variables se realizó la programación de las actividades en cada distrito.

3.2. CANTIDAD DE PROYECTOS PROGRAMADOS POR DISTRITO

Cabe mencionar que los proyectos se asignan de acuerdo con la necesidad de cada distrito y a la importancia que las vías requieren para la población, la cantidad de proyectos que se esperan desarrollar son de acuerdo con las necesidades de cada camino y se va a llevar a cabo por distrito (de forma anual).

3.3. CANTIDAD DE PROYECTOS POR TIPO DE INTERVENCIÓN

La siguiente tabla muestra la cantidad de kilómetros que se esperan realizar por tipo de intervención:

Tabla XIX. Cantidad de Kilómetros por clasificación

Clasificación	Proyectos
	Kilómetros por año
Mejoramiento	20
Rehabilitación	40
Mantenimiento periódico	30
Mantenimiento rutinario	350
Total general	440 Km anuales

Fuente: Elaboración propia con base a la Matriz Resumen

De acuerdo con la información expresada la Tabla V.XXIII, la cual se elaboró con base a estadísticas de ejecución de los últimos años, se puede afirmar que para el periodo 2018 – 2022 se van a ejecutar aproximadamente 440 Kilómetros anuales en mejoramiento de vías, proyectos en rehabilitación, mantenimiento rutinario y periódico respectivamente lo cual representa un importante aporte en beneficio de la Red Vial Cantonal.

3.4. EXTENSIÓN EN KILÓMETROS DE ACUERDO CON EL ÍNDICE DE VIABILIDAD TÉCNICO SOCIAL

La tabla V.XXVI expresa la extensión en kilómetros que se espera intervenir de acuerdo con el IVTS:

Tabla XX. Extensión en Km de acuerdo con el IVTS

IVTS	Extensión	
	Absoluto Km	Relativo
0 a 19	948,40	39%
20 a 39	926,36	38%
39 a 59	348,34	14%
59 a 79	125,21	5%
79 a 100	73,41	3%
Total general	2421,72	100,00%

Fuente: Elaboración propia con base a la Matriz Resumen



Con base a la información de la tabla anterior, los proyectos con IVTS con nota 100 son los que van a ser intervenidos de primero en el plan quinquenal 2018-2022. Aproximadamente se planean realizar un promedio de 20 km por año de los caminos que se encuentran con la mayor clasificación en IVTS, aplicando actividades de mejoramiento y rehabilitación y actividad de estructura de pavimento.

De acuerdo con la planificación realizada, para los años 2018 y 2019 se van a ejecutar los caminos nota 100 a 79, seguidos en el año 2020 por los caminos registrados de 69 a 46, para el año 2021 los que registran índice de 36 a 12. Por otro lado, hay proyectos con un IVTS muy bajo de 0 a 10 por lo tanto son intervenidos de últimos, en el Plan Quinquenal. La finalidad consiste en ir mejorando la mayor cantidad de caminos posible por año tomando en consideración el Índice de Vialidad Técnico Social y la clasificación de cada camino.



4. MATRIZ RESUMEN DEL PLAN QUINQUENAL DE LA RED VIAL CANTONAL

Se adjunta a continuación la Matriz Resumen del Plan Quinquenal de manera completa, la misma incluye todos los proyectos programados para el periodo 2018-2022. Se presenta en este documento el por proyecto para cada uno de los años por un asunto de formato. También se dispone de una hoja eléctrica de Excel con la matriz completa.

En los anexos 2 y 3 de este documento se detallan las tablas tomadas en consideración para la simbología utilizada en la matriz.

[Anexo 2.](#)

[Anexo 3.](#)



4.1 DETALLE DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2018-2022

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0001	Entr.R140,Ciudad Quesada (0,1km Cam#03)	Ent. Cam#002, Barrio San Pablo (0,45km R-141)	1	1,7	3	5	VC	Quesada	51	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto										
2-10-0002	Entr.R140, San Juan (0,4km Cam#238)	Entr.R141, San Roque (1,1km Cam#932)	1	4,3	4	5	VC	Quesada	56	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto										
2-10-0003	Entr.R140, Cafetalera - Colón (0,1km Cam#01)	Entr.R140, San Martín (0,2km Cam#236)	1	3,474	4	4	VC	Quesada	59	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto										



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0006	Ent. R.141, Cruce La Hacienda (0,20km Cam#941)	Ent. Cam.# 007, Cruce a Porvenir (1,1km R-141)	1	1,9	2	5	NCU	Quesada	36	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0030	Ent.R140, Los Negritos, A.Z (0,1km Cam#140)	Ent. Camino # 148 (Fte Cam#44, Cruce los Alpes)	1	0,48	2	5	NCU	Venecia	47	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0041	Ent.R140, Los Negritos, A.Z (0,2km Río Negritos)	Ent. R-250, Cruce Los Chiles, A.Z. (0,7km R-751)	1	3,7	2	5	VC	A.Zarcas	76	2018	Mantenimiento Rutinario	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento, Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0042	Ent.R140, Aguas Zarcas, Colegio	Fin de Camino, Finca Raúl Arce	1	0,3	4	5	NCU	A.Zarcas	47	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0047	Ent.R140, Buenos Aires (0,1km Cam#46)	Ent. Cam. #41, Pitalito (0,6km Cam#724)	1	2,6	2	5	VC	Venecia	59	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario	SPEP	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0047	Ent.R140, Buenos Aires (0,1km Cam#46)	Ent. Cam. #41, Pitalito (0,6km Cam#724)	1	0,2	2	5	VC	Venecia	59	2018	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDEP	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0047	Ent.R140, Buenos Aires (0,1km Cam#46)	Ent. Cam. #41, Pitalito (0,6km Cam#724)	1	0,2	2	5	VC	Venecia	59	2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0052	Ent.R140, Venecia, Coraz. de Jes(0,3km Cam#53)	Ent. R-250, Pital (0,3km R-744)	1	1,1	2	5	VC	Venecia	73	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto										
2-10-0054	Ent.R140, Cruce. Marsella (Fte a Cam#144)	Fin de Camino, Proyect. Hidroeléctrico Toro II	1	9,7	4	5	VC	Venecia	54	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto										
2-10-0056	Ent. R-250, Cruce 4 Esquinas (0,5km Cam#659)	Fin de Camino, Coopeisabel, Río Tres Amigos	1	2,5	4	4	VC	Pital	73	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto										
2-10-0057	Ent. R-250, 4 Esquinas (0,7km Cam#59)	Ent. Cam. #56, Coopelsabel (0,6km Cam#673)	1	5	4	5	VC	Pital	63	2018	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto										



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0061	Ent. R-250, Pital (0,1km R-745)	Ent. Cam.# 60, Puerto Escondido, Cementerio	1	2	3	5	VC	Pital	73	2018	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0066	Ent. R-4, Entrada a Sn Jorge (0,6 km de Cam#542)	Ent.R141, Tanque, Plaza (Fte a Cam#517)	1	1,88	2	5	VC	Fortuna	80	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0075	Ent.R141, Los Angeles, Frente a Cam.#69	El Bosque,Lím.Cant.S .Carlos/San Ramón	1	1	4	4	VC	Fortuna	63	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0076	Ent. R-702, Cruce La Tigra (0,5km R-738)	Lím.Cant.Sn Carlos/Sn Ramón, Río Peñas Blancas	1	1,3	3	4	NCU	La Tigra	30	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0077	Ent. R-702, Cruce La Tigra (0,8km Cam#76)	Fin camino, finca Luis Angel Camacho	1	1	3	5	NCU	La Tigra	53	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0081	Ent. Ruta # 4, San Francisco, Fte Cam#623	Fin camino, Río Kopper	1	1,55	4	5	NCU	Palmera	19	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0013	Ent. R.141, C. Cedral (Fte a Cam#206)	Ent. Cam.# 14, San Ramón (0,15km Cam#166)	1	4,45	5	5	NCU	Quesada	41	2018	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial: Cunetas, Cajas de Registro, tragantes, cabezales, Tubos de concreto alcantarillado	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0086	Ent. Ruta # 734, Venado Centro (1 km Cam#87)	Río Cucaracha, Lím.Cant.S.Carlos/ Guatuzo	1	0,082	4	5	NCU	Venado	27	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto y Construcción de puentes vehicular
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0119	Ent. R.140, Iglesia Aguas Zarcas (Fte a R-250)	Fin Camino, Parque Nacional Juan Castro Blanco	1	0,43	4	5	VC	A.Zarcas	65	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0122	Ent. R-739, La Vieja, escuela (0,3km a Cam#215)	Lím.Cantonal S. Carlos/Alfaro Ruiz, La Quina	1	1,82	3	5	VC	Buena Vista	39	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	Evacuación Pluvial: Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
									2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto	
2-10-0125	Ent. R-141, C. Quesada (Esquina N.O Catedral)	Ent. Cam.#09, Abundancia (1,8km Cam#155)	1	0,8	1	5	VC	Quesada	43	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
									2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto	
2-10-0128	Ent. R.141, Santa Clara, Fte a Plaza de deportes	Ent. R.739, San ta Rita (0,4km Cam#861)	1	3,741	2	5	VC	Florencia	23	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
									2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto	



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0132	Ent. R.140, San Juan (0,4km Cam#03)	Ent. Cam. # 014, La Selva, Linda Vista	1	1,79	4	4	VC	Quesada	48	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0141	Ent. R.140, Venecia (0,1km Cam#772)	Fin Camino, Finca Eduardo Vargas	1	0,4	3	5	VC	Venecia	36	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	Evacuación Pluvial: Tubos de	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0143	Ent. R.140, San Matín, Fte Colegio de Venecia	Fin Camino, Las Nubes, Eloy Chacón	1	0,5	1	5	NCU	Venecia	35	2018	Mejoramiento, Mantenimiento Rutinario	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0146	Ent. Cam # 47, Cruce Pitalito (1,2 km Cam#41)	Fin Camino, Finca Carlos Solís	1	0,37	4	5	NCU	Venecia	47	2018				
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0148	Ent. R.140, C. Sn Cayetano (0,9km Cam#49)	Fin Camino, Finca Fernando Obando	1	0,4	3	5	NCU	Venecia	83	2018				
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0151	Ent.Cam # 143, Cruce San Martin (0,4km R140)	Fin Camino, Finca Joaquín Porras	1	0,525	2	5	NCU	Venecia	27	2018				
										2019				
										2020				
										2021				
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0152	Ent. R-738, C. Sn Pedro (0,2km Cam#211)	Ent.Cam#839, La Tigra (0,1km R-702)	1	3,91	4	4	VC	La Tigra	33	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0153	CUADRANTES CIUDAD QUESADA	CUADRANTES CIUDAD QUESADA	1	34,006	4	4	U	Quesada	87	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Mantenimiento Rutinario	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en asfalto
										2020	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Mantenimiento Rutinario	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0156	CUADRANTES AGUAS ZARCAS	CUADRANTES AGUAS ZARCAS	1	1,235	4	5	U	A.Zarcas	67	2018	Rehabilitación, Mantenimiento rutinario, Mejoramiento	BA	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cordón y Caño, Aceras, Cajas de Registro, tragantes, Cabezales	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto, Construcción de puente vehicular
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0159	CUADRANTES FORTUNA	CUADRANTES FORTUNA	1	4,743	4	5	U	Fortuna	66	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0160	CUADRANTES LA TIGRA	CUADRANTES LA TIGRA	1	0,8	4	5	U	La Tigra	64	2018	Mantenimiento Rutinario, Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0162	CUADRANTES VENADO	CUADRANTES VENADO	1	0,918	3	5	U	Venado	53	2018	Mantenimiento Rutinario	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0163	CUADRANTES BOCA ARENAL, CUTRIS	CUADRANTES BOCA ARENAL, CUTRIS	1	3,676	4	4	U	Cutris	69	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0206	Ent. R.141, El Carmen (0,4km Cam#405)	Ent. R.141, Cruce Cedral (Fte a Cam#13)	1	1,4	2	5	VC	Quesada	39	2018	Mantenimiento Rutinario, Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0216	Ent. R.141, Porvenir (0,1km Cam#07)	Ent. Cam. #007, San Vicente (2,2km Cam#06)	1	1	4	5	NCU	Quesada	23	2018	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación y	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación horizontal y Vertical
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0217	Ent. Cam.# 13, Dulce Nombre Sur (Fte Cam#908)	Ent. Cam.# 20, San Luis , escuela (1,3km R-141)	1	0,47	4	4	VC	Quesada	41	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0228	Ent. Cam.# 002, Cruce San Luis (1,1km Cam#827)	Ent. Cam.#132, C.Linda Vista (0,25km Cam#16)	1	0,72	4	4	NCU	Quesada	15	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0231	Ent. Cam.# 002, B° San pablo (0,45km R-141)	Fin Camino, Barrio San Pablo	1	1	3	5	VC	Quesada	43	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0027	Ent.R-748, Cruce Platanar (1,1km R-35)	Ent.R-748, San Juan, (Fte a Cam#28)	4	2,2	5	5	NCU	Florencia	19	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0235	Ent. R.141, Sucre (0,4km Cam#124)	Ent. Cam.# 008, Sucre (Escuela) (0,5km R-141)	1	0,75	4	5	VC	Quesada	43	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0028	Ent.R-748, San Juan, Iglesia (Fte Cam#27)	Ent.Cam#13, Dulce Nombre Norte, Iglesia	4	2,906	5	5	NCU	Quesada	18	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0236	Ent. R.140, C. Q. Colegio María (0,2km Cam #03)	Ent. R.141, La Hacienda (0,5km Cam#941)	1	1	4	5	VC	Quesada	53	2018				
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0325	Ent. Cam. #111, Cruce Almendros	Fin Camino, finca	1	1	1	5	NCU	Cutris	15	2018	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto y Demarcación horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0405	Ent. R.141, Bª Carmen, Fte Ginnacio Siglo XX	Fin Camino, Propiedad Planta Eléct. Matamoros	1	0,25	3	5	VC	Quesada	46	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0463	Ent. Cam. #64, Cruce a la Torre (1,7km Cam#88)	Fin Camino, finca Claudio Esquivel	1	1,035	4	4	NCU	Monterrey	9	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2020				
										2021				
										2022				



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0508	Ent. R.142, Fortuna (0,2km de R-702)	Ent. C.#65, C,Agua Azul (1,6m de R-142)	1	0,9	2	5	VC	Fortuna	24	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0509	Ent. R.142, Fortuna (1,2km de R-702)	Ent. Cam# 508,C. Agua Azul (1,3km Cam.#65)	1	0,4	4	4	NCU	Fortuna	21	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0510	Ent. R.142, Colegio Fortuna (0,7km de R-702)	Ent. Cam# 509, Fortuna (0,5km R-142)	1	0,6	4	4	VC	Fortuna	57	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0519	Ent. Cam.#192, La Unión (0,4 km Cam#570)	Ent. Cam#574, La Unión (0,6km Cam#192)	1	0,7	4	5	NCU	Monterrey	18	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0569	Unión (0,4 km Cam#570)	Unión (0,6km Cam#192)	1	0,7	4	5	NCU	Monterrey	18	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto										
2-10-0623	Ent. R.4, Cruce aSn Francisco, Frente a Cam#81	Ent. R.747, Sn Francisco, Plaza (0,9km R-748)	1	1,3	3	5	VC	Palmera	44	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado y Cunetas	Bacheo en Asfalto y Demarcación horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto										
2-10-0661	Calles Urbanas	Veracruz, Pital	1	1,29	2	5	U	Pital	46	2018	Mantenimiento Rutinario, Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial: Cajas de registro, tragantes, cabezales, Tubos de concreto alcantarillado	Demarcación horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021				
2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto										
										2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación horizontal y Vertical
										2019				



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0705	Ent. Cam#60, Puerto Escondido, Cementerio	Fin Camino, finca Gerardo Víquez	1	0,72	4	5	NCU	Pital	31	2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0720	Calles Urbanas	Las Delicias, Aguas Zarcas	1	0,3	4	5	U	A.Zarcas	46	2018	Mantenimiento Rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación horizontal y Vertical
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2020				
										2021				
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0732	Ent. Cam#47, Urb.Nazaret, (0,5km Cam#146)	Fin Camino, finca Rafael Torres	1	0,25	4	5	NCU	Venecia	32	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2020				
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0771	Calles Urbanas	Platanar, Florencia	1	0,2	3	5	U	Florencia	37	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021				
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0038	Ent. Cam. #122, Buena Vista (1,0km Cam#39)	Fin de Camino, Finca Orlando Lizano	4	5,826	5	5	NCU	Buena Vista	30	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0856	Ent. R-738, San Pedro (0,8km Cam#152)	Fin Camino Finca Cristina Díaz Araya	1	0,154	4	4	NCU	La Tigra	29	2018				
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0039	Ent. Cam. #122, Buena Vista (1,0km Cam#38)	Lím.Cantonal S. Carlos/Alfaro Ruiz, Qb. Sin nomb.	4	1,7	5	5	NCU	Buena Vista	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2022				



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0860	Calles Urbanas	Santa Clara, Florencia	1	1,5	3	5	U	Florencia	54	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación horizontal y
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0908	Ent. Cam#13, Dulce Nombre Sur (Fte Cam#217)	Fin Camino Finca Julio Morales	1	1	3	5	VC	Quesada	29	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0912	Ent. Cam#217, Dulce Nombre Sur (0,3km Cam#13)	Fin Camino Finca Augusto González	1	0,15	4	5	NCU	Quesada	9	2018	Mejoramiento	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
2-10-0932	Ent. R-141, San Roque (0,1km Cam#02)	Ent. Cam#09, La Abundancia (0,7km Cam#928)	1	0,2	2	5	VC	Quesada	52	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0944	Ent. R-141, Puente Casa (0,1km Cam#19)	Ent. R-141, Puente Casa (Fte Cam#943)	1	0,6	2	5	VC	Quesada	40	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0947	Calles Urbanas	Barrio Los Angeles, Ciudad Quesada	1	0,677	4	4	U	Quesada	46	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0961	Ent. R-142, La Palma, (1,4km. Cam#499)	Ent. Cam # 64, La Torre, Frente Cam # 88	1	2,307	4	5	NCU	Fortuna	19	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
2-10-0043	Ent. Cam. #106, La Ceiba	Fin Camino, Río Poco Sol, Coquitales, La Aldea	4	5,5	5	5	VC	Pocosol		2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2021	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1013	CALLES URBANAS CUADRANTES.	CUADRANTES Delicias	1	0,3	4	5	U	Venado	100	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2020				
										2021				
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0007	Ent. R.141, Porvenir (0,1km Cam#216)	Fin de Camino, Parque Nacional J.Castro Blanco	2	2,02	1	5	VC	Quesada	40	2018	Mantenimiento Rutinario, Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial:Cunetas, Cajas de registro, tragantes, cabezales, Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento, Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0008	Ent.R141, Sucre (0,25km Cam#235)	F.C. Sn José de la Montaña, Río La Vieja	2	0,301	2	5	VC	Quesada	53	2018	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
									2018	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical	



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0009	Ent.R-739, Pénjamo (0,1km Cam#918)	Ent.Cam.# 122, Buena Vista (0,9km Cam#38)	2	1,576	2	5	VC	Quesada	45	2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0013	Ent. R.141, C. Cedral (Fte a Cam#206)	Ent. Cam.# 14, San Ramón (0,15km Cam#166)	2	0,35		5	NCU	Quesada		2018	Mantenimiento rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	

2-10-0021	Ent.R35, Caimitos (0,8km Cam#22)	Ent.Cam#20, San Luis (0,2km Cam#217)	2	0,784	2	5	NCU	Florencia	32	2018	Mantenimiento Rutinario	SVDEM	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0025	Ent.R141, C. Cuestillas (0,3km Cam#868)	Ent.Cam#36, Peje Viejo, Frente a Iglesia	2	0,715	3	5	VC	Florencia	55	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0028	Ent.R-748, San Juan, Iglesia (Fte Cam#27)	Ent.Cam#13, Dulce Nombre Norte, Iglesia	2	0,094	1	5	NCU	Quesada	18	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0031	Ent.R141, La Vega (3,0km de cam#167)	Fin de Camino, Caño Moja Huevos	2	0,5	2	5	VC	Florencia	28	2018	Mantenimiento rutinario	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0042	Ent.R140, Aguas Zarcas, Colegio	Fin de Camino, Finca Raúl Arce	2	1,56	2	5	NCU	A.Zarcas	47	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0049	Ent.R140, San Cayetano (0,9km Cam#148)	Ent. Cam. #52, Las Huacas (1,1km Cam#715)	2	0,135	2	5	NCU	Venecia	22	2018	Mantenimiento rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0051	Ent. Cam#141, Venecia (Fte Parque, 0,2km R140)	Ent. Cam. #44, Pueblo Viejo (Fte Cam#114)	2	0,5	2	5	VC	Venecia	63	2018	Mantenimiento rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0052	Ent.R140, Venecia, Coraz. de Jes(0,3km Cam#53)	Ent. R-250, Pital (0,3km R-744)	2	0,496		5	VC	Venecia		2018	Mantenimiento rutinario	SVDEM	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0053	Ent.R140, Colegio Venecia (0,1km Cam#143)	Ent. Cam#144, C. Marsella (0,35km Cam#54)	2	0,3	1	5	NCU	Venecia	18	2018	Mantenimiento rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0077	Ent. R-702, Cruce La Tigra (0,8km Cam#76)	Fin camino, finca Luis Angel Camacho	2	0,55	4	4	NCU	La Tigra	53	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0078	Ent. R-702, La Tigra (0,2km Cam#841)	Ent.Cam. #77,C, Sn José, La Tigra (0,05 Cam#830)	2	0,423		5	NCU	La Tigra		2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0079	Ent. Cam. #80, C.La Tigra (0,4 km R-702)	Fin camino, finca Bosque Eterno de los Niños	2	0,379	2	5	NCU	La Tigra	16	2018	Mantenimiento rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0080	Ent. R-702, La Tigra (0,3km Cam#839)	Fin camino, finca Bosque Eterno de los Niños	2	1,617	2	5	VC	La Tigra	29	2018	Mantenimiento rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0085	Ent. R- 748, La Palmera (0,7km Cam#84)	Ent. R- 748, Cruce La Palmera (0,7km Cam#747)	2	1,21	2	5	NCU	Palmera	25	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0100	Ent. Ruta # 35, Santa Rosa Pocosol.	Ent. R227, Asent. El Edén	2	0,315	2	5	VC	Pocosol	54	2018	Mantenimiento rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0114	Ent. Cam.#44, Pueblo Viejo (Fte Cam#51)	Fin Camino, Finca Alberto Vargas	2	0,3	2	5	VC	Venecia	45	2018	Mantenimiento rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL															
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE	
2-10-0119	Ent. R.140, Iglesia Aguas Zarcas (Fte a R-250)	Fin Camino, Parque Nacional Juan Castro Blanco	2	0,32	3	3	VC	A.Zarcas		2018					
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical	
										65	2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
											2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
											2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0120	Ent. Cam.# 42, Montecristo (1,4km a R-140)	Ent. Cam.#119, Garabito (0,5km Cam#136)	2	0,11	2	5	NCU	A.Zarcas	25	2018					
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical	
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		
2-10-0122	Ent. R-739, La Vieja, escuela (0,3km a Cam#215)	Lím.Cantonal S. Carlos/Alfaro Ruiz, La Quina	2	0,2	2	5	VC	Buena Vista	39	2018					
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical	
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		
2-10-0131	Ent. R-35, Quebrada Azul (0,25km Cam#36)	Ent. Cam.# 13, Dulce Nombre Norte (Iglesia)	2	1,95	3	4	NCU	Quesada	25	2018	Mantenimiento rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical	
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0135	Ent. R.140, C. Aguas Zarcas (Fte a Cam#134)	Fin Camino, Finca Los Rojas	2	0,18	3	5	NCU	Palmera	25	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0136	Ent. R.140, C. Aguas Zarcas (0,4km Cam#138)	Ent. Cam. #119, Garabito (0,35km Cam#810)	2	0,4	2	5	NCU	A.Zarcas	32	2018	Mantenimiento rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0138	Ent. R.140, C. Aguas Zarcas (Fte Cam#137)	Fin Camino, Finca Benedicto Rojas Cubero	2	0,235	2	5	NCU	A.Zarcas	20	2018	Mantenimiento rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0140	Ent. R.140, Los Negritos (0,1km Cam#30)	Fin Camino, Finca Andres Garita	2	0,08	4	5	NCU	Venecia	16	2018	Mantenimiento rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0153	CUADRANTES CIUDAD QUESADA	CUADRANTES CIUDAD QUESADA	2	10,371	4	5	U	Quesada		2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcacion Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcacion Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0064	Ent. R. 004, Santo Domingo (Monterrey)	Lím.Prov.Alaj/Guanac., Sangregado Ent.Cam#182	4	20,8	5	5	VC	Monterrey	33	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, Tragantes y cabezales	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0154	CUADRANTES FLORENCIA	CUADRANTES FLORENCIA	2	0,09			U	Florencia		2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0156	CUADRANTES AGUAS ZARCAS	CUADRANTES AGUAS ZARCAS	2	2	5	U	A.Zarcas		2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
									2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
									2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	

2-10-0157	CUADRANTES VENECIA	CUADRANTES VENECIA	2	1,426	3	5	U	Venecia		2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
									2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		

2-10-0159	CUADRANTES FORTUNA	CUADRANTES FORTUNA	2	1,267	5	U	Fortuna		2018				
									2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
									2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
									2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
									2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	

0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL

2018

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0159	CUADRANTES FORTUNA	CUADRANTES FORTUNA	2	1,267	5	U	Fortuna		2018					
									2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical	
									2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical	
									2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

											2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0161	CUADRANTES PALMERA	CUADRANTES PALMERA	2	1,81	3	5	U	Palmera	51	2018	Mantenimiento Rutinario, Mejoramiento, Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial: Cajas de Registro, tragantes, cabezales, Tubos de concreto alcantarillado	Superficies Duraderas / Losas, Cunetas, Demarcación Horizontal y Vertical, Cunetas	
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		
2-10-0070	Ent.R142, Cruce a Tanque (1,1km de R-141)	Ent. Cam. #75, Frente a Cementerio Los Angeles	1	0,288	5	5	VC	Fortuna	34	2018					
										2019	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto	
										2020	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto	
										2021	Mantenimiento Rutinario	SDRC	No aplica	Recarpeteo	
										2022	Mantenimiento Rutinario	SDRC	No aplica	Recarpeteo	
2-10-0164	SANTO DOMINGO, MONTERREY	SANTO DOMINGO, MONTERREY	2	0,235	4	4	U	Monterrey		2018					
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical	
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0165	CUADRANTES SANTA ROSA	CUADRANTES SANTA ROSA	2	0,501	5	U	Pocosol		2018					
									2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical	
									2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical	
									2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		
									2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		
2-10-0168	Ent. R.141, Cruce La Vega (3,0km de Cam#167)	Fin Camino, Río Peñas Blancas	2	1,105	2	5	VC	Florencia	36	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0178	Ent. R- 748, Cocaleca, Plaza (0,3km Cam#757)	Ent.Cam.#85, C. La Palmera (0,2km Cam#748)	2	0,15	3	3	NCU	Palmera	31	2018	Mantenimiento rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0207	Ent. R.141, Jabillos (0,1km R-738)	Ent. Cam.# 152, La Esperanza (0,3km Cam#855)	2	0,23	2	5	NCU	La Tigra	22	2018	Mantenimiento rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0216	Ent. R.141, Porvenir (0,1km Cam#07)	Ent. Cam. #007, San Vicente (2,2km Cam#06)	2	0,578	1	5	NCU	Quesada	23	2018	Mantenimiento rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0217	Ent. Cam.# 13, Dulce Nombre Sur (Fte Cam#908)	Ent. Cam.# 20, San Luis , escuela (1,3km R-141)	2	0,293		5	VC	Quesada	41	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0217	Ent. Cam.# 13, Dulce Nombre Sur (Fte Cam#908)	Ent. Cam.# 20, San Luis , escuela (1,3km R-141)	2	0,45	2	5	VC	Florencia	41	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0228	Ent. Cam.# 002, Cruce San Luis (1,1km Cam#827)	Ent. Cam.#132, C.Linda Vista (0,25km Cam#16)	2	1,4753	4	4	NCU	Quesada	15	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0217	Ent. Cam.# 13, Dulce Nombre Sur (Fte Cam#908)	Ent. Cam.# 20, San Luis , escuela (1,3km R-141)	2	0,293	5	VC	Quesada	41	2018					
									2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical	
									2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical	
									2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		
									2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial		
2-10-0217	Ent. Cam.# 13, Dulce Nombre Sur (Fte Cam#908)	Ent. Cam.# 20, San Luis , escuela (1,3km R-141)	2	0,45	2	5	VC	Florencia	41	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0228	Ent. Cam.# 002, Cruce San Luis (1,1km Cam#827)	Ent. Cam.#132, C.Linda Vista (0,25km Cam#16)	2	1,4753	4	4	NCU	Quesada	15	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0231	Ent. Cam.# 002, B° San pablo (0,45km R-141)	Fin Camino, Barrio San Pablo	2	0,3	3	5	VC	Quesada	43	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0298	Ent. R.250, Sahino, plaza deportes	Fin Camino, Río Sahino	2	0,1143	2	5	NCU	Pital	15	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0512	Calles Urbanas	Valle del Volcán, Fortuna	2	0,2	4	5	U	Fortuna	47	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0529	Ent. C.#75, Los Angeles (0,3km de R-141)	Ent. Cam.#72, Zona Fluca (0,5km de R-141)	2	0,1	1	5	NCU	Fortuna	15	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0711	Calles Urbanas	Urbanización, El Divino Niño, Pital	2	0,2	4	5	U	Pital	32	2018	Mantenimiento Rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0713	Calles Urbanas	La Comarca, Pital	2	0,632	2	5	U	Pital	32	2018	Mantenimiento Rutinario, Rehabilitación, Mejoramiento	SDC	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cordón y Caño	Demarcación horizontal y Vertical, Superficies Duraderas / Carpetas
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0720	Calles Urbanas	Las Delicias, Aguas Zarcas	2	0,356	2	5	U	A.Zarcas	46	2018	Mantenimiento Rutinario, Mejoramiento	SDEP	No aplica	Superficies Duraderas / Losas, SD Estructura de Pavimento, Demarcación horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0750	Ent. Cam#178, C. La Palmera (0,7km Cam# 748)	Fin Camino, finca Coopelesca	2	0,2	3	5	NCU	Palmera	19	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0753	Calles Urbanas	Santa Rosa, La Palmera	2	0,076		5	U	Palmera		2018	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0757	Ent. R-748, Cruce a Snta Rosa (0,3km Cam#178)	Ent. Cam#14, C.Santa Rosa (0,6km Cam#133)	2	0,7362	2	5	NCU	Palmera	36	2018	Mantenimiento Rutinario, Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación PluvialTubos de concreto alcantarillado,Cajas de registro, tragantes, cabezales,	Demarcación horizontal y Vertical, Movimiento de Tierra, ampliación de caminos, SD Estructura de Pavimento
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0758	Ent. Cam#757, Cruce a Snta Rosa (0,2km R-748)	Fin Camino, Río San Rafael	2	0,14	2	5	NCU	Palmera	16	2018	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SDEP	No aplica	Demarcación horizontal y Vertical, Superficies SD Estructura de Pavimento, Construcción de puentes vehicular
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0764	Ent. R-140, Agua Caliente (0,9km Pte Río Sn Raf.)	Fin Camino, finca Fredy Arroyo	2	0,29	2	5	NCU	Palmera	10	2018	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0771	Calles Urbanas	Platanar, Florencia	2	0,108		5	U	Florencia	37	2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0773	Calles Urbanas	Barrio Corazón de Jesús, Venecia	2	0,16	2	5	U	Venecia	43	2018	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0781	Ent. Cam#54, Cruce a Marsella (0,1km Cam#780)	Fin Camino, Finca Cecilia Mejía	2	0,19	2	5	NCU	Venecia	29	2018	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0786	Ent. R-140, Cruce Marsella (0,05km Cam#126)	Ent. Cam#53, Barrio Jardín (Fte Cam#787)	2	0,3	3	3	NCU	Venecia	39	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0790	Ent. R-140, Corazón de Jesús (Fte Cam#52)	Fin Camino, Finca Benito Piedra	2	0,6	2	5	NCU	Venecia	33	2018	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0084	Ent. Ruta # 4, Cruce a Concepción	Ent. Ruta # 748, La Palmera	1	2,47	5	5	VC	Palmera	30	2018	Mantenimiento Rutinario, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial: Aceras y Cunetas	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
2-10-0084	Ent. Ruta # 4, Cruce a Concepción	Ent. Ruta # 748, La Palmera	2	1,025	5	5	VC	Palmera	30	2018				
										2019	Mantenimiento rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		No aplica	
										2022	Rehabilitación		No aplica	



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0800	Calles Urbanas	San Cayetano	2	0,4	2	5	U	Venecia	40	2018	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcacion Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0803	Ent. R-140, C. La Unión (0,4km Cam#804)	Ent. Cam#30, La Unión (1,1km Cam#46)	2	0,996	2	5	NCU	Venecia	43	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2019	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0807	Ent. R-140, C. Aguas Zarcas (0,1km Cam#139)	Fin Camino Finca Loma Murillo	2	0,08	2	4	NCU	A.Zarcas	33	2018	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0808	Ent. Cam#138, C. Aguas Zarcas (0,2km R-140)	Ent. Cam#136, C. Garabito (0,2km R-140)	2	0,1	2	4	NCU	A.Zarcas	32	2018	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0818	Ent. R-140, Aguas Zarcas (0,3km Cam#42)	Fin Camino Finca Los Alfaro	2	0,2	2	5	NCU	A.Zarcas	9	2018	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	No aplica	
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0825	Ent. R-140, San Juan, Escuela (0,1km Cam#238)	Fin Camino Finca Hortensia Gamboa	2	0,17	2	5	NCU	Quesada	26	2018				
										2019	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0828	Ent. R-141, Puente Casa (0,3km Cam#19)	Ent. Cam#206, Barrio Los Angeles (0,1km R-141)	2	0,26	1	5	NCU	Quesada	32	2018				
										2019	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0830	Ent. Cam#77, San José, La Tigra (0,9km R-702)	Ent. Cam#76, C. Sn Miguel (1,3km R-702)	2	0,55	2	5	NCU	La Tigra	19	2018	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0089	Ent. Ruta # 4, San Antonio (2,4 km R-752)	La Garita, Lim.Cant.S.Carlos/ Guatuzo	2	0,1	5	5	NCU	Monterrey	30	2019	Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021				
										2022				
2-10-0836	Ent. R-702, La Tigra (0,1km Cam#78)	Fin Camino Finca Nautilio Guevara	2	1,1	2	5	NCU	La Tigra	19	2018	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0090	Ent. Ruta # 4, Los Cedros (3,2km de R-752)	Ent. Ruta # 752, Chambacú (0,1km de Cam.#193)	4	6,9	5	5	NCU	Monterrey	22	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario	LTMP	No aplica	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0091	Ent. Ruta # 35, Buenos Aires (0,1km R-227)	Ent. Ruta # 752, C. Santa Rosa (1km Cam#437)	4	6,7	5	5	VC	Pocosol	33	2018	Mantenimiento rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2019	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL														
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0841	Ent. R-702, La Tigra (0,1km Cam#214)	Fin Camino Finca Augusto Jiménez	2	0,15	2	5	NCU	La Tigra	33	2018	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0872	Ent. Cam#22, C. San Francisco (0,8km Cam#23)	Fin Camino Finca Melvin Murillo	2	0,22	2	4	NCU	Florencia	10	2018				
										2019	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0886	Calles Urbanas	Lotificación, Florencia	2	0,15		5	U	Florencia		2018				
										2019	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0888	Ent. R-35, Platanar (0,3km Pte. sobre Río Platanar)	Fin Camino Finca Gilberto Castro Quesada	2	0,1	2	5	NCU	Florencia	18	2018				
										2019	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0889	Ent. R-35, Platanar (0,2km Cam#888)	Fin Camino Finca	2	0,127	5	NCU	Florencia			2018				
										2019	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0890	Ent. R-35, Platanar (0,03km Cam#889)	Fin Camino Finca Juan Santamaría	2	0,295	2	5	NCU	Florencia	39	2018	Mantenimiento Rutinario, Mejoramiento, Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial: Cajas de registro, tragantes, cabezales, Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0892	Ent. Cam#28, Dulce Nombre (0,3km Cam#13)	Ent. Cam#28, Dulce Nombre (Fte Cam#891)	2	0,18	2	5	NCU	Quesada	18	2018	Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0903	Ent. Cam#13, C. Dulce Nombre (0,02km Cam#902)	Fin Camino Finca Arturo Oviedo	2	0,162	1	5	NCU	Quesada	26	2018				
										2019	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0905	Ent. Cam#13, C. Dulce Nombre (Adj. Cam#904)	Fin Camino Finca Juan Félix Arce Alvarado	2	0,08	1	5	NCU	Quesada	26	2018				
										2019	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0906	Calles Urbanas	La Piñata, Dulce Nombre, Ciudad Quesada	2	0,28	4	5	U	Quesada	32	2018				
										2019	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0907	Ent. Cam#13, C Dulce Nombre S.(0,15km Cam#905)	Ent. Cam#908, Dulce Nombre S.(0,5km Cam#13)	2	0,15	2	4	NCU	Quesada	32	2018				
										2019	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0911	Calles Urbanas	Dulce Nombre Sur (Cedra), Ciudad Quesada	2	1,6605	4	5	U	Quesada	53	2018				
										2019	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0915	Ent. Cam#20, San Luis (0,5km Cam#914)	Fin Camino Finca, Entrada Acueducto Rural	2	0,05	2	5	NCU	Florencia	20	2018				
										2019	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0940	Calles Urbanas	Porvenir, Ciudad Quesada	2	0,175	2	5	U	Quesada	40	2018				
										2019	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0946	Ent. R-141, Cruce Cedral (0,3km Cam#13)	Fin Camino Finca Elizondo	2	0,05	2	5	NCU	Quesada	26	2018				
										2019	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Rehabilitación	SVDEM	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0959	Calles Urbanas	La Llanada, Ciudad Quesada	2	0,4	2	5	U	Quesada	12	2018	Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0965	(Ent.C.104) Campo Aterrizaje X: 449168,36 Y: 1211103,10	Fin Camino Escuela Campo Pocosol X: 448933,41 Y: 1210965,52	2	0,06	3	3	NCU	Pocosol	26	2018	Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0974	(Ent.C.219) Finca Parra X: 454345,99 Y: 1195374,19	Fin Camino Finca X:454310,94 Y: 1194616,20	2	0,8	3	3	NCU	Pocosol	20	2018	Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0975	(Ent.C.219) Finca Parra X:451687,31 Y: 1195145,52	Fin Camino Finca X:451752,46 Y: 1194862,41	2	0,04	3	3	NCU	Pocosol	20	2018	Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0976	(Ent.C.260) Cruce San Cristobal X:443266,78 Y: 1195429,30	(Ent.C.258) Pueblo Santo X:444894,50 Y: 1194885,32	5	1,9	3	3	NCU	Pocosol	30	2018	Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION	CONDICION	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0977	(Ent.C.260) Cruce San Cristobal X:443232,31 Y: 1195698,07	Limite Cantonal Los Chiles, Puente sobre rio Pocosol X:440755,80 Y: 1196206,07	5	2,8	3	3	NCU	Pocosol	37	2018	Rehabilitación	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-1051	(ENT N 030) Los Negritos	Fin camino Propiedad Privada Finca Albina Rodríguez Céspedes	2	0,06	4	5	NCU	Venecia	35	2018				
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0004	Entr.Camino #003,Colon (3,1km R140)	Entr.Cam #003,Fca La Pradera,Sn Gerard (1,6km R-140)	4	9,5	2	5	NCU	Quesada	25	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0013	Ent. R.141, C. Cedral (Fte a Cam#206)	Ent. Cam.# 14, San Ramón (0,15km Cam#166)	4	4,3		5	NCU	Quesada		2018	Mejoramiento	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mejoramiento	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				
2-10-0025	Ent.R141, C. Cuestillas (0,3km Cam#868)	Ent.Cam#36, Peje Viejo, Frente a Iglesia	4	1,51		5	VC	Florencia		2018				
										2019				
										2020	Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0041	Ent.R140, Los Negritos, A.Z (0,2km Río Negritos)	Ent. R-250, Cruce Los Chiles, A.Z. (0,7km R-751)	4	3,9	2	5	VC	A.Zarcas	76	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0065	Ent.R142, Cruce La Fortuna (3,7 km de R-702)	Fin camino, Agua Azul, Finca Los Rojas	4	4,8	2	5	NCU	Fortuna	33	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0080	Ent. R-702, La Tigra (0,3km Cam#839)	Fin camino, finca Bosque Eterno de los Niños	4	2,33	2	5	VC	La Tigra	29	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022				
2-10-0091	Ent. Ruta # 35, Buenos Aires (0,1km R-227)	Ent. Ruta # 752, C. Santa Rosa (1km Cam#437)	5	2		5	VC	Pocosol		2018				
										2019	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2020	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
2022	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación										



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (K.m.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0098	Ent. Ruta # 751, Santa Teresa Sur	Fin camino, Río San Carlos	4	6,3	1	5	NCU	Cutris	33	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0099	Ent. Cam.# 98, Santa Teresa Norte	Fin camino, Río San Carlos	4	2,4	1	5	NCU	Cutris	22	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0117	Ent. Cam.# 30, Los Negritos,Iglesia (0,3km R-140)	Ent. Cam.#140, San Juan (1,1km Cam#802)	4	1,8	1	5	NCU	Venecia	16	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0122	Ent. R-739, La Vieja, escuela (0,3km a Cam#215)	Lím.Cantonal S. Carlos/Alfaro Ruiz, La Quina	4	3,18	2	5	VC	Buena Vista	39	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0113	Mirador (1,0km de Cam.#11)Ent. Ruta # 4,	Unión (0,3m km de R-4)Ent.Cam # 11, La	1	0,35	5	5	NCU	Monterrey	15	2018	Mantenimiento rutinario	SDEP	No aplica	Bacheo en Asfalto y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario	SDRC	No aplica	Recarpeteo
										2022	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0140	Ent. R.140, Los Negritos (0,1km Cam#30)	Fin Camino, Finca Andres Garita	4	2,72	2	5	NCU	Venecia	16	2018	Mantenimiento periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022				
2-10-0149	Ent.Cam # 114, C. Pueblo Viejo (0,7km Cam#44)	Fin Camino, Proyecto Hidroelèctrico Caño Grande	4	2,4	2	5	VC	Venecia	23	2018	Mantenimiento periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0161	CUADRANTES PALMERA	CUADRANTES PALMERA	4	0,19	2	5	U	Palmera	51	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0212	Ent. R.702, C. San José (0,3km Cam#77)	Ent. Cam. #214, C.La Lucha (0,7km Cam#210)	4	1,4	2	5	NCU	La Tigra	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	No aplica	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0215	Ent.Ruta #141, Santa Clara (0,1km Cam#128)	Ent.Ruta #739, La Vieja (0,3km Cam#122)	4	3,6	4	5	VC	Florencia	19	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0217	Ent. Cam.# 13, Dulce Nombre Sur (Fte Cam#908)	Ent. Cam.# 20, San Luis , escuela (1,3km R-141)	4	1,2	2	5	VC	Quesada	41	2018	Mantenimiento Rutinario	SDEP	Evacuación Pluvial	Conformación
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (K.m.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0254	Ent. Cam.# 102, San Rafael, Cementerio	Ent. Cam.#202, Pueblo Nuevo	4	0,35	4	5	NCU	Pocosol	15	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0334	Ent. R.753, San Marcos, Parcelas	Fin Camino, Río San Carlos	4	1,5	2	5	NCU	Cutris	18	2018				
										2019				
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0336	Ent. Cam# 334 Parcelas San Marcos	Ent. Cam# 335 Parcelas San Marcos	5	0,8	1	5	NCU	Cutris	22	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0337	Ent. R.753, Parcelas San Marcos	Fin Camino, finca, Parcelas San Marcos	4	0,9	1	5	NCU	Cutris	16	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0364	Ent. Cam. #102, Cruce a Plomo	Ent. Cam.# 362, Cruce a Santa María	5	0,7	1	5	NCU	Pocosol	6	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantharillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0373	Ent. Cam. #202, Cruce a Pueblo Nuevo	Fin Camino, finca	5	4,2	1	5	NCU	Pocosol	9	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantharillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0377	Ent. Cam.# 376, Parcelas Sn Joaquín	Ent. Cam.# 372, (a 0,5km R227)	4	0,14	1	5	NCU	Cutris	9	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0531	Ent. Cam.#69, Sn Isidro (1,1 km Cam#68)	Fin Camino, finca Hernamos Quesada	4	2,4	2	5	NCU	Fortuna	24	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0584	Ent. Cam.#92, C. Terrón Colorado (0,7km R-35)	Fin Camino, finca Los Lobo	4	1,4	2	5	VC	Pocosol	22	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación, Mejoramiento	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado, Relastrados,
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0609	Ent. R.35, Terrón Colorado (0,7km Cam#92)	Fin Camino, Finca Los Gómez	4	2,5	2	5	VC	Cutris	19	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0627	Ent. R.4, Cruce a Cerro Cortés, Frente Cam#226	Ent. R.747, C. a Villa María (1,7km Cam#626)	4	4,3	3	5	NCU	A.Zarcas	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0647	Ent. R-749, Cruce La Gloria (0,4km Cam.#646)	Fin Camino, finca Vladimir Arrollo	4	1,1	2	5	NCU	A.Zarcas	25	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0671	Ent. R-250, La Legua, Escuela (0,8km R-746)	Fin Camino, Quebrada Pital	4	1,5	1	5	NCU	Pital	3	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0717	Ent. Cam#41, Esquipulas (0,8km Cam#716)	Fin Camino, finca	4	1	2	5	NCU	A.Zarcas	30	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0744	Ent. R-748, Cruce a Sn Rafael. (0,60km R-747)	Fin Camino, Río San Rafael	4	1,9	1	5	NCU	Florencia	10	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0776	Calles Urbanas	Urbanización Caporal, Aguas Zarcas	4	0,192	4	5	U	A.Zarcas	40	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	CPV	No aplica	Construcción de puentes vehicular
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				
2-10-0841	Ent. R-702, La Tigra (0,1km Cam#214)	Fin Camino Finca Augusto Jiménez	4	0,35	2	5	NCU	La Tigra	33	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0910	Ent. Cam#908,C. Dulce Nombre S.(0,2km Cam#907)	Fin Camino Finca Carmen Rojas	4	0,4	3	5	NCU	Quesada	12	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0911	Calles Urbanas	Dulce Nombre Sur (Cedral), Ciudad Quesada	4	0,6095	3	5	U	Quesada	53	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1001	(ENT C 030) Brisas	Fin Camino, Propiedad Privada	4	0,2	1	5	NCU	Venecia	18	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1030	(ENT C 030) La Union	Fin Camino Propiedad Privada	4	0,2	1	5	NCU	Venecia	39	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1031	(ENT C 079) La Tigra	(ENT C 079) La Tigra	4	0,5	1	5	NCU	La Tigra	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1042	(Ent C 116) La Union	Fin camino Propiedad Privado	4	0,4	1	5	NCU	Venecia	21	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1060	(ENT C 810) San Bosco	(ENT C 119) San Bosco	5	0,4	1	5	NCU	A.Zarcas	12	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1068	CALLES URBANAS CUADRANTES.	CUADRANTES PITALITO NORTE	4	0,3	1	5	U	A.Zarcas	100	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-1070	(ENT C 009) PEJE	Fin camino, propiedad Privada	4	0,5	1	5	NCU	Quesada	23	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-1079	(ENT C 169)Cruce a Coopesan Juan, Gloria	Fin de camino, Rio Tres Amigos	5	1	1	5	NCU	A.Zarcas	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación

2-10-1083	(ENT N 751) Caño Negro	Fin de camino, Propiedad Privada	5	0,8	1	5	NCU	Cutris	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1090	(ENT C 135) Finca Los Rojas	Fin Camino, Quebrada Zapotal	4	1	1	5	NCU	Palmera	19	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados, Movimiento de Tierra, ampliación de caminos
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1095	(ENT C 042) Alto Jimenez	Fin de Camino, Propiedad Privada	5	0,1	1	5	NCU	A.Zarcas	35	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial	Lastrado
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1098	(ENT C 716) PITALITO NORTE	(ENT C 717) PITALITO NORTE	4	1,3	1	5	NCU	A.Zarcas	18	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0008	Ent.R141, Sucre (0,25km Cam#235)	F.C. Sn José de la Montaña, Río La Vieja	3	0,6	2	5	VC	Quesada	53	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario	SDEP	No aplica	Bacheo en asfalto
										2020				
										2021				
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0025	Ent.R141, C. Cuestillas (0,3km Cam#868)	Ent.Cam#36, Peje Viejo, Frente a Iglesia	3	1,27	3	4	VC	Florencia	55	2018	Mantenimiento Rutinario	SDEP	No aplica	Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0056	Ent. R-250, Cruce 4 Esquinas (0,3km Cam#659)	Fin de Camino, Coopeisabel, Río Tres Amigos	3	1,9	3	4	VC	Pital	73	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2021				
2-10-0072	Ent.R141, Los Angeles, (0,7km de Camino#75)	Ent. Cam. #70, Zona Fluca	3	1,95	3	4	NCU	Fortuna	28	2018	Mantenimiento Rutinario	SDEP	No aplica	Demarcación horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0075	Ent.R141, Los Angeles, Frente a Cam.#69	El Bosque, Lím.Cant.S. Carlos/San Ramón	3	3,1	3	4	VC	Fortuna	63	2018				
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (K.m.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0096	Ent. Ruta # 35, La Araña, Boca Arenal	Ent. Ruta # 751, Sta Teresa	3	4,4	2	5	VC	Cutris	68	2018	Mantenimiento Rutinario	SDEP	No aplica	Demarcación horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto										
2-10-0157	CUADRANTES VENECIA	CUADRANTES VENECIA	3	1,9	3	5	U	Venecia	69	2018	Mantenimiento Rutinario	SDEP	Evacuación Pluvial	Demarcación horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2021				
2022														
2-10-0158	CUADRANTES PITAL	CUADRANTES PITAL	3	4,2	3	5	U	Pital	61	2018	Mantenimiento Periódico	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2020				
										2021				
2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo										
2-10-0163	CUADRANTES BOCA ARENAL, CUTRIS	CUADRANTES BOCA ARENAL, CUTRIS	3	0,02	3	4	U	Cutris	69	2018	Mantenimiento Rutinario, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Demarcación horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2020				
										2021				
2022														

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0165	CUADRANTES SANTA ROSA	CUADRANTES SANTA ROSA	3	0,51	3	5	U	Pocosol	56	2018				
										2019				
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2021				
										2022				
2-10-0653	Calles Urbanas	Los Llanos Aguas Zarcas	3	0,965	3	4	U	A.Zarcas	43	2018	Mantenimiento Rutinario, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado,Cajas de registro, tragantes, cabezales y Cordón y Caño	Demarcación horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0971	(Ent.C.104) Moravia-Crucitas X: 454709,83 Y: 1210085,05	Fin Camino Finca X: 453886,98 Y: 1211281,96	3	1,6	1	4	NCU	Pocosol	15	2018	Mantenimiento rutinario	SDEP	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0093	Ent. R-4, Sn José de Cutris (1,2km de Cam#69)	Fin camino, Río San Carlos	6	0,33	3	3	VC	Cutris	38	2018	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2019	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2020	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2021	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2022	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0153	CUADRANTES CIUDAD QUESADA	CUADRANTES CIUDAD QUESADA	6	1,3	4	5	U	Quesada	87	2018	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2019	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2020	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2021	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2022	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
2-10-0177	Ent.Ruta# 702, La Orquidea (1,5 km R-142)	Fin Camino. Reserva Ecológica Catarata R.Fortuna	6	0,8	2	5	VC	Fortuna	35	2018	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2019	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2020	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2021	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2022	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
2-10-0911	Calles Urbanas	Dulce Nombre Sur (Cedral), Ciudad Quesada	6	0,16	2	4	U	Quesada	53	2018	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2019	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2020	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2021	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2022	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
2-10-0954	Calles Urbanas	San Vicente, Ciudad Quesada	6	4,1	4	3	U	Quesada	33	2018	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2019	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2020	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2021	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad
										2022	Comunidad	COM	Evacuación Pluvial	Comunidad



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0003	Entr.R140, Cafetalera - Colón (0,1km Cam#01)	Entr.R140, San Martín (0,2km Cam#236)	4	3,226	4	4	VC	Quesada	59	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
2-10-0008	Ent.R141, Sucre (0,25km Cam#235)	F.C. Sn José de la Montaña, Río La Vieja	4	5,43	2	4	VC	Quesada	53	2018	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0009	Ent.R-739, Pénjamo (0,1km Cam#918)	Ent.Cam.# 122, Buena Vista (0,9km Cam#38)	4	5,74	3	4	VC	Quesada	45	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial: Cajas de registro, tragantes, cabezales	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento, Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0148	Ent. R.140, C. Sn Cayetano (0,9km Cam#49)	Fin Camino, Finca Fernando Obando	2	1,18	5	5	NCU	Venecia	83	2018	Mantenimiento Rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019	Mantenimiento Rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento Rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Mantenimiento Rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2022	Mantenimiento Rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
2-10-0009	Ent.R-739, Pénjamo (0,1km Cam#918)	Ent.Cam.# 122, Buena Vista (0,9km Cam#38)	4	3,5	3	4	VC	Florencia	45	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0009	Ent.R-739, Pénjamo (0,1km Cam#918)	Ent.Cam.# 122, Buena Vista (0,9km Cam#38)	4	1	3	4	VC	Buena Vista	45	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0012	Ent. Cam.# 11, C. Mirador (1,4km Cam#192)	Snta Marta, Fin de Camino, Quebrada Pocosolito	4	4,8	3	4	NCU	Monterrey	16	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0014	Ent.R748, La Marina (0,6km R-140)	Fin de Camino, San Ramón	4	7,1	3	4	VC	Quesada	30	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0017	Ent. Ruta # 35, Tres y Tres	Ent. Ruta # 35, Cruce a Acapulco (1km Centro)	4	2,7	4	4	VC	Pocosol	36	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0018	Ent.Camino #016, Linda Vista	Ent.Camino #133, Corazón de Jesús	4	0,7	4	4	NCU	Quesada	22	2018	Mejoramiento y rehabilitacion	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0019	Ent. R.141, Puente Casa, Escuela (1,3km Cam#13)	Ent.Camino #217, Cruce San Luis(1,1km Cam#20)	4	0,4			NCU	Florencia		2018	Mantenimiento rutinario	LTMR	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0028	Ent.R-748, San Juan, Iglesia (Fte Cam#27)	Ent.Cam#13, Dulce Nombre Norte, Iglesia	4	1,3	3	4	NCU	Florencia	18	2018	Mejoramiento y rehabilitacion	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento y rehabilitacion	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0030	Ent.R140, Los Negritos, A.Z (0,1km Cam#140)	Ent. Camino # 148 (Fte Cam#44, Cruce los Alpes)	4	3,72	2	4	NCU	Venecia	47	2018	Mantenimiento Periódico	SDEP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico	SDEP	No aplica	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento rutinario	SDEP	No aplica	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



0,00											CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL				2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE				
2-10-0033	Ent.R141, El Molino (1,1 km de Cam#168)	Fin de Camino, Finca Mario Barrientos	4	2,1	4	4	VC	Florencia	28	2018								
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados				
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados				
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados				
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados				
2-10-0040	Ent. R-250, Urban. Chaparral (0,6km Cam#145)	Ent. Cam. #41, Concepción (1,0km Cam#729)	4	2,7	4	4	NCU	A.Zarcas	25	2018								
										2019	Mantenimiento Periódico	SDEP	No aplica	Relastrados				
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación				
										2021	Mantenimiento rutinario	SDEP	No aplica	Relastrados				
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación				
2-10-0042	Ent.R140, Aguas Zarcas, Colegio	Fin de Camino, Finca Raúl Arce	4	0,64	3	4	NCU	A.Zarcas	47	2018								
										2019	Mantenimiento Periódico	SDEP	No aplica	Relastrados				
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación				
										2021	Mantenimiento rutinario	SDEP	No aplica	Relastrados				
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación				
2-10-0044	Ent. Cam. #114, Pueblo Viejo (Adjunto a Cam.#51)	Ent. Cam. #148, C. Los Alpes (Fte. Cam#30)	4	0,9	4	4	NCU	Venecia	63	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento				
										2019								
										2020								
										2021								
										2022								



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0045	Ent. Cam. #106, El Concho	Ent. Camino # 201, Banderas	4	3,2	4	4	VC	Pocosol	30	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0048	Ent. Cam. #146, Cruce a Pitalito (0,4km Cam#47)	Fin de Camino, Finca Dago Castro	4	1,2	2	4	NCU	Venecia	25	2018	Mantenimiento Periódico	SDEP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0050	Ent. Cam. #53, Cruce a Venecia (0,1km R-140)	Fin de Camino, Finca José Angel Ramírez	5	0,5	4	4	NCU	Venecia	15	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0052	Ent.R140, Venecia, Coraz. de Jes(0,3km Cam#53)	Ent. R-250, Pital (0,3km R-744)	4	6,204	4	4	VC	Venecia	73	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0052	Ent.R140, Venecia, Coraz. de Jes(0,3km Cam#53)	Ent. R-250, Pital (0,3km R-744)	4	4	2	4	VC	Pital	73	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
2-10-0055	Ent. R-250, I Griega, La Legua	Fin de Camino, Tres Amigos	4	8,5	1	4	VC	Pital	34	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0057	Ent. R-250, 4 Esquinas (0,7km Cam#59)	Ent. Cam. #56, Coopelsabel (0,6km Cam#673)	4	3,8	4	4	VC	Pital	63	2018				
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0058	Ent. Cam.#56, C. Los Angeles (1,1km Cam#687)	Ent. Cam.#57, C. Carmen (6,5 km R-250)	4	1,6	4	4	NCU	Pital	45	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0059	Ent. R-250, C. 4 Esquinas (0,7km Cam#57)	Ent. Cam#57, Cruce 4 Esquinas (1,3km R-250)	4	4,1	3	4	NCU	Pital	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0060	Ent. R-250, Cruce a Pital (1,5km Cam#52)	Ent. R-250, 4 Esquinas (Adjunto a Cam#57)	4	4,8	2	4	VC	Pital	19	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0158	CUADRANTES PITAL	CUADRANTES PITAL	2	0,26	5	5	U	Pital		2018				
										2019	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2020	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0062	Ent. Cam.# 60, Puerto Escond. (0,7km Cam#61)	Fin de Camino, Finca Leonicia Rojas	4	3,4	3	4	NCU	Pital	22	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0063	Ent. R. 227, Coopevega, Cruce a Moravia	Ent. Cam.# 103, El Carmen	4	12	4	4	NCU	Cutris	22	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0066	Ent. R-4, Entrada a Sn Jorge (0,6 km de Cam#542)	Ent.R141, Tanque, Plaza (Fte a Cam#517)	4	0,02	2	4	VC	Fortuna	80	2018				
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0068	Ent. Cam. #66, San Jorge (0,4km de R-4)	Ent. Cam. #69, Cruce San Isidro (0,9km de R-4)	4	2,4	4	4	VC	Fortuna	77	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0070	Ent.R142, Cruce a Tanque (1,1km de R-141)	Ent. Cam. #75, Frente a Cementerio Los Angeles	1	0,05	4	4	VC	Fortuna	34	2018	Mantenimiento Rutinario, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial: Aceras	SD Estructura de Pavimento, Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0071	Ent. Cam. #70, Zona Fluca (2,5km de R-142)	Fin de Camino, Finca Domingo Monge	4	1,1	4	4	NCU	Fortuna	24	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0074	Ent. Cam. #73, Zona Fluca (0,6km de Cam.#70)	Ent. Cam. #75, Cruce a El Bosque (0,7km R-702)	4	3,7	4	4	NCU	Fortuna	28	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0076	Ent. R-702, Cruce La Tigra (0,5km R-738)	Lím.Cant.Sn Carlos/Sn Ramón, Río Peñas Blancas	4	5,3	2	4	NCU	La Tigra	30	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0077	Ent. R-702, Cruce La Tigra (0,8km Cam#76)	Fin camino, finca Luis Angel Camacho	4	1,05	4	4	NCU	La Tigra		2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial: Aceras	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial: Aceras	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0078	Ent. R-702, La Tigra (0,2km Cam#841)	Ent. Cam. #77, C, Sn José, La Tigra (0,05 Cam#830)	4	2,372	2	4	NCU	La Tigra	31	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0081	Ent. Ruta # 4, San Francisco, Fte Cam#623	Fin camino, Río Kopper	4	0,35	4	4	NCU	Palmera	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0083	Ent. R-748, Cruce La Palmera (0,6km Cam#84)	Fin camino, Río San Rafael	4	1,3	3	4	NCU	Palmera	28	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0085	Ent. R- 748, La Palmera (0,7km Cam#84)	Ent. R- 748, Cruce La Palmera (0,7km Cam#747)	4	2,79	3	4	NCU	Palmera	25	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0087	Ent. Ruta # 734, La Esperanza (1 km Cam#86)	Ent. Cam# 64, Cr. Sangregado (2 km Cam#455)	4	5,8	3	4	NCU	Venado	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0089	Ent. Ruta # 4, San Antonio (2,4 km R-752)	La Garita, Lím.Cant.S.Carlos/ Guatuzo	4	18	4	4	NCU	Monterrey	30	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0092	Ent. R-35,Terrón Colorado (0,1km Pte. R.S.Carlos)	Ent. Cam# 11, Montelimar, Escuela	4	14	4	4	VC	Pocosol	30	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0094	Ent. Cam. #95, Kopper (1,8km R-35)	Fin camino, Finca Quiko Alfaro (Proy. Hebron)	4	2,8	4	4	NCU	Cutris	55	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0095	Ent. R-35,Cruce a Muelle (1,1km Cam#753)	Ent. Ruta # 751, Cruce a Sn Jorge (2,5km R-614)	4	7	4	4	VC	Cutris	33	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0165	CUADRANTES SANTA ROSA	CUADRANTES SANTA ROSA	1	2,85	5	5	U	Pocosol	56	2018	Mantenimiento Rutinario, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial:	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
2-10-0101	Ent. Ruta # 35, Tres y Tres	Ent. Cam.# 106, Cruce San Rafael	4	10,4	4	4	VC	Pocosol	30	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL 2018

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0102	Ent. Cam.# 100, La Luisa	Ent. Cam.# 106, Cruce San Rafael	4	12,41	4	4	VC	Pocosol	60	2018	Mantenimiento Periódico, Mejoramiento, Rehabilitación,	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados, Lastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación

2-10-0103	Ent. Cam.# 063, Cruce a Coopevega	Sn Vito, Ent. Cam.# 063, El Carmen	4	12	4	4	NCU	Cutris	22	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0108	Ent. Cam.# 43, La Aldea	Sn Alejo, Lim.Cant.Sn Carlos/Chiles	4	0,84	4	4	VC	Pocosol	36	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0108	Ent. Cam.# 43, La Aldea	Sn Alejo, Lim.Cant.Sn Carlos/Chiles	5	2,76	4	4	VC	Pocosol	36	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0111	Ent. Ruta # 753, San Marcos	Ent. Cam.# 189, Los Almendros. C. a Betania	4	10,7	4	4	VC	Cutris	33	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0111	Ent. Ruta # 753, San Marcos	Ent. Cam.# 189, Los Almendros. C. a Betania	5	3	4	4	VC	Cutris		2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0112	Ent. Ruta # 752, San Bosco, Iglesia	Lim.Cant.San Carlos/Chiles	4	3,8	4	4	NCU	Pocosol	30	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0115	Ent. Cam.#114, C. Pueblo Viejo (1,8km Cam#44)	Ent. Cam.#148, Los Alpes (0,05km Escuela)	4	4,5	2	4	NCU	Venecia	19	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0119	Ent. R.140, Iglesia Aguas Zarcas (Fte a R-250)	Fin Camino, Parque Nacional Juan Castro Blanco	4	3,05	3	4	VC	A.Zarcas	65	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0120	Ent. Cam.# 42, Montecristo (1,4km a R-140)	Ent. Cam.#119, Garabito (0,5km Cam#136)	4	0,69	3	4	NCU	A.Zarcas	25	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento, Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0123	Ent. Ruta # 227, Coopevega	Fin Camino, Río San Carlos, Cascada	4	2	4	4	VC	Cutris	41	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0131	Ent. R-35, Quebrada Azul (0,25km Cam#36)	Ent. Cam.# 13, Dulce Nombre Norte (Iglesia)	4	1,05	3	4	NCU	Quesada	25	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020				
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022				
2-10-0131	Azul (0,25km Cam#36) Ent. R-35, Quebrada	Dulce Nombre Norte (Iglesia) Ent. Cam.# 13,	4	2,3	2	4	NCU	Florencia	25	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020				
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022				



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO N°	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0132	Ent. R.140, San Juan (0,4km Cam#03)	Ent. Cam. # 014, La Selva, Linda Vista	4	5,21	2	4	VC	Quesada	48	2018	Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0133	Ent.Ruta #140, San Rafael (0,9km Pte Río Sn Raf)	Ent. Cam. #14, La Selva (0,6km Cam#757)	4	6,3	3	4	VC	Quesada	33	2018	Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0134	Ent. R.140, Cruce La Marina (Fte a Cam#135)	Fin Camino, Finca Tilapias Soto	4	4,1	4	4	VC	Palmera	30	2018	Mejoramiento, Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados, Movimiento de Tierra, ampliación de caminos
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0135	Ent. R.140, C. Aguas Zarcas (Fte a Cam#134)	Fin Camino, Finca Los Rojas	4	4,32	4	4	NCU	Palmera	25	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0137	Ent. R.140, C. Aguas Zarcas (0,22km Cam#807)	Fin Camino, Finca Hermanos Víquez	4	0,2	3	4	NCU	A.Zarcas	29	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0139	Ent. R.140, C. Aguas Zarcas (0,4km Cam#41)	Fin Camino, Finca Norma Estrada (Qb. Pericos)	4	0,7	4	4	NCU	A.Zarcas	22	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0141	Ent. R.140, Venecia (0,1km Cam#772)	Fin Camino, Finca Eduardo Vargas	4	1,1	4	4	VC	Venecia		2018	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0143	Ent. R.140, San Matín, Fte Colegio de Venecia	Fin Camino, Las Nubes, Eloy Chacon	4	4,5	4	4	NCU	Venecia	35	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0146	Ent.Cam # 47, Cruce Pitalito (1,2 km Cam#41)	Fin Camino, Finca Carlos Solís	4	1,33	3	4	NCU	Venecia	47	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0147	Ent.Cam # 41, Esquipulas, frente a Cam#717	Ent.Cam # 41, Cruce Concepción (0,5km Cam#724)	4	1,4	3	4	NCU	A.Zarcas	35	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0152	Ent. R-738, C. Sn Pedro (0,2km Cam#211)	Ent.Cam#839, La Tigra (0,1km R-702)	4	5,89	3	4	VC	La Tigra	33	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0153	CUADRANTES CIUDAD QUESADA	CUADRANTES CIUDAD QUESADA	4	2,752	4	4	U	Quesada		2018	Mejoramiento	SDEP	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Demarcación Horizontal y Vertical, SD Estructura de Pavimento
										2021				
									2022	Mantenimiento Rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical	
2-10-0153	CUADRANTES CIUDAD QUESADA	CUADRANTES CIUDAD QUESADA	5	0,156	4	4	U	Quesada		2018				
										2019	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial	Lastrado
									2022	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación	
2-10-0155	Ent.Cam # 124, Ron Arriba (0,8km Cam#925)	Ent.Cam # 09, Cruce Ron (1,8km Cam#125)	5	1,9	1	4	NCU	Quesada	16	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial	Lastrado
									2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación	
2-10-0157	CUADRANTES VENECIA	CUADRANTES VENECIA	4	3,474	3	4	U	Venecia	69	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado...	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial	Lastrado
									2022					



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0158	CUADRANTES PITAL	CUADRANTES PITAL	4	6,54	3	4	U	Pital		2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de Registro, tragantes, cabezales	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial	Lastrado
										2022	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0162	CUADRANTES VENADO	CUADRANTES VENADO	4	1,39	3	4	U	Venado	53	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0163	CUADRANTES BOCA ARENAL, CUTRIS	CUADRANTES BOCA ARENAL, CUTRIS	4	0,804	4	4	U	Cutris	69	2018	Rehabilitación y Mantenimiento periódico	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2019				
										2020				
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2022	Mejoramiento y Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0165	CUADRANTES SANTA ROSA	CUADRANTES SANTA ROSA	4	4,339	4	4	U	Pocosol	56	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019	Rehabilitación y Mantenimiento periódico	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021	Rehabilitación y Mantenimiento periódico	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Rehabilitación y Mantenimiento periódico	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
2-10-0166	Ent. Ruta #748, San Juan	Ent. C.014, Cruce a Sn Ramón	4	4,1	4	4	NCU	Quesada	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0167	Ent. R.141, Cruce La Vega (0,5km de Cam#552)	Fin Camino, Finca Los Chavarría	4	0,9	2	4	NCU	Florencia	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0174	Ent.R.# 250, Entrada a Castellar	Ent. C.111, Los Almendros	4	3,25	4	4	VC	Pital	33	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0174	Ent.R.# 250, Entrada a Castellar	Ent. C.111, Los Almendros	4	3,25	4	4	VC	Cutris	33	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0175	Ent.Ruta# 250, Sahino	Ent.Ruta# 746, Cruce a Veracruz	4	4,9	4	4	VC	Pital	36	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0176	Ent.Ruta# 745, Cruce a Trinchera (2,3km Cam#668)	Ent.Ruta# 745, Veracruz, Frente a Cam#662	4	4,3	3	4	VC	Pital	33	2018	Mejoramamiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramamiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0177	Ent.Ruta# 702, La Orquidea (1,5 km R-142)	Fin Camino. Reserva Ecológica Catarata R.Fortuna	4	3,5	4	4	VC	Fortuna	35	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0178	Ent. R- 748, Cocaleca, Plaza (0,3km Cam#757)	Ent.Cam.#85, C. La Palmera (0,2km Cam#748)	4	3,55	3	4	NCU	Palmera	31	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento, Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0179	Ent.Ruta# 04, Jicarito, Frente a R-734	Pataste, Lím. Cant. Sn Carlos/Guatuzo	4	6,3	3	4	VC	Venado	38	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento, Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0180	Ent.Camino #89, San Miguel (0,2km Escuela.)	Ent. Cam.#179, Cruce a Jicarito (0,7km R-4)	4	1,8	2	4	NCU	Venado	27	2018	Mejoramiento, Mantenimiento Periódico	LTMP	No Aplica	Construcción de puentes vehicular, Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0180	Ent.Camino #89, San Miguel (0,2km Escuela.)	Ent. Cam.#179, Cruce a Jicarito (0,7km R-4)	4	1,8	2	4	NCU	Monterrey	27	2018	Mejoramiento, Mantenimiento Periódico	LTMP	No Aplica	Construcción de puentes vehicular, Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0181	Ent.Ruta# 734, La Tigra (0,6 km Escuela)	Ent. Cam.#221, Santa Lucía, Plaza	4	8,3	3	4	NCU	Venado	19	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0197	Ent. R-35, Las Nieves, Frente a Cam#26	Ent. Cam.#91, C. a Estrella (0,02km Cam#191)	1	0,36	5	5	VCN	Pocosol	21	2018	Mantenimiento Rutinario, Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento, Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0185	Ent. Cam.#103, Cruce a El Jardín	Fin Camino, intransitable a Boca de S.C	4	10,4	4	4	NCU	Cutris	13	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0187	Ent. Cam.#063, El Carmen	Ent. Cam.# 104, Chamorro	4	11,7	4	4	NCU	Cutris	19	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0190	Ent. R.227, Coopevega	Ent. Cam.#199, Infiernito	4	1	4	4	NCU	Cutris	7	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación

2-10-0199	Ent. R.227, Moravia	Ent. Cam.#106, Llano verde	4	7,6	5	5	NCU	Cutris	19	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0194	Ent. Cam.# 193 La Orquidea (0,5km Escuela)	Lím.Cant.Sn Carlos/Chiles, La Tigra, Plaza	4	8	4	4	NCU	Monterrey	27	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0198	Ent. Cam.#100, Santa María	Ent. Cam.#101, Cruce Las Brisas	4	2,1	4	4	NCU	Pocosol	22	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0200	Ent. Cam.# 104, La Guaría	Ent. Cam.# 106, Azucena	4	7,3	1	4	NCU	Pocosol	22	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0201	Ent. Cam.# 104, Cuatro Esquinas	Ent. Cam.# 106, Carrizal	4	17,4	4	4	VC	Pocosol	53	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0202	Ent. R.227, San Joaquín	Ent. Cam.# 106, Cruce a El Concho	4	17,6	4	4	VC	Cutris	54	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0204	Entr. Cam.#201 y Cam#045, Banderas	Ent. Cam#2-14-041, Lim.Cant.Sn Carlos/Chiles,	4	11,3	4	4	VC	Pocosol	33	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0211	Ent. R.738, C. Sn Pedro (0,2km Cam#152)	Ent. Cam. #210, C.La Lucha (0,9km R-738)	4	1,5	4	4	NCU	La Tigra	39	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0213	Ent. Cam. #210, C.La Lucha (0,8km cam#214)	Ent. Cam. #152, C. El Futuro (0,35km Cam#210)	4	1,4	3	4	NCU	La Tigra	22	2018	Mantenimiento Periódico, Mantenimiento rutinario	LTMR	No aplica	Conformación, Relastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0218	Ent. Cam.# 106, San Rafael	Ent. Cam.#202, Paso Real	4	4,2	4	4	NCU	Cutris	19	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0222	Ent. R.752, San Martín (0,8 km Río Pocosol)	Ent. Cam.#17, Cruce.Tres y Tres (0,2km R35)	4	4,9	2	4	VC	Pocosol	33	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0208	Ent.Ruta #140, San Juan (0,1km Cam#15)	Ent.Cam.#15, Urbanizac.Progresista (0,2km R-140)	1	0,41	5	5	NCU	Quesada	42	2018	Mantenimiento rutinario	SDEP	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0224	Ent. Cam.#91, Buenos Aires (1,1km R-35)	Sn Isidro, Fin camino, Finca La Margarita	4	2,9	4	4	NCU	Pocosol	16	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0225	Ent. R.753, Betania	Fin de camino, Río Sn Carlos, Parcelas	4	3,5	4	4	NCU	Cutris	16	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0228	Ent. Cam.# 002, Cruce San Luis (1,1km Cam#827)	Ent. Cam.#132, C.Linda Vista (0,25km Cam#16)	4	0,005	4	4	NCU	Quesada	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0229	Ent. Cam#228, C. Sn Luis (0,2km Cam#02)	Fin Camino, San Luis	4	1,5	4	4	VC	Quesada	37	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0234	Ent. Cam.# 008, Sucre (0,5km C.N#235)	Fin de Camino, Río La Vieja	4	1	4	4	NCU	Quesada	13	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0235	Ent. R.141, Sucre (0,4km Cam#124)	Ent. Cam.# 008, Sucre (Escuela) (0,5km R-141)	4	0,15	4	4	VC	Quesada	43	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0237	Ent. R-140, Centro Diosesano (1,6km Cam#01)	Ent. Cam.#004, finca las nubes (1,1km Cam#170)	4	4,025	1	4	NCU	Quesada	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0244	Ent. Cam.#106, Azucena	Ent. Cam.#199, Cruce a Llano Verde	4	2,4	1	4	NCU	Pocosol	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0246	Ent. Cam.#201, 4 esquinas	Fin de Camino, finca, Río Pocosol	5	3,5	1	4	NCU	Pocosol	9	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0249	Ent. Cam.#187, Cruce Chamorro	Fin de Camino, El Roble, Río Sn Juan	4	6,36	4	4	VC	Cutris	29	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0250	Ent. Cam.#123, Cruce Cascada, Sn Francisco	Ent. Cam.#185, Cruce a Jardín	4	8,45	4	4	NCU	Cutris	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0251	Ent. Cam.#103, San Vito	Ent. Cam# 250, Patastillo, Sn Francisco.	4	2,25	4	4	NCU	Cutris	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0252	Ent. R.227, Coopevega	Fin de Camino, Río San Carlos	4	6,4	4	4	NCU	Cutris	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0253	Ent. R.227, Coopevega	Fin de Camino, Finca Julián Castillo	4	2,7	4	4	NCU	Cutris	3	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0257	Ent. Cam.#205, Cruce Banderas	Río Pocosol a Escaleras	4	3	4	4	NCU	Pocosol	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados, lastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0258	Ent. Cam.#106, La Ceiba	Ent. Cam.#204, Pueblo Santo	4	0,72	4	4	NCU	Pocosol	15	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0258	Ent. Cam.#106, La Ceiba	Ent. Cam.#204, Pueblo Santo	5	8,68	4	4	NCU	Pocosol	15	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0260	Ent. Cam.#204,Cruce Sn Cristóbal	Ent. Cam.#43, La Aldea	4	1	4	4	NCU	Pocosol	15	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0266	Ent. Cam.#201, Cruce Banderas	Fin Camino, finca Reforestada	4	1,5	4	4	NCU	Pocosol	9	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0274	Ent. Cam.#260, Cruce Aldea. 1,9km. Cam. #43	Fin Camino, finca Juan Barrantes	4	2,1	3	4	NCU	Pocosol	9	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0275	Ent. Cam.#102, Rancho Quemado	Ent. Cam.#254, Pueblo Nuevo	4	5,4	3	4	NCU	Pocosol	15	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0276	Ent. Cam.#187, El Carmen	Fin Camino, Río Sn Juan	4	12,6	4	4	NCU	Cutris	12	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0281	Ent. Cam.#123, Cruce Cascada, Escuela	Fin Camino, Río Sn Carlos, Sn Fernando	4	6	4	4	NCU	Cutris	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0282	Ent. Cam.#123, Limoncito	Fin Camino, finca Hugo Núñez	4	2,5	4	4	NCU	Cutris	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0283	Ent. Cam.#282, Limoncito	Fin Camino, finca Los Moyas	4	1,5	4	4	NCU	Cutris	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0284	Ent. Cam.#123, Cruce Limoncito	Ent. Cam#250, Patastillo	4	5	4	4	NCU	Cutris	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMA DO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0285	Ent. Cam.#123, Cruce Coopevega	Fin Camino, finca	4	1	4	4	NCU	Cutris	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0286	Ent. R.227, Coopevega	Fin Camino, finca Dago Chávez	4	0,3	4	4	NCU	Cutris	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0288	Ent. R.227, Cocobolo	Fin Camino, Río Infiernito	4	0,2	4	4	NCU	Cutris	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0227	Ent.R. #04, Sn Antonio Monterrey (1,8km R752)	Ent. C.#88, Linda Vista, Venado (0,3 R734)	4	4,35	5	5	NCU	Venado	27	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0227	Ent.R. #04, Sn Antonio Monterrey (1,8km R752)	Ent. C.#88, Linda Vista, Venado (0,3 R734)	4	4,35	5	5	NCU	Monterrey	27	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0289	Ent. R.227, San Joaquín	Fin Camino, finca Enrique Araya	4	2,8	4	4	NCU	Cutris	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0292	Ent. R.250, Hda.Tres Amigos	Fin Camino, finca	4	0,7	4	4	NCU	Pital	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0314	Ent. Cam.# 174, Cruce Castellar	Fin Camino, finca reforestada	4	1,2	4	4	NCU	Pital	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0330	Ent. Cam. #225, Parcela Betania	Fin Camino, Río San Carlos, Parcelas	5	2,5	1	4	NCU	Cutris	12	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0332	Ent. Cam.# 331, Pueblo Nuevo.	Fin Camino, Río San Carlos, Los Magón	5	2	1	4	NCU	Cutris	0	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0335	Ent. Cam# 334 Parcelas San Marcos	Fin Camino, finca, Parcelas San Marcos	4	0,3	1	4	NCU	Cutris	16	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0346	Ent. R.750, Escuela Vasconia	Ent. R.753, Bella Vista	4	9,5	1	4	VC	A.Zarcas	33	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	CPV	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	Construcción de puentes vehicular
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0347	Ent. R-750, Cruce a Altamira	Fin Camino, finca Danta	4	2,8	3	4	NCU	A.Zarcas	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0350	Ent. Cam.# 346, Bella Vista	Fin Camino, finca Daniel Flores	4	0,2	1	4	NCU	Cutris	23	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0363	Ent. Cam# 363, Cruce a Santa María	Fin Camino, finca	5	0,36	4	4	NCU	Pocosol	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0366	Ent. Cam. #106, Cruce a Sn Rafael	Fin Camino, finca René Rojas, Parcelas	4	0,7	4	4	NCU	Pocosol	9	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0368	Ent. Cam. #102, El Plomo	Ent. Cam.# 372, Cruce a Sn Joaquín (2km R227)	4	0,55	1	4	NCU	Pocosol	18	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación, Mejoramiento	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados, Lastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0372	Ent. R.227, Sn Joaquín, Escuela	Ent. Cam.# 275, Cruce a Pueblo Nuevo	4	4,6	4	4	NCU	Pocosol	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0409	Ent. R.35, Nieves (a 3,5km de R227)	Ent. Cam. #197, Los Angeles	4	0,9	4	4	NCU	Pocosol	40	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0410	Ent. R.35, Santa Rosa (a 0,3km de R752)	Ent. Cam. #100, Snta María, (a 0,4km R-35)	4	1,5	4	4	NCU	Pocosol	35	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial, Cordón y Caño	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial, Cordón y Caño	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0412	Ent. Cam.# 410, Paraíso(0,2km R35)	Ent. Cam.# 413, Paraíso(0,25km	4	0,4	4	4	NCU	Pocosol	40	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0413	Ent. Cam.# 410, Paraíso (0,25km R-35)	Fin Camino, finca	5	0,3	4	4	NCU	Pocosol	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0415	Ent. R.35, Santa Rosa (a 0,1km de R752)	Ent. Cam #414, Bª Jazmín (0,5km R35)	4	0,2	4	4	NCU	Pocosol	18	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0417	Ent. R.35, Cruce a Acapulco (0,4km R.Pocosol)	Ent. Cam#222, C. Juanilama (2.4km R35)	4	1,088	2	4	NCU	Pocosol	26	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0419	Ent. Cam# 417, Juanilama (0,2km Cam.#222)	Fin Camino, finca Felix Calvo	4	1,2	4	4	NCU	Pocosol	12	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0420	Ent. Cam. #222, Juanilama (1,5km R752)	Ent. Cam# 417, Esc. Juanilama (0,8km Cam.#222)	4	0,12	2	4	NCU	Pocosol	18	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0424	Ent. Cam. #222, C. Sn Martín (0,9km R752)	Fin Camino, finca Victor Cruz	4	0,5	4	4	NCU	Pocosol	12	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0426	Ent. Cam. #17, Cruce a Tres y Tres, Plaza	Ent. Cam. #195, C. Tres y Tres (0,3km Plaza)	4	0,3	4	4	NCU	Pocosol	32	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación

2-10-0428	Ent. Cam. #17, Tres y Tres Frente. Escuela	Ent. Cam. #17, Tres y Tres Frente. Plaza	4	0,3	4	4	NCU	Pocosol	38	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados y Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0430	Ent. R.35, Santa Rosa a 1,8 km de R752	Ent. R.752, Santa Rosa Frente a Parque	4	1,2	4	VC	Pocosol			2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial: Cajas de registro, tragantes, cabezales y cunetas	SD Estructura de Pavimento
										2019	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial: Cajas de registro, tragantes, cabezales y cunetas	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0434	Ent. Cam.# 430 Santa Rosa (0,25km R35)	Ent. Cam# 431 Santa Rosa (0,6km R35)	5	0,5	1	4	NCU	Pocosol	18	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0443	Ent. Cam. #193, La Orquídea (2,5km Cam#194)	Lím.Cant.Sn Carlos/Chiles, Colonia París	4	1	1	4	NCU	Monterrey	23	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0446	Ent. Cam.# 445, Las Delicias, Plaza	Fin Camino, finca Los Badilla	4	1,4	4	4	NCU	Monterrey	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0460	Ent. R.142, Fortuna (0,3 km del Cementerio)	Ent. Cam. #64, Alto Monterrey	4	5,6	3	4	NCU	Monterrey	23	2018	Mantenimiento Periódico	MPV	No Aplica	Mantenimiento de puentes vehiculares
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0482	Ent. R.4, San Juan (3,0 km R-734)	Fin Camino, finca La Flor	4	1,6	3	4	NCU	Monterrey	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0502	Ent. R.142, Zeta Trece, Frente a Cementerio	Ent. Cam# 503, (0,2km R-142)	4	0,4	4	4	NCU	Fortuna	26	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0503	Ent. R.142, Zeta Trece (0,10 km Cam#460)	Fin Camino, finca	4	3	4	4	NCU	Fortuna	32	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0505	Ent. C.#65, Agua Azul (4,7 km de R-142)	Fin Camino, finca MauricioCedeño	4	0,5	4	4	NCU	Fortuna	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0507	Ent. C.#65, Agua Azul (2,9 km de R-142)	Fin Camino, finca Jorge Quesada	4	1,2	4	4	NCU	Fortuna	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0508	Ent. R.142, Fortuna (0,2km de R-702)	Ent. C.#65, C,Agua Azul (1,6m de R-142)	4	3,5	4	VC	Fortuna			2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario, Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento, Demarcación horizontal y Vertical, Movimiento de Tierra, ampliación de caminos
										2020				
										2021				
										2022				



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0509	Ent. R.142, Fortuna (1,2km de R-702)	Ent. Cam# 508,C. Agua Azul (1,3km Cam.#65)	4	0,7	4	4	NCU	Fortuna	21	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0511	Calles Urbanas	Zeta Trece, Fortuna	4	0,9	4	4	U	Fortuna	43	2018	Mejoramiento	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0519	Calles Urbanas	Zona Fluca, Fortuna	4	1,45	2	4	U	Fortuna	55	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0522	Ent. Cam# 521, Asentam. Pajuila (0,5km C#75)	Fin Camino, finca Danilo Solano	4	0,4	4	4	NCU	Fortuna	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0546	Ent. Cam# 545, Asentam. La Perla (1,2km R-141)	Fin Camino, finca German Acuña	4	2,3	2	4	VC	Fortuna	25	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No Aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0547	Ent. R.141, La Perla (0,4 km de Cam#545)	Ent. R.141, La Perla (0,5 km de Cam#545)	4	0,5	2	4	NCU	Fortuna	40	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial: Cajas de registro, tragantes, cabezales, Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0549	Ent. Cam.#35, Bonanza (1,1km de R-141)	Fin Camino, finca Oscar Sancho	4	1,2	4	4	NCU	Florencia	24	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0559	Ent. Cam.#31, Cruce La Vega (0,5 km R-141)	Fin Camino, finca Elisa Huertas	4	0,5	4	4	NCU	Florencia	23	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0566	Ent. R.4, San José Cutris (0,4km de Cam#567)	Ent. C#93, C. a San José Cutris (0,1km Cam#565)	4	1,4	4	4	NCU	Cutris	27	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0585	Ent. Cam#584, Asent. Sn Miguel (0,7km Cam#92)	Ent. Cam#584, Asent. Sn Miguel (2,7km Cam#92)	4	0,8	2	4	NCU	Pocosol	25	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0592	Ent. Cam.#91,C. Buenos Aires (0,3km Cam#224)	Fin Camino, Qb. Sin Nombre, Finca Los Bermúdez	4	1,7	4	4	NCU	Pocosol	3	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0601	Ent. Cam.#196, Sn Diego, Costad Oeste Escuela	Fin Camino, Finca Ernestina Sánchez	5	0,5	4	4	NCU	Pocosol	3	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0616	Calles Urbanas	Muelle, Florencia	4	1,6	4	4	U	Florencia	48	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
2-10-0622	Ent. R.4, Entrada La Unión (1,2km Cam#81)	Ent. R.747, Sn Francisco (0,1km R-748)	4	2,68	4	4	NCU	Palmera	33	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0629	Ent. R.4, Cerro Cortés (1,6km Cam#84)	Ent. Cam#627, C. a Cerro Cortés, Fte a Cam#628	4	0,9	4	4	NCU	A.Zarcas	47	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0630	Ent. R.4, Cerro Cortés, Frente a Cam.#629)	Ent. R.4, Cruce a Cerro Cortés (0,9km Cam#84)	4	0,9	4	4	NCU	A.Zarcas	26	2018	Mantenimiento Periódico	MPV	No Aplica	Mantenimiento de puentes vehiculares
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0634	Calles Urbanas	Cerro Cortés	4	0,9	3	4	U	A.Zarcas	48	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0641	Ent. R-749, La Gloria (0,1km Cam.#645)	Ent. Cam#347, C. a Vasconia (1,3km R-750)	4	2,7	3	4	NCU	A.Zarcas	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0650	Ent. R-749, Cruce Santa Fe (2,7km Cam.#649)	Fin Camino, finca Miguel Mejías	4	1,1	2	4	NCU	A.Zarcas	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0651	Calles Urbanas	Santa Fé, Aguas Zarcas	4	2,6	3	4	U	A.Zarcas	43	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0653	Calles Urbanas	Los Llanos Aguas Zarcas	4	0,035	4	4	U	A.Zarcas	43	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
2-10-0655	Ent. R-751, Cruce Los Chiles, A.Z (0,3km R-250)	Fin Camino, finca	4	1,2	3	4	NCU	A.Zarcas	33	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0656	Ent. Cam#655, Cruce Los Chiles (0,85km R-751)	Fin Camino, finca Juan Luis Hernández	4	0,5	3	4	NCU	A.Zarcas	29	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0659	Ent. R-250, Cruce El Pegón (2,6km R-746)	Ent. R-746, Cruce Pegón (0,9km Cam#657)	4	3,5	3	4	NCU	Pital	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0661	Calles Urbanas	Veracruz, Pital	4	1,11	4	U	Pital			2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0662	Ent. R-745, Veracruz, Frente a Redondel	Fin Camino, finca Carlos Rojas	4	1,2	1	4	NCU	Pital	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0663	Ent. Cam.#176, Cruce Veracruz (1,1km R-745)	Fin Camino, Río Toro, Lím.Cant. S.Carlos/Grecia	4	2	4	4	NCU	Pital	33	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0666	Calles Urbanas	La Trinchera, Pital	4	0,3	1	4	U	Pital	37	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0667	Ent. Cam.#176, La Trinchera (1,0km Cam#665)	Fin Camino, finca Rolando Salas	4	2	4	4	NCU	Pital	19	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0668	Ent. R-745, Cruce Sn Luis (2,3km Cam#176)	Fin Camino, finca Inprocsa	4	1,1	2	4	NCU	Pital	39	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0669	Ent. R-745, Cruce Sn Luis (0,9km Cam#668)	Fin Camino, finca Rey Salazar	4	1,3	4	4	NCU	Pital	19	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0670	Calles Urbanas	San Cristóbal, Pital	4	1,2	2	4	U	Pital	35	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0673	Ent. Cam.#56, Coopelsabel, Los Angeles, Plaza	Ent. Cam.#55, Cruce Piedra Alegre (1,3km R-250)	4	3,7	4	4	VC	Pital	36	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0684	Ent. Cam#56, Coopelsabel, Plaza (0,1km Cam#673)	Fin Camino, finca Efrain Méndez	4	1,1	4	4	NCU	Pital	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0687	Ent. Cam.#56, El Encanto (0,9km Cam#686)	Fin Camino, finca Fernando Jiménez	4	0,7	2	4	NCU	Pital	28	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0690	Ent. Cam#59, Cruce 4 Esquinas (0,1km Cam#57)	Ent. Cam#59, Cruce 4 Esquinas (0,7km R-250)	4	0,3	2	4	NCU	Pital	25	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0692	Ent. Cam#57, Cruce El Carmen (2,6km Cam#59)	Ent. Cam.#56, Encanto, Escuela (0,3km Cam#687)	4	1,7	4	4	NCU	Pital	33	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial: Cajas de registro, tragantes, cabezales, Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0699	Ent. Cam#57, Cruce El Carmen (0,3km Cam#692)	Fin Camino, finca Jorge Durán	4	0,9	4	4	NCU	Pital	13	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0701	Ent. Cam#57, Cruce 4 Esquinas (0,3km Cam#59)	Fin Camino, finca Franklin Vargas	4	0,6	4	4	NCU	Pital	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0703	Ent. R-250, 4 esquinas (0,7km Cam#57)	Fin Camino, finca Orlando Lizano Sánchez	4	1,3	4	4	NCU	Pital	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0705	Ent. Cam#60, Puerto Escondido, Cementerio	Fin Camino, finca Gerardo Víquez	4	0,22	4	4	NCU	Pital	31	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0706	Ent. Cam#705, Puerto Escondido (0,6km Cam#60)	Fin Camino, Asentamiento, Quebrada Sn Pedro	4	0,5	2	4	NCU	Pital	31	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0708	Calles Urbanas	Puerto Escondido, Pital	4	1,8	3	4	U	Pital	46	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0709	Calles Urbanas	Barrio El Jardín, Pital	4	1,3	2	4	U	Pital	32	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0713	Calles Urbanas	La Comarca, Pital	4	0,268	4	4	U	Pital	32	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				
2-10-0714	Ent. Cam#52, La Comarca (0,6km R-250)	Fin Camino, finca Maximiliano Arias	4	1,4	3	4	NCU	Pital	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0719	Ent. R-250, Las Delicias (0,4km Cam #718)	Fin Camino, finca Luis Angel González	4	0,6	3	4	NCU	A.Zarcas	29	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0720	Calles Urbanas	Las Delicias, Aguas Zarcas	4	2,244	3	4	U	A.Zarcas	46	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0721	Ent. R-250, Cruce Las Delicias (1km Cam#41)	Fin Camino, finca Marcos Guzmán	4	0,6	3	4	NCU	A.Zarcas	29	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0724	Ent. Cam#41, Pitalito (0,6km Cam#47)	Ent. Cam#147, Cruce Pitalito (0,03km Cam #725)	4	0,3	2	4	NCU	A.Zarcas	25	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0726	Ent. R-250, Cruce Los Chiles (0,3km Cam#40)	Fin Camino, finca Jerusalem	4	0,7	4	4	NCU	A.Zarcas	25	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0728	Ent. R-250, Los Chiles (0,7km Cam #727)	Fin Camino, finca , Quebrada Campamento	4	0,4	3	4	NCU	A.Zarcas	12	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0733	Ent. Cam#47, C. Buenos Aires (0,5km Cam #732)	Fin Camino, finca Olivier Sánchez	4	0,7	3	4	NCU	Venecia	39	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO N°	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0737	Ent. Cam#84, Concepción (1,6 km Cam#736)	Fin Camino, finca Luis Diego Calzada, Calera	4	1,8	3	4	NCU	Palmera	22	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	"Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0739	Calles Urbanas	Concepción, La Palmera	4	1,4	3	4	U	Palmera	40	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	"Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				
2-10-0747	Ent. R-748, Cruce La Palmera (0,5km Cam#85)	Fin Camino, finca Raúl Acuña	4	2,4	1	4	NCU	Palmera	16	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0749	Ent. Cam#85, Cruce La Palmera (Fte a Cam# 748)	Ent. Cam#85, Cruce La Palmera (0,8km Cam#178)	4	0,6	2	4	NCU	Palmera	16	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0750	Ent. Cam#178, C. La Palmera (0,7km Cam# 748)	Fin Camino, finca Coopelesca	4	1,1	3	4	NCU	Palmera	19	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0751	Ent. Cam#178, C. Santa Rosa (0,6km R-748)	Ent. Cam#178, C. Santa Rosa (0,7km Cam#750)	4	2,5	2	4	NCU	Palmera	22	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0752	Ent. Cam#178, C. Santa Rosa (0,3km Cam#751)	Fin Camino, finca	4	1,1	3	4	NCU	Palmera	9	2018	Mejoramiento, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial	Construcción de puentes vehicular, Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0753	Calles Urbanas	Santa Rosa, La Palmera	4	1,224	3	4	U	Palmera	34	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				
2-10-0754	Ent. R-748, Cruce a Snta Rosa (0,15km Cam#85)	Fin Camino, finca Los Arroyo	4	0,2	3	4	NCU	Palmera	29	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	SD Estructura de Pavimento
										2019	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0755	Ent. R-748, Cruce a Snta Rosa (0,1km Cam#754)	Fin Camino, finca Los Arias	4	0,3	2	4	NCU	Palmera	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0757	Ent. R-748, Cruce a Snta Rosa (0,3km Cam#178)	Ent. Cam#14, C.Santa Rosa (0,6km Cam#133)	4	0,9638	3	4	NCU	Palmera	36	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial: Cajas de registro, tragantes, cabezales, Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0758	Ent. Cam#757, Cruce a Snta Rosa (0,2km R-748)	Fin Camino, Río San Rafael	4	1,26	2	4	NCU	Palmera	16	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0759	Ent. Cam#757, C. Snta Rosa (1,3km Cam#758)	Fin Camino, Finca Fernando Chávez	4	0,6	3	4	NCU	Palmera	28	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0763	Ent. Cam#762, Cruce La Loma (0,3km Cam#134)	Fin Camino, finca Hernán Soto	4	1,1	2	4	NCU	Palmera	16	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0764	Ent. R-140, Agua Caliente (0,9km Pte Río Sn Raf.)	Fin Camino, finca Fredy Arroyo	4	1,81	2	4	NCU	Palmera	10	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0766	Ent. Cam#14, C.San Ramón (0,4km Cam#13)	Fin Camino, finca Marvin Porras	4	0,65	4	4	NCU	Quesada	16	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0772	Ent. R-140, Venecia (0,1km Iglesia)	Ent. Cam#52, Corazón de Jesús (0,6km R-140)	4	0,8	3	4	NCU	Venecia	29	2018	Rehabilitación, Mejoramientos	SDC	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2019	Rehabilitación, Mejoramientos	SDC	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0774	Ent. R-250, Cruce Los Chiles, A.Z: (0,1km R-751)	Ent. R-751, Cruce Los Chiles, A.Z. (0,1km R-250)	4	0,2	3	4	NCU	A.Zarcas	35	2018	Rehabilitación, Mejoramientos	SDC	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0776	Calles Urbanas	Urbanización Caporal, Aguas Zarcas	4	0,508	3	4	U	A.Zarcas	40	2018	Rehabilitación, Mejoramientos	CPV	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Construcción de puentes vehicular
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0777	Calles Urbanas	Los Chiles, Aguas Zarcas	4	1,1	4	4	U	A.Zarcas	40	2018	Rehabilitación, Mejoramientos	SDEP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales, Cordón y Caño	SD Estructura de Pavimento
										2019	Rehabilitación, Mejoramientos	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0780	Ent. Cam#54, Cruce a Marsella (0,1km Cam#781)	Ent. Cam#54, Cruce a Marsella (0,3km Cam#779)	4	0,7	2	4	NCU	Venecia	33	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0781	Ent. Cam#54, Cruce a Marsella (0,1km Cam#780)	Fin Camino, Finca Cecilia Mejía	4	0,41	4	4	NCU	Venecia	29	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0784	Ent. R-140, Cruce Marsella (Adjunto Cam#126)	Ent. Cam#54, Cruce Marsella (0,2km R-140)	4	0,4	3	4	NCU	Venecia	26	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0787	Ent. Cam#53, Barrio Jardín (Fte Cam#786)	Fin Camino, Finca Los Herrera	4	0,7	2	4	NCU	Venecia	13	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0794	Ent. Cam#30, C. La Unión (0,7km Cam#148)	Ent. Cam#148, Los Alpes (Fte. Cam#150)	4	0,6	1	4	NCU	Venecia	25	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0806	Ent. Cam#30, La Unión (0,15km Cam#803)	Ent. Cam#117, C. San Juan (0,8km Cam#140)	4	1,5	3	4	NCU	Venecia	28	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0807	Ent. R-140, C. Aguas Zarcas (0,1km Cam#139)	Fin Camino Finca Loma Murillo	4	0,7	3	4	NCU	A.Zarcas	33	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0808	Ent. Cam#138, C. Aguas Zarcas (0,2km R-140)	Ent. Cam#136, C. Garabito (0,2km R-140)	4	0,3	3	4	NCU	A.Zarcas	32	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0810	Ent. Cam#119, Garabito (0,35km Cam#136)	Fin Camino, parque Nacional Juan Castro Blanco	4	1,6	3	4	VC	A.Zarcas	80	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0811	Ent. Cam#119, Garabito (1km Cam#809)	Ent. Cam#810, Garabito (1,2km Cam#119)	4	0,3	3	4	NCU	A.Zarcas	28	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0813	Ent. Cam#42, C. Monte Cristo (0,7km R-140)	Ent. Cam#119, C. Garabito (0,7km R-140)	4	0,6	3	4	NCU	A.Zarcas	16	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0815	Ent. Cam#42, Monte Cristo (Fte a Cam#814)	Fin Camino Finca Los Laguitos	4	0,2	3	4	NCU	A.Zarcas	13	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0816	Ent. Cam#119, C. Aguas Zarcas (0,6km R-140)	Ent. Cam#136, C. Garabito (0,3km Cam#808)	4	0,5	3	4	NCU	A.Zarcas	33	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0818	Ent. R-140, Aguas Zarcas (0,3km Cam#42)	Fin Camino Finca Los Alfaro	4	0,4	3	4	NCU	A.Zarcas	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020				
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
2-10-0821	Ent. Cam#42, C. Monte Cristo (0,75km R-140)	Fin Camino Finca Miriam Alfaro	4	0,3	3	4	NCU	A.Zarcas	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
2-10-0823	Calles Urbanas	Urbanización Monte Oret, San Juan	4	0,9	3	4	U	Quesada	12	2018				
										2019				
										2020				
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
2-10-0827	Ent. Cam#02, Barrio San Pablo (0,7km Cam#001)	Fin Camino Finca Aselmo Rodríguez	5	0,9	1	4	NCU	Quesada	10	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación										



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0832	Ent. Cam#77, C. Call. Buenos Aires(1,1km Cam#830)	Fin Camino Finca Los Viquez	5	0,7	4	4	NCU	La Tigra	3	2018	Mantenimiento Periódico, Mantenimiento rutinario	LTMP	Evacuación Pluvial	Conformación, Lastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0835	Ent. Cam#78, Sn Rafael (0,35km Cam#834)	Fin Camino Finca Arcadio Araya	4	0,9	4	4	NCU	La Tigra	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0836	Ent. R-702, La Tigra (0,1km Cam#78)	Fin Camino Finca Nautilio Guevara	4	0,5	4	4	NCU	La Tigra		2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0846	Ent. Cam#210 Cruce La Lucha (0,9km R-738)	Ent. Cam#845, C. San Miguel (0,9km R-702)	4	1	4	4	NCU	La Tigra	41	2018	Mantenimiento Periódico, Mantenimiento rutinario	LTMP	Evacuación Pluvial	Conformación, Lastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0847	Ent. R-738, C. San Pedro (0,4km Cam#210)	Fin Camino Finca Carlos Rodríguez	4	0,4	4	4	NCU	La Tigra	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0849	Calles Urbanas	La Lucha, La Tigra	4	1,9	4	4	U	La Tigra	21	2018				
										2019				
										2020				
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2022				



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0854	Ent. Cam#152, El Futuro (0,8km Cam#850)	Ent. Cam#207, La Esperanza (0,2km Cam#152)	4	0,7	4	4	NCU	La Tigra	40	2018	Mantenimiento Periódico, Mantenimiento rutinario	LTMP	Evacuación Pluvial	Conformación, Lastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0856	Ent. R-738, San Pedro (0,8km Cam#152)	Fin Camino Finca Cristina Díaz Araya	4	0,646	4	4	NCU	La Tigra	29	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0859	Ent. R-141, Chaparral (0,15km Cam#858)	Fin Camino Finca Venado Cola Blanca	4	1,4	4	4	NCU	Florencia	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0870	Ent. R-141, C. Florencia (1km Cam#25)	Fin Camino, Río Ron	4	0,6	4	4	NCU	Florencia	35	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0874	Ent. Cam#36, Peje Viejo (0,1km Cam#25)	Fin Camino Finca Luis Kooper	4	0,5	4	4	NCU	Florencia	23	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0878	Ent. R-141, Florencia (0,3km R-739)	Ent. R-739, Florencia (0,6km R-35)	4	0,8	4	4	NCU	Florencia	32	2018	Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0890	Ent. R-35, Platanar (0,03km Cam#889)	Fin Camino Finca Juan Santamaría	4	0,605	4	4	NCU	Florencia	39	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial:Cajas de registro, tragantes, cabezales, Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0892	Ent. Cam#28, Dulce Nombre (0,3km Cam#13)	Ent. Cam#28, Dulce Nombre (Fte Cam#891)	4	1,52	2	4	NCU	Quesada	18	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0894	Ent. Cam#893, C. Dulce Nombre (0,7km Cam#131)	Fin Camino Finca Hermanos Rodríguez	4	0,2	4	4	NCU	Florencia	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0895	Ent. Cam#13, C. Dulce Nombre (0,3km Cam#899)	Ent. Cam#28, Dulce Nombre (0,1km. Cam#891)	4	0,9	2	4	NCU	Quesada	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0912	Ent. Cam#217, Dulce Nombre Sur (0,3km Cam#13)	Fin Camino Finca Augusto González	4	0,35	4	4	NCU	Quesada	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0914	Ent. Cam#20, San Luis (0,5km R-141)	Fin Camino Finca Rafa Pérez Parra	4	0,34	4	4	NCU	Florencia	15	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMR	Evacuación Pluvial	Conformación
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0928	Ent. Cam#09, La Abundancia (0,7km Cam#932)	Fin Camino Finca Asentamiento Las Malvinas	4	1,7	4	4	NCU	Quesada	12	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0935	Ent. R-35 Futura Intersección (Fte Cam#933)	Ent. R-35 Futura Intersección (0,1km Cam#936)	4	1,1	2	4	NCU	Quesada	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0939	Calles Urbanas	Sucre, Ciudad Quesada	4	0,9	4	4	U	Quesada	48	2018				
										2019				
										2020				
										2021	Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2022	Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
2-10-0947	Calles Urbanas	Barrio Los Angeles, Ciudad Quesada	4	1,55		4	U	Quesada		2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
2-10-0958	Ent. R-250, Los Chiles (0,3km Cam#726)	Fin Camino Finca Joaquín Jiménez	4	0,5	3	4	NCU	A.Zarcas	23	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0961	Ent. R-142, La Palma, (1,4km. Cam#499)	Ent. Cam # 64, La Torre, Frente Cam # 88	4	0,493	3	4	NCU	Fortuna	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0962	Ent. RN-141 San Roque (fte cam # 932)	Ent. Cam # 001 Calle del Amor (a 450 m Cam # 002)	4	0,617	4	4	VC	Quesada	62	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0963	(ENT N 739) Penjamo	(ENT C 878) Florencia	5	1,3	4	4	NCU	Florencia	29	2018	Mantenimiento rutinario	LTMR	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0978	(Ent.C.977) Cruce San Cristobal X:445562,62 Y: 1195736,52	(Ent.C.261) Cruce Escuela San Cristobal X:442746,51 Y: 1196454,87	5	0,8	1	4	NCU	Pocosol	18	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0982	Calles Urbanas	Cuadrantes Antiguo Refugio	4	1,7	2	4	U	Pocosol	100	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0985	(Ent.N.752.) San Bosco X:437245,18 Y: 1175819,41	Fin Camino X:437597,07 Y: 1175302,15	5	0,7	1	4	NCU	Pocosol	24	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0999	CALLES URBANAS CUADRANTES.	CUADRANTES Coopevega	4	2,6	4	4	U	Cutris	100	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial: Cajas de registro, tragantes, cabezales	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO N°	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1004	CALLES URBANAS CUADRANTES.	CUADRANTE San Bosco	4	1,4	3	4	U	Pocosol	13	2018				
										2019				
										2020				
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2022				
2-10-1005	CALLES URBANAS CUADRANTES.	CUADRANTE Viento Fresco	4	0,8	3	4	U	A.Zarcas	100	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial: Cajas de registro, tragantes, cabezales, Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-1017	(ENT C 458) FINCA LA MINA	Fin de camino, propiedad privada	5	1,4	3	4	NCU	Venado	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1018	CALLES URBANAS CUADRANTES.	CUADRANTES Union	4	1,5	4	4	U	Monterrey	100	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-1021	CALLES URBANAS CUADRANTES.	CUADRANTE Managuita	4	0,3	3	4	U	A.Zarcas	100	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-1024	(ENT N 140) San Cayetano	(ENT C 052) Guayabo	4	1,1	3	4	VC	Venecia	53	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-1025	(Ent C 460) La Guaría, Quebrada Platanilla	Fin camino en Quebrada Guillermina	4	1,3	4	4	NCU	Fortuna	27	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-1027	(ENT N 141) RON ABAJO	(ENT C 215) Santa Clara	4	1,8	2	4	NCU	Florencia	30	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1037	(ENT N 739) Penjamo	Fin camino Privado, Plantacion de fenix	4	0,9	4	4	NCU	Florencia	50	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1039	(ENT N 739) Penjamo	Fin camino Privado, Monte Carmelo	4	1	4	4	NCU	Florencia	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1043	(ENT C 013) Cedral Norte	Fin Camino, Propiedad Privada	4	0,8	4	4	NCU	Quesada	43	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1051	(ENT N 030) Los Negritos	Fin camino Propiedad Privada Finca Albina Rodríguez Céspedes	4	0,14	3	4	NCU	Venecia	35	2018				
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022				
2-10-1053	(ENT N 702) Tigra	Fin Camino, Propiedad Privada	4	0,2	1	4	NCU	La Tigra	12	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1059	(ENT N 140) Aguas Zarcas	Fin Camino, Propiedad Privada	4	0,8	3	4	VC	A.Zarcas	56	2018	Rehabilitación, Mejoramientos	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado,	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-1061	(ENT C 238) Quebrada Palo (San Juan)	Fin Camino, Quebrada Sin Nombre	4	0,4	2	4	NCU	Quesada	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1063	(ENT N 140) San Juan	Fin Camino, Propiedad Privada	4	0,5	1	4	NCU	Quesada	36	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1066	(ENT C 1065) Linda Vista	Fin Camino, Propiedad Privada	4	0,6	4	4	NCU	Quesada	50	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-1087	CALLES URBANAS CUADRANTES.	CUADRANTES URBANIZACION LOS LC	4	0,4	4	4	U	Pital	100	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				

2-10-1088	(ENT N 702)LA TIGRA	(ENT C 079)CAMINO BOSQUE ETERNO DE LOS NIÑOS	4	0,9	3	4	NCU	La Tigra	39	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1089	(ENT N 702) LA TIGRA	(ENT N 1088) LA TIGRA	5	0,3	1	4	NCU	La Tigra	21	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-1094	(ENT C 040) Concepcion	Fin de camino, Propiedad Privada	4	0,9	3	4	NCU	A.Zarcas	33	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1096	(ENT C 042) Altos Jimenez	Fin Camino, Servidumbre de paso	5	0,2	1	4	NCU	A.Zarcas	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-1097	(ENT C 042) Alto Jimenez	Fin de Camino, Quebrada Ahogada	4	0,3	1	4	NCU	A.Zarcas	23	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1104	(ENT N 751) Chiles	Fin camino, Propiedad Privada	4	0,3	3	4	NCU	A.Zarcas	40	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1115	(Ent C 416) Acapulco	Fin de Camino, Propiedad Privada	4	0,8	1	4	NCU	Pocosol	20	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0019	Ent. R.141, Puente Casa, Escuela (1,3km Cam#13)	Ent.Camino #217, Cruce San Luis(1,1km Cam#20)	5	0,9	1	1	NCU	Florencia	23	2018	Mantenimiento rutinario	LTMR	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0024	Ent. Cam. #22, C. Sn Francisco (0,7km R-35)	Fin de Camino, Finca Francisco Campos	5	0,5			NCU	Florencia		2018	Mantenimiento rutinario, Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Conformación
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0376	Ent. R.227, Sn Joaquín, Iglesia	Fin Camino, Parcelas Sn Joaquín	4	2,6	5	5	NCU	Cutris	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0037	Ent. Cam. #122, La Culebra, B.Vista (1,8km Cam#9)	Ent. Cam. #122, Cruce La Vieja (0,1km Cam#121)	5	1,3		2	NCU	Buena Vista		2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0038	Ent. Cam. #122, Buena Vista (1,0km Cam#39)	Fin de Camino, Finca Orlando Lizano	5	0,674		2	NCU	Buena Vista		2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0043	Ent. Cam. #106, La Ceiba	Fin Camino, Río Poco Sol, Coquitales, La Aldea	5	0,8	3	3	VC	Pocosol	27	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0080	Ent. R-702, La Tigra (0,3km Cam#839)	Fin camino, finca Bosque Eterno de los Niños	5	0,753	2	VC	La Tigra		2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Conformación, Lastrados	
									2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación	
									2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación	
									2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados	
									2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación	
2-10-0102	Ent. Cam.# 100, La Luisa	Ent. Cam.# 106, Cruce San Rafael	5	1,09	2	2	VC	Pocosol	60	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0103	Ent. Cam.# 063, Cruce a Coopevega	Sn Vito, Ent. Cam.# 063, El Carmen	5	4,7	1	1	NCU	Cutris	22	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0104	Ent. R227, Moravia, Crucitas (Se convirtio 3.95 Km. en la RN 961, según oficio DR-HN-28-2013-0121).	Fin Camino, Campo Pocosol, (Escuela), 4 Esquinas	5	26,5	1	2	VC	Pocosol	42	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0105	Ent. Cam.# 104, La Guaria, 4 esquinas	Fin de Camino, Finca de Pollo	5	3	1	1	NCU	Pocosol	7	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0107	Ent. Cam. #106, San Rafael, (a 2km del centro)	Ent. Cam. #106, San Rafael, Escuela	5	1	1	1	NCU	Pocosol	22	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0109	Ent. Cam.# 185, Cruce a Jardín	Fin camino, El Recreo, Río Sn Carlos	5	6,9	1	2	NCU	Pocosol	22	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0123	Ent. Ruta # 227, Coopevega	Fin Camino, Río San Carlos, Cascada	5	10,3	3	3	VC	Cutris	41	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0140	Ent. R.140, Los Negritos (0,1km Cam#30)	Fin Camino, Finca Andres Garita	5	1			NCU	Venecia		2018	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022				



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0184	Ent. R.227, Entrada a San Luis	Ent. R.227, Cruce a Morazán (0,2km Cam#379	5	3,6	3	2	NCU	Pocosol		2018	Mantenimiento Periódico, Mejoramiento	LTMP	No aplica	Construcción de puentes vehicular, Lastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación

2-10-0189	Ent. R.753, Betania	Fin Cam., Río Sn Carlos, Vuelta El Cubano	5	8,14	1	1	NCU	Cutris	13	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0190	Ent. R.227, Coopevega	Ent. Cam.#199, Infiernito	5	11	1	2	NCU	Cutris	7	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0201	Ent. Cam.# 104, Cuatro Esquinas	Ent. Cam.# 106, Carrizal	5	2,7		2	VC	Pocosol		2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0203	Ent. Cam.#104, Cruce Chamorro, Crucitas	Fin de Camino, finca	5	3,5	1	1	NCU	Pocosol	13	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0219	Ent. Cam.#202, La Esperanza	Fin de camino, finca Parra	5	3,66	2	3	NCU	Pocosol	19	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0224	Ent. Cam.#91, Buenos Aires (1,1km R-35)	Sn Isidro, Fin camino, Finca La Margarita	5	0,9			NCU	Pocosol	16	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0232	Ent. Cam.# 008, C. Bajo la Vieja (0,05km Cam#233)	Reserva Forestal, cruce Pozo Verde	5	1			NCU	Quesada	18	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0241	Ent. Cam.#104, Cruce a Sn Isidro	Fin de Camino, Frontera Norte, Est.3-5A	5	2,6	1	2	NCU	Pocosol	3	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0243	Ent. Cam.#203, Crucitas	Fin de Camino, Las Minas, Ind. Infinito	5	1,2	1	1	NCU	Pocosol	3	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación

2-10-0245	Ent. Cam.#106, Escuela Azucena	Fin de Camino, Azucena	5	0,8	1	2	NCU	Pocosol	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación

2-10-0247	Ent. Cam.#104, Cruce a Jocote	Ent. Cam.#200, Cruce La Guaria	5	4,3	1	3	NCU	Pocosol	3	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0248	Ent. Cam.#106, Concho	Ent. Cam.#200, Cruce a Azucena	5	7,3	1	3	NCU	Pocosol	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0249	Ent. Cam.#187, Cruce Chamorro	Fin de Camino, El Roble, Río Sn Juan	5	7,64	3	3	VC	Cutris	29	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0250	Ent. Cam.#123, Cruce Cascada, Sn Francisco	Ent. Cam.#185, Cruce a Jardín	5	7,15	1	2	NCU	Cutris	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0251	Ent. Cam.#103, San Vito	Ent. Cam# 250, Patastillo, Sn Francisco.	5	1,45	1	3	NCU	Cutris	15	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0254	Ent. Cam.# 102, San Rafael, Cementerio	Ent. Cam.#202, Pueblo Nuevo	5	1,35	1	3	NCU	Pocosol	15	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0254	Ent. Cam.# 102, San Rafael, Cementerio	Ent. Cam.#202, Pueblo Nuevo	5	1,7	1	3	NCU	Cutris	15	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0255	Ent. Cam.#202, Cruce La Esperanza	Fin Camino, finca los Porras	5	1,2	1	3	NCU	Pocosol	9	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0256	Ent. Cam.#201, Banderas	Fin Camino, finca Faustino Campos	5	0,3	1	2	NCU	Pocosol	15	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0259	Ent. Cam.#204,Cruce Sn Cristóbal	Fin Camino, finca Jorge Alfaro	5	0,32	1	2	NCU	Pocosol	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0260	Ent. Cam.#204,Cruce Sn Cristóbal	Ent. Cam.#43, La Aldea	5	6,3	1	3	NCU	Pocosol	15	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0261	Ent.Cam.#204,Cruce Sn Cristóbal	Ent. Cam #260, Vieja Aldea	5	0,7	1	2	NCU	Pocosol	15	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0262	Ent. Cam.#204,Cruce Sn Cristóbal	Fin Camino, finca Luis Céspedes	5	3,08	1	2	NCU	Pocosol	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0263	Ent. Cam.#262, 4 esquinas	Fin Camino, finca Los Guardias	5	1,4	1	2	NCU	Pocosol	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0264	Ent. Cam.#204,Cruce Sn Cristóbal	Fin Camino, finca Arnoldo Valerio	5	1,3	1	2	NCU	Pocosol	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0267	Ent. Cam.#201, Cruce Banderas	Ent. Cam.#204, Cruce a Banderas	5	1,5	1	1	NCU	Pocosol	15	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0268	Ent. Cam.#201, Cruce Banderas	Fin Camino, finca	5	0,3	1	1	NCU	Pocosol	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0269	Ent. Cam.#106, Cruce Carrizal	Fin Camino, finca	5	0,6	1	1	NCU	Pocosol	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0414	Ent. R.35, Santa Rosa (a 0,8km de R752)	Fin Camino, finca Luis Paulino	1	0,7	5	5	NCU	Pocosol	37	2018				
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0270	Ent. Cam.#108, San Alejo	Fin Camino, finca Keylor Arroyo	5	0,7	1	2	NCU	Pocosol	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0272	Ent. Cam.#108, San Alejo	Fin Camino, finca	5	0,5	1	2	NCU	Pocosol	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0273	Ent. Cam.#204, San Critóbal (0,05km Cam#261)	Fin Camino, finca Morojú	5	0,3	1	1	NCU	Pocosol	3	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0277	Ent. Cam.#276, El Carmen, Río Sn Juan	Fin Camino, finca	5	0,6	1	3	NCU	Cutris	3	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0278	Ent. Cam.#187, El Carmen Escuela	Fin Camino, finca, camino viejo Chamorro	5	1,7	1	3	NCU	Cutris	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0279	Ent. Cam.#250, Jardín-Patastillo	Fin Camino, Río Sn Carlos, Fte a Boca.Tapad.	5	10,4	2	3	NCU	Cutris	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0280	(Ent.C.103) San Vito X:465681,28 Y: 1187707,31	(Ent.C.250) Palma X:467862,84 Y:1185419,56	5	4,5	1	3	NCU	Cutris	22	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0285	Ent. Cam.#123, Cruce Coopevega	Fin Camino, finca	5	0,4	1	3	NCU	Cutris	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0286	Ent. R.227, Coopevega	Fin Camino, finca Dago Chávez	5	3,1	1	3	NCU	Cutris	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0288	Ent. R.227, Cocobolo	Fin Camino, Río Infiernito	5	4	1	3	NCU	Cutris	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0290	Ent. Cam.#173, Casalata	Lím. Prov. Alajuela/Heredia	5	0,5	1	3	NCU	Pital	15	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0291	Ent. R.250, Hda.Tres Amigos	Fin Camino, finca Rumidio (Ojoche)	5	3,2	1	3	NCU	Pital	9	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0294	Ent. Cam#293, Ojochito	Fin Camino, finca	5	2,5	1	3	NCU	Pital	6	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0295	Ent. Cam.#174, Cruce Los Almendros	Fin Camino, finca Euleterio Mairena	5	0,7	1	2	NCU	Cutris	12	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0301	Ent. Cam.# 299, Sahino	Fin Camino, finca La Rita	5	0,7	1	2	NCU	Pital	18	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0307	Ent. R.745, Cruce Veracruz	Ent. Cam# 299, Las cabras-Sn Marcos	5	11,27	1	3	NCU	Pital	23	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0308	Ent. Cam.# 55, Piedra Alegre	Fin Camino, finca Pika	5	0,3	1	1	NCU	Pital	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0309	Ent. Cam.# 55, Piedra Alegre	Fin Camino, Quebrada Pital	5	1,5	1	2	NCU	Pital	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0310	Ent. Cam.# 55, Piedra Alegre	Fin Camino, finca Hernán Quesada	5	0,9	1	1	NCU	Pital	9	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0311	Ent. Cam.# 55, Piedra Alegre	Fin Camino, finca Los Salas	5	0,8	1	1	NCU	Pital	9	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0430	Ent. R.35, Santa Rosa a 1,8 km de R752	Ent. R.752, Santa Rosa Frente a Parque	1	0,8	5	4	VC	Pocosol	41	2018	Rehabilitación, Mantenimiento rutinario	BA	No aplica	Demarcación horizontal y Vertical, Bacheo en Asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0312	Ent. Cam.# 55, Piedra Alegre	Fin Camino, Río Tres Amigos	5	2	1	1	NCU	Pital	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0431	Ent. R.35, Santa Rosa a 1,3 km de R752	Ent. R.752, Santa Rosa Frente a Parque	1	0,33	5	5	VC	Pocosol	49	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Rutinario	SDEP	Evacuación Pluvial; Tubos de concreto alcantarillado	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
2-10-0313	Ent. Cam.# 55, Piedra Alegre	Fin Camino, finca Diego Monge	5	1,1	1	1	NCU	Pital	9	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0315	Ent. R.250, Cruce a Sahino	Fin Camino, Río Sahino, Parcela Agripa	5	0,8	1	2	NCU	Pital	12	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0316	Ent. R.250, Puente Río Sahino	Fin Camino, finca Luis Pérez	5	0,3	1	2	NCU	Pital	23	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0317	Ent. R.250, Sahino	Fin Camino, finca, Quebrada Gavilán	5	0,4	1	2	NCU	Pital	9	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0435	Ent. Cam#430 Asentamiento Sta Rosa (0,7km R35)	Ent. Cam#430 Asentam. Sta Rosa (0,8km R35)	4	0,3	5	3	NCU	Pocosol	46	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0318	Ent. R.250, Quebrada Gavilán	Fin Camino, finca	5	0,3	1	2	NCU	Pital	9	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	EPCA	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0437	Ent. R.752, Santa Rosa (0,4km del Parque)	Ent. Cam. #197, C. Nieves, Frente Cementerio	1	1,36	5	5	NCU	Pocosol	38	2018	Mantenimiento Rutinario	SDEP	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
2-10-0319	Ent. Cam.# 175, El Palmar	Fin Camino, finca Hermanos Castro	5	0,4	1	2	NCU	Pital	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0438	Ent. R.35, Santa Rosa a 0,5 km de R752	Ent. R.752, Santa Rosa (0,2km del Parque)	1	0,45	5	5	NCU	Pocosol	43	2018	Mantenimiento Rutinario	SDEP	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario	SDRC	No aplica	Recarpeteo
										2022	Mantenimiento Rutinario	SDRC	No aplica	Recarpeteo
2-10-0320	Ent. Cam.# 175, El Palmar, Plaza	Fin Camino, Río Sahino	5	0,7	1	2	NCU	Pital	23	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0321	Ent. Cam.# 175, El Palmar, Iglesia	Fin Camino, finca Umañas	5	2	1	3	NCU	Pital	9	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0323	Ent. Cam.# 307, San Marcos	Fin Camino, finca Liuver Mena	5	2,7	1	1	NCU	Pital	9	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0324	Ent. Cam. #111, Cruce Almendros	Ent. Cam.#169, Cruce Coopesanjuan	5	1,7	1	3	NCU	Cutris	15	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMJ	"Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado"	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0326	Ent. Cam. #111, Cruce Almendros	Fin Camino, Intransitable	5	0,7	1	3	NCU	Cutris	0	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0328	Ent. Cam. #97, Bella Vista	Fin Camino, finca	5	2,3	1	1	NCU	Cutris	9	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0333	Ent. Cam.# 332, Pueblo Nuevo.	Fin Camino, finca	5	1,6	1	1	NCU	Cutris	0	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0338	Ent. R.753, San Marcos, Escuela	Fin Camino, finca Los Magón	5	0,7	1	3	NCU	Cutris	13	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0339	Ent. Cam. #111, San Marcos	Fin Camino, finca Lizano	5	0,4	3	3	NCU	Cutris	9	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0340	Ent. R.753, San Marcos	Fin Camino, finca.... Río San Carlos	5	1,1	3	3	NCU	Cutris	12	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0343	0	Fin Camino, finca	5	0,3	1	2	NCU	Cutris	0	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0349	Ent. Cam.# 346, Bella Vista	Fin Camino, finca Reforestada	5	1,12	1	3	NCU	Cutris	3	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0352	Ent. Cam.# 351, Bella Vista	Fin Camino, finca Raul	5	0,5	1	1	NCU	Cutris	9	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0359	Ent. R.35, Acapulco, Salón comunal	Ent. Cam. #101, Las Brisas, (1,4km cement.)	5	2,7	1	3	NCU	Pocosol	12	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0360	Ent. Cam.# 359, Cruce a Acapulco	Fin Camino, finca Reforestada	5	0,7	1	1	NCU	Pocosol	15	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0365	Ent. Cam. #107, Cruce a Sn Rafael	Fin Camino, finca	5	0,3	1	1	NCU	Pocosol	9	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0367	Ent. Cam. #101, Las Brisas, (a 0,6km Esc.)	Fin Camino, finca	5	1	1	3	NCU	Pocosol	9	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0368	Ent. Cam. #102, El Plomo	Ent. Cam. # 372, Cruce a Sn Joaquín (2km R227)	5	4,25	1	3	NCU	Pocosol	18	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0370	Ent. Cam. # 369, Parcelas el Plomo	Fin Camino, finca	5	0,54	1	1	NCU	Pocosol	12	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0371	Ent. Cam. #102, Cruce a El Plomo	Ent. Cam. # 370, Parcelas el Plomo	5	2,1	1	3	NCU	Pocosol	12	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0374	Ent. Cam. #202, Cruce a Pueblo Nuevo	Fin Camino, finca La Escondida	5	0,3	1	2	NCU	Pocosol	9	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0375	Ent. Cam.# 372, Cruce a Sn Joaquín	Fin Camino, finca	5	1,24	1	1	NCU	Pocosol	9	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0377	Ent. Cam.# 376, Parcelas Sn Joaquín	Ent. Cam.# 372, (a 0,5km R227)	5	0,66	1	1	NCU	Cutris	9	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0378	Ent. R.227, Sn Joaquín, Iglesia	Ent. Cam.# 377, Sn Joaquín	5	0,7	1	1	NCU	Cutris	15	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0379	Ent. R.227, Morazán (a 2,2km de cam#186)	Ent. R.227, Cruce a San Joaquín	5	3,7	1	1	NCU	Cutris	23	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0380	Ent. Cam. #186, Laurel Galán	Fin Camino, finca	5	1,4	1	1	NCU	Cutris	9	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0381	Ent. Cam.# 380, Cruce a Laurel Galán	Fin Camino, Intransitable, puente caído	5	0,5	1	1	NCU	Cutris	9	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0382	Ent. Cam. #186, Cruce a Laurel Galán	Fin Camino, finca	5	1,3	1	1	NCU	Cutris	9	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO N°	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0387	Ent. Cam. #100, La Luisa (a 2km de plaza)	Ent. Cam# 379, Cruce a Morazán	5	3,58	1	1	NCU	Pocosol	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
2-10-0389	Ent. Cam. #184, San Luis (a 2,1km de R227)	Fin Camino, finca Fernando Rojas	5	0,5	1	1	NCU	Pocosol	9	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0391	Ent. Cam.# 390, C.a Sn Luis,(1,5km C184)	Fin Camino, finca Los Vargas	5	0,7	1	2	NCU	Pocosol	9	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0392	Ent. Cam.# 390, C.a Sn Luis,(1,4km C184)	Fin Camino, finca Hacienda Diez Letras	5	1,52	1	1	NCU	Pocosol	9	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0393	Ent. Cam.# 390, C.a Sn Luis,(0,6km C184)	Fin Camino, finca Blanca Mora Barrantes	5	1,9	1	1	NCU	Pocosol	9	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0396	Ent. Cam. #100, La Luisa, Plaza	Ent. # 394, Parcelas El Edén (0,4 km R227)	5	1	3	3	NCU	Pocosol	9	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0400	Ent. R.35, Cruce a Nieves (a 0,6km de Plaza)	Ent. R.227, Buenos Aires (a 1,8km de R35)	5	0,95	1	1	NCU	Pocosol	15	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0401	Ent. Cam.# 400, C. a Nieves(a 1,2km R35)	Fin Camino, finca	5	0,66	1	1	NCU	Pocosol	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0403	Ent. Cam.# 387, La Luisa, (2,2km Cam#100)	Fin Camino, finca Edwin Pérez	5	0,83	2	2	NCU	Pocosol	9	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0411	Ent. Cam.# 410, C. Snta Rosa(0,8km R35)	Fin Camino, finca	5	0,14	1	1	NCU	Pocosol	9	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0415	Ent. R.35, Santa Rosa (a 0,1km de R752)	Ent. Cam #414, Bª Jazmín (0,5km R35)	5	0,1	1	3	NCU	Pocosol	18	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0417	Ent. R.35, Cruce a Acapulco (0,4km R.Pocosol)	Ent. Cam#222, C. Juanilama (2.4km R35)	5	4,112	1	3	NCU	Pocosol	26	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0420	Ent. Cam. #222, Juanilama (1,5km R752)	Ent. Cam# 417, Esc. Juanilama (0,8km Cam.#222)	5	2,98	1	3	NCU	Pocosol	18	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0421	Ent. Cam# 420 Juanilama (0,5km Cam#417)	Fin Camino, finca	5	0,4	1	1	NCU	Pocosol	12	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0422	Ent. Cam# 420 Juanilama (0,5km Cam#222)	Fin Camino, finca Carlos Monge	5	0,5	1	1	NCU	Pocosol	12	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0423	Ent. Cam. #222, Sn Martín (0,3km R752)	Fin Camino, finca Carlos Quesada	5	0,5	1	1	NCU	Pocosol	12	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0425	Ent. Cam. #17, Cruce a Tres y Tres (0,7km R35)	Ent. Cam. #195, C. Juanilama (2,3km R752)	5	1,4	1	3	NCU	Pocosol	18	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0429	Ent. Cam. #17, Cruce a Tres y Tres, (0,5km R35)	Fin Camino, finca Walter Corrales	5	0,8	1	1	NCU	Pocosol	12	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0440	Ent. R.752, Sn Martín (0,6km Cam# 222)	Fin Camino, finca Carlos	5	0,5	1	1	NCU	Pocosol	12	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0441	Ent. R.752, Sn Bosco (1,5km Cam# 112)	Fin Camino, finca Hernán Arias	5	0,5	1	1	NCU	Pocosol	9	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0442	Ent. Cam. #112, Sn Bosco, Esc.(0,1km R752)	Ent. Cam#112, Sn Bosco, Pulp.(0,2km R752)	5	0,6	1	1	NCU	Pocosol	15	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0443	Ent. Cam. #193, La Orquídea (2,5km Cam#194)	Lím.Cant.Sn Carlos/Chiles, Colonia Paris	5	2,1	1	1	NCU	Monterrey	23	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0444	Ent. R.752, Cruce a Chabacú (3,0km Plaza)	Ent. Cam. #193, Chabacú (0,3 km R752)	5	3,3	1	1	NCU	Monterrey	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0447	Ent. Cam. #195, C. Tres y Tres (0,5km Cam.# 425)	Ent. Cam.#223, Pte R. Pocosol (0,8km Cam.#222)	5	0,8	1	1	NCU	Pocosol	15	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0448	Ent. R.734, Banca Lucia (1,4km Cam#221)	Fin Camino, Finca Coopetilas R.L.- MINAE	5	0,3	1	1	NCU	Venado	9	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0454	Ent. R.734, La Cavernas (1,4 km Cam# 181)	Fin Camino, Río La Muerte	5	1,9	3	3	NCU	Venado	9	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0457	Ent. Cam. #86, Venado (0,7 km R-734)	Fin Camino, Intransitable, parcelas las Minas	5	0,5	1	1	NCU	Venado	9	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y

2-10-0466	Ent. R.734, Cruce Jicarito (2,4 km R-004)	Fin Camino, finca Felicindo Cubero	5	1,5		3	NCU	Venado	9	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0471	Ent. Cam. #89, Sabalito (3,5 km R-04)	Fin Camino, finca Los Pérez	5	1,4	3	3	NCU	Monterrey	9	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0474	Ent. Cam. #89, Sabalito (1,3 km Escuela)	Fin Camino, finca Efraín Méndez, Río Pataste	5	0,4	1	1	NCU	Monterrey	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0485	Ent. Cam# 484, San Juan (1,6 km R-04)	Fin Camino, Río Pataste	5	0,6	1	1	NCU	Monterrey	0	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0489	Ent. R.4, San Antonio (0,6 km R-752)	Ent. Cam. #89, C. San Antonio (0,2 km R-04)	5	0,61	2	3	NCU	Monterrey	21	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0491	Ent. Cam# 490, Alto Monterrey (2,6km Cam#64)	Fin Camino, finca, Asentamiento el Niño	5	2,4	1	1	NCU	Monterrey	12	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0492	Ent. Cam# 490, Alto Monterrey (1,2km Cam#64)	Fin Camino, finca	5	0,5	2	2	NCU	Monterrey	12	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0493	Ent. Cam. #64, Alto Monterrey (0,1km Cam#460)	Fin Camino, finca	5	0,4	2	2	NCU	Monterrey	0	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0494	Ent. Cam. #64, Alto Monterrey (0,3km Cam#460)	Fin Camino, Río Pataste (Intransitable)	5	2,4	1	1	NCU	Monterrey	9	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
2-10-0516	Ent. R-4, Mirador (1,9 km de Cam.#113)	Ent. R-4, Cruce Los Cedros(1,5 km de Cam.#90)	5	1,8		2	NCU	Monterrey		2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0530	Ent. Cam.#72, Zona Fluca (0,5km de R-141)	Fin Camino, finca Homero	5	0,4	1	1	NCU	Fortuna	29	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0533	Ent. R.142, Cruce El Tanque (1,4km de R-4)	Ent. Cam.# 532, Cruce Fortuna (0,2km R-142)	5	0,8	1	1	NCU	Fortuna	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0535	Ent. R.4, Cruce Sn Jorge (2,4km de R-142)	Ent. R.142, Cruce El Tanque (1,4km de R-4)	5	2	1	1	NCU	Fortuna	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0573	Ent. Cam#571, La Unión (0,2km Cam#192)	Fin Camino, finca	5	0,46	1	1	NCU	Monterrey	10	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0575	Ent. R.752, Chambacú (0,7km Cam#90)	Fin Camino, Quebrada Guayabo	5	1,5	1	2	NCU	Monterrey	27	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0577	Ent. Cam.#92, San Miguel (3,1km Cam#576)	Fin Camino, finca	5	1,4	1	1	NCU	Pocosol	7	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0578	Ent. Cam.#92, C. San Miguel (1,7km Cam#577)	Fin Camino, Quebrada Esterito	5	0,7	1	1	NCU	Pocosol	7	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0582	Ent. Cam.#92, C. San Miguel (0,4km Cam#578)	Ent. Cam#581, Cruce Esterito (2,2km Cam#92)	5	3,6	1	1	NCU	Pocosol	13	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0584	Ent. Cam.#92, C. Terrón Colorado (0,7km R-35)	Fin Camino, finca Los Lobo	5	1,8	2	2	VC	Pocosol	22	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0586	Ent. Cam.#224,C. Buenos Aires (0,3km Cam#91)	Ent. Cam#584, Asent. Sn Miguel (1,9km Cam#92)	5	0,52	1	1	NCU	Pocosol	25	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0589	Ent. Cam.#224, Sn Isidro (1,9km Cam#91)	Fin Camino, Quebrada Estero	5	1,5	1	1	NCU	Pocosol	3	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0590	Ent. Cam.#224,C. Buenos Aires (0,2km Cam#91)	Fin Camino, Finca Nelsón González	5	0,7	2	3	NCU	Pocosol	13	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0598	Ent. Cam.#91,C. Santa Rosa (0,1km Cam #196)	Fin Camino, Finca	5	0,4	1	1	NCU	Pocosol	7	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0600	Ent. Cam.#196, C. San Diego (2,4km Cam#91)	Fin Camino, Finca	5	0,3	1	1	NCU	Pocosol	3	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0604	Ent. Cam.#197, C. Las Nieves (0,3km R-35)	Fin Camino, Finca	5	0,2	1	1	NCU	Pocosol	20	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0606	Ent. Cam.#91,Plaza Buenos Aires (0,6km R-35)	Fin Camino, Finca Tobías Villegas	5	0,01	1	1	NCU	Pocosol	9	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0612	Ent. Cam.#96, Cruce aBoca Arenal (1,5km R-35)	Fin Camino, Finca	5	0,3	1	1	NCU	Cutris	10	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0613	Ent. R-35, Santa Elena (3,3km Cam#96)	Fin Camino, Río San Carlos	5	0,8	1	1	NCU	Cutris	7	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0615	Ent. Cam.#95, Corazón de Jesús (1,3km R-751)	Fin Camino, Finca	5	0,6	2	3	NCU	Cutris	10	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0624	Ent. Cam#621, Cruce a Muelle (0,3km R-4)	Ent. Cam#625, Cruce a Unión (0,5km Cam#622)	5	2,1	1	1	NCU	Palmera	22	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0648	Ent. R-749, Cruce La Gloria (0,7km Cam.#647)	Fin Camino, Río Tres Amigos	5	1,4	1	1	NCU	A.Zarcas	10	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0649	Ent. R-749, Cruce La Gloria (1,4km Cam.#648)	Fin Camino, finca Santa Fe	5	1,5	2	3	NCU	A.Zarcas	16	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO N°	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0662	Ent. R-745, Veracruz, Frente a Redondel	Fin Camino, finca Carlos Rojas	5	0,6	1	3	NCU	Pital	9	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0688	Ent. Cam#58,Cruce Los Angeles (0,6km Cam#56)	Fin Camino, finca	5	0,7	1	1	NCU	Pital	13	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0695	Ent. Cam#56, Los Angeles (0,7km Cam#58)	Fin Camino, finca	5	0,6	1	3	NCU	Pital	3	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
2-10-0704	Ent. Cam#60, Cruce 4 Esquinas (1,0km R-250)	Fin Camino, finca Tulio Chacón	5	0,5	1	1	NCU	Pital	13	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0716	Ent. R-250, Cruce Las Delicias (2km Cam#60)	Ent. Cam#41, Pitalito (0,8km Cam#47)	5	3,1			NCU	A.Zarcas	22	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICIÓN DRENAJE	CONDICIÓN SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0736	Ent. Cam#84, Cement. Palmera (0,5km R-748)	Fin Camino, finca Raúl Acuña	5	0,4	1	1	NCU	Palmera	16	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0741	Ent. R-747, Cruce a Sn Fco. (0,40km Cam#623)	Fin Camino, finca Elías Villegas	5	0,4	1	1	NCU	Palmera	13	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación, Mejoramiento	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Movimiento de Tierra, ampliación de caminos, Lastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0758	Ent. Cam#757, Cruce a Snta Rosa (0,2km R-748)	Fin Camino, Río San Rafael	5	0,8		2	NCU	Palmera		2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0766	Ent. Cam#14, C.San Ramón (0,4km)	Fin Camino, finca Marvin Porras	5	0,85	1	3	NCU	Quesada	16	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0768	Ent. Cam#166, Cruce Sn Ramón (0,6km Cam#14)	Fin Camino, finca Sara Castillo	5	0,7	1	1	NCU	Quesada	16	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
2-10-0769	Ent. Cam#768, Cruce Sn Ramón (0,1km Cam#166)	Fin Camino, finca Juan Chávez	5	0,2	1	1	NCU	Quesada	16	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0792	Ent. Cam#115, Los Alpes (0,1km Cam#148)	Fin Camino, Finca Victor Julio Gutiérrez	5	0,2	1	1	NCU	Venecia	19	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0797	Ent. R-140, Venecia (0,4km Cam#141)	Ent. Cam#52, C Coraz. de Jesús (0,3km Cam#772).	5	0,7	1	1	NCU	Venecia	22	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0802	Ent. Cam#140, San Juan (1,1km Cam#117)	Fin Camino Finca Alberto Cubillo	5	0,7	1	1	NCU	Venecia	10	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0812	Ent. Cam#120, San Bosco (0,4km Cam#119)	Fin Camino, parque Nacional Juan Castro Blanco	5	0,43	1	1	NCU	A.Zarcas	6	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0828	Ent. R-141, Puente Casa (0,3km Cam#19)	Ent. Cam#206, Barrio Los Angeles (0,1km R-141)	5	0,127	1	3	NCU	Quesada	32	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0844	Ent. Cam#212, C. Sn José, La Tigra (0,6km R-702)	Fin Camino, Quebrada La Viuda	5	0,3	1	1	NCU	La Tigra	7	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0861	Ent. R-739, Santa Rita (0,4km Cam#128)	Fin Camino, Alto La Gloria	5	0,5		3	NCU	Florencia	9	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0862	Ent. Cam#861, Santa Rita (0,5km R-739)	Fin Camino Finca	5	0,7	1	1	NCU	Florencia	13	2018	Mantenimiento rutinario	LTMR	No aplica	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0879	Ent. Cam#27, San Juan (0,6km R-748)	Fin Camino Finca Campos	5	0,2	1	1	NCU	Florencia	10	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0881	Ent. Cam#880, C. San Juan (0,35km Cam#27)	Fin Camino Finca Negro Montoya	5	0,3	1	1	NCU	Florencia	10	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0895	Ent. Cam#13, C. Dulce Nombre (0,3km Cam#899)	Ent. Cam#28, Dulce Nombre (0,1km. Cam#891)	5	1,8			NCU	Quesada	19	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0896	Ent. Cam#895, C. Dulce Nombre (0,3km Cam#897)	Fin Camino Finca	5	0,5	1	1	NCU	Quesada	10	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0897	Ent. Cam#895, C. Dulce Nombre (0,4km Cam#896)	Fin Camino Finca Lindo Jiménez	5	0,9	3	3	NCU	Quesada	10	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0898	Ent. Cam#897, C. Dulce Nombre (0,5km Cam#895)	Fin Camino Finca Hermanos Jiménez	5	0,6	4	3	NCU	Quesada	16	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0902	Ent. Cam#13, Dulce Nombre (0,25km Cam#131)	Ent. Cam#13, C. Dulce Nombre (0,02km Cam#903)	5	0,22	1	3	NCU	Quesada	18	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0920	Ent. Cam#121, C. Alto La Gloria (2,1km Cam#122)	Fin Camino Finca Procopio Salas	5	0,5	2	2	NCU	Florencia	16	2018	Mantenimiento rutinario	LTMR	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0921	Ent. Cam#38, C. Buena Vista (1,3km Cam#122)	Fin Camino Finca Marcos Rodríguez	5	3,6	1	3	NCU	Buena Vista	10	2018	Mantenimiento rutinario, Mantenimiento Periódico, Rehabilitación, Mejoramiento	LTMJ	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Lastrados, Movimiento de Tierra, ampliación de caminos
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0927	Calles Urbanas	La Abundancia, Ciudad Quesada	5	0,4	1	1	U	Quesada	12	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial	Lastrado
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial	Lastrado
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0929	Ent. Cam#09, C. La Abundancia (1,9km Cam#928)	Fin Camino, Quebrada sin Nombre	5	0,4	2	2	NCU	Quesada	3	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO N°	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0941	Ent. R-141, Porvenir Arriba (0,3km Cam#07)	Ent. R-141, Porvenir Abajo (0,2km Cam#06)	5	1,4	1	1	NCU	Quesada	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0945	Ent. Cam# 944, Puente Casa (0,2km R-141)	Fin Camino Finca Elicio Núñez	5	0,2	2	3	NCU	Quesada	30	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0946	Ent. R-141, Cruce Cedral (0,3km Cam#13)	Fin Camino Finca Elizondo	5	0,2			NCU	Quesada	26	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0952	Ent. Cam#08, Sn J. de la Montaña (1,6km Cam#951)	Ent. Cam#08, Sn J. de la Mont. (0,7km Cam#233)	5	1	3	NCU	Quesada	22	2018					
									2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra	
									2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra	
									2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra	
									2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra	
2-10-0956	Ent. Cam#07, San Vicente (1,2km Cam#216)	Ent. Cam#04, Colón (1,0km Cam#03)	5	2,8	1	1	NCU	Quesada	16	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
2-10-0964	(Ent.C.1032) Pueblo Santo X: 445080,249 Y: 1200547,824	(Ent.C.205) Pueblo Santo X: 445677,15 Y: 1200516,07	5	0,6	4	2	NCU	Pocosol	30	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0966	(Ent.C.246) Finca Rio Pocosol X: 449672,87 Y: 1208394,81	Fin Camino Finca Pocosol X: 449541,63 Y: 1207355,52	5	1,1	3	3	NCU	Pocosol	26	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0967	Calles Urbanas	Cuadrantes La Guaria	5	0,3	3	3	U	Pocosol	100	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial	Lastrado
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial	Lastrado
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0968	(Ent.C.969) Moravia-Crucitas X: 454657,34 Y: 1209636,94	(Ent.C.200) La Guaria X: 454403,34 Y: 1207496,99	5	2,3	3	3	NCU	Pocosol	22	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0969	(Ent.C.247) Cruce Jocote X: 457158,11 Y: 1206681,05	(Ent.C.104) Moravia-Crucitas X: 454506,98 Y: 1209673,50	5	4,9	1	3	NCU	Pocosol	33	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0970	(Ent.C.247) Cruce Jocote X: 456074,49 Y: 1206919,50	(Ent.C.969) Moravia-Crucitas X: 456427,12 Y: 1207981,05	5	1,3	4	2	NCU	Pocosol	27	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0979	(Ent.C.267) Cruce Banderas X:447946,23 Y: 1197245,03	Fin de Camino X: 447612,86 Y: 1197432,89	5	0,4	3	3	NCU	Pocosol	30	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0980	Calles Urbanas	Cuadrantes Banderas	5	0,7	4	2	U	Pocosol	100	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial	Lastrado
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial	Lastrado
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0984	(Ent.N.752.) San Bosco X:436285,24 Y: 1174676,15	Fin Camino Quebrada Guayabo X:436836,90 Y: 1174545,18	5	0,7	3	3	NCU	Pocosol	24	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0987	(Ent.C.063) Rio Tico X:462427,19 Y:1191415,06	Fin Camino X : 461528,62 Y: 1192613,78	5	2	2	3	NCU	Cutris	15	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0989	(Ent.C.104) Moravia X: 460149,23 Y:1193835,83	Fin Camino con servidumbre Agricola X: 459665,13 Y:1195871,28	5	2,4	4	3	NCU	Cutris	15	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0990	(Ent.C.104) Moravia X: 460486,57 Y:1193968,77	Fin Camino X:460766,96 Y:1193578,68445	5	0,5	3	3	NCU	Cutris	24	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0991	(Ent.C.104) Chamorro X: 460486,57 Y:1193968,77	Fin Camino X:459954,48 Y:1198030,96	5	2,3	3	3	NCU	Cutris	30	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0992	(Ent.C.104) Crucitas X :461757,99 Y:1198752,18	Fin Camino X:461600,01 Y :1198923,54	5	0,2	3	3	NCU	Cutris	30	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0561	Molino (1,1km Cam#33)	Vega (0,2km de R-141)	4	3	5	5	NCU	Florencia	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0994	(Ent.C.250) Cruce Jardin X:472474,86 Y:1187391,59	Fin Camino Rio San Carlos X:477408,16 Y:1184815,70	5	6	1	3	NCU	Cutris	30	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0996	(ENT C 072) Los Angeles	Fin de camino, Propiedad Privada	5	1,4	3	3	NCU	Fortuna	14	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-1008	(ENT C 222) San Martin	Fin de camino, Propiedad Privada	5	0,2	2	3	NCU	Pocosol	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1009	JUANILAMA CENTRO	Reserva Juanilama	5	0,5	3	3	NCU	Pocosol	26	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y
2-10-1011	(ENT C 420) Juanilama	Fin de Camino, Reserva Juanilama	5	1,1	2	3	NCU	Pocosol	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-1014	(ENT N 4) CHIMURRIA	FIN DE CAMINO, San Josecito de Chimurria	5	1,2	3	3	NCU	Venado	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-1016	(ENT C 179) Pataste, Limite. Cantonal. San Carlos/Guatuzo	Fin de camino, Rio La muerte	5	1,4	3	3	NCU	Venado	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-1022	(ENT C 460) Alto Monterrey	Fin de Camino, Propiedad Privada	5	1,1	3	3	NCU	Monterrey	19	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-1023	(ENT N 4) CEDROS	(ENT N 4) CEDROS, quebrada balsa	5	1	3	3	NCU	Monterrey	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1032	(Ent.C.204) Banderas X: 444999,176 Y: 1198417,791	(Ent.C.204) Banderas X: 442095,743 Y: 1199119,071	5	7,3	4	2	NCU	Pocosol	30	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-1049	ENT C 131 Quebrada Azul	ENT C 885 Quebrada Azul	5	2,4	3	3	NCU	Florencia	19	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1057	(ENT C 1056) La Lucha	Fin De camino, Propiedad Privada	5	0,2	3	3	NCU	La Tigra	18	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-1058	(ENT C 1056) La Lucha	Fin Camino, Propiedad Privada	5	0,2	3	3	NCU	La Tigra	18	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-1072	(ENT C 034) QUEBRADA AGUAS GATAS	Fin de camino, Propiedad Privada	5	1,5	2	1	NCU	La Tigra	46	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	LTMJ	Evacuación Pluvial	Lastrado
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1091	(ENT C 250) PATASTILLO	Fin de camino, Propiedad Privada	5	1	1	3	NCU	Cutris	15	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1092	(Ent C 187) El Carmen	Fin Camino, Propiedad Privada	5	6,8	1	3	NCU	Cutris	15	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1093	(ENT C 1092) El Carmen	Fin de Camino, Propiedad Privada	5	2	2	2	NCU	Cutris	12	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-1102	(ENT C 537) Finca Edwin Conejo	Fin Camino, Los Conejo	5	0,5	4	3	NCU	Pocosol	13	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-1106	(ENT C 177) Reserva Ecologica Catarata Rio Fortuna	(ENT C 177) Reserva Ecologica Catarata Rio Fortuna	5	2,1	3	3	NCU	Fortuna	29	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-1114	(ENT C 250) Cruce Cascada	Fin de Camino, servidumbre Agricola	5	4,2	3	3	NCU	Cutris	13	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0022	Ent.R35, Florencia (0,7km R-141)	Ent.Cam#36, Peje Viejo, Iglesia (Adj. a Cam#25)	3	4,7	4	5	VC	Florencia	58	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Demarcación horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0033	Ent.R141, El Molino (1,1 km de Cam#168)	Fin de Camino, Finca Mario Barrientos	3	1,3	4	4	VC	Florencia	28	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Demarcación horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0036	Ent. Ruta # 35,Quebrada Azul (0,25km Cam#131)	Ent. Cam. #22, Peje Viejo, Iglesia(Adj. Cam#25)	3	0,32	4	5	VC	Florencia	44	2018	Mantenimiento Rutinario, Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021				
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO N°	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0070	Ent.R142, Cruce a Tanque (1,1km de R-141)	Ent. Cam. #75, Frente a Cementerio Los Angeles	3	4,962	4	4	VC	Fortuna	34	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2021				
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
2-10-0093	Ent. R-4, Sn José de Cutris (1,2km de Cam#69)	Fin camino, Río San Carlos	1	0,67	3	3	VC	Cutris	38	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2021				
										2022				
2-10-0125	Ent. R-141, C. Quesada (Esquina N.O Catedral)	Ent. Cam.#09, Abundancia (1,8km Cam#155)	3	0,3	1	2	VC	Quesada	43	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2020				
										2021				
										2022				



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0153	CUADRANTES CIUDAD QUESADA	CUADRANTES CIUDAD QUESADA	3	0,94	4	3	U	Quesada	87	2018	Mantenimiento Periódico	SDRC	No aplica	Recarpeteo y Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020	Mantenimiento Rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021				
										2022	Mantenimiento Rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
2-10-0154	CUADRANTES FLORENCIA	CUADRANTES FLORENCIA	1	2,17	3	2	U	Florencia	49	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0154	CUADRANTES FLORENCIA	CUADRANTES FLORENCIA	3	0,04	2	3	U	Florencia	49	2018				
										2019				
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2021				
										2022				
2-10-0156	CUADRANTES AGUAS ZARCAS	CUADRANTES AGUAS ZARCAS	3	1,658	3	3	U	A.Zarcas	67	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2021				
										2022				



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0159	CUADRANTES FORTUNA	CUADRANTES FORTUNA	3	0,4	3	U	Fortuna	66	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento	
									2019					
									2020					
									2021					
									2022					
2-10-0164	CUADRANTES SANTO DOMINGO, MONTERREY	CUADRANTES SANTO DOMINGO, MONTERREY	3	1,135	3	3	U	Monterrey	53	2018	Mantenimiento rutinario, Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Construcción de puentes peatonal, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2021				
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
2-10-0168	Ent. R.141, Cruce La Vega (3,0km de Cam#167)	Fin Camino, Río Peñas Blancas	3	0,9	4	4	VC	Florencia	36	2018	Mantenimiento rutinario	BA	Evacuación Pluvial: Aceras	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en Asfalto
										2019				
										2020				
										2021				
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
2-10-0210	Ent. R.738, C. Sn Pedro (0,4km Cam#847)	Ent. Cam. #152, La Lucha (0,35km Cam#213)	3	2,5	4	4	VC	La Tigra	47	2018	Mantenimiento rutinario	BA	Evacuación Pluvial: Aceras	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en Asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0220	Calles Urbanas	Instituto Tecnológico de Costa Rica	3	1,6	4	4	U	Florencia	53	2018	Mantenimiento rutinario	BA	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales, Cunetas	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0236	Ent. R.140, C. Q. Colegio María (0,2km Cam #03)	Ent. R.141, La Hacienda (0,5km Cam#941)	3	0,6	2	2	VC	Quesada	53	2018	Mantenimiento rutinario	BA	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical y Bacheo en asfalto
										2019				
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2021				
										2022				
2-10-0237	Ent. R-140, Centro Diosesano (1,6km Cam#01)	Ent. Cam.#004, finca las nubes (1,1km Cam#170)	1	0,275	2	2	NCU	Quesada	15	2018	Mantenimiento rutinario	BA	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0238	Ent. R-140, Qb. el Palo, Sn Juan (0,1km Cam#825)	Fin de Camino, Finca Los Zúñiga	3	0,5	2	3	NCU	Quesada	34	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021				
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
2-10-0405	Ent. R.141, Bª Carmen, Fte Ginmacio Siglo XX	Fin Camino, Propiedad Planta Eléct. Matamoros	3	0,75	3	3	VC	Quesada	46	2018				
										2019				
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2021				
										2022				
2-10-0504	Ent. C.#177, C. Catarata Fortuna (2,1km R702)	Ent. Cam.# 503 (1,3km R-142)	1	0,43	2	2	NCU	Fortuna	32	2018	Mantenimiento rutinario	BA	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en Asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0509	Ent. R.142, Fortuna (1,2km de R-702)	Ent. Cam# 508,C. Agua Azul (1,3km	3	0,3	1	3	NCU	Fortuna	21	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2020				
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2022				



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0512	Calles Urbanas	Valle del Volcán, Fortuna	3	1,5	4	3	U	Fortuna	47	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
2-10-0520	Ent. C.#75,Cruce 3 Esquinas (0,6km de Cam.#73)	Lím.Cant. Sn Carlos/Sn Ramón, Río Burro	3	0,3	3	3	VC	Fortuna	24	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021				
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
2-10-0607	Calles Urbanas	Buenos Aires, Pocosol	3	0,2	3	3	U	Pocosol	40	2018	Mantenimiento rutinario, Rehabilitación,	BA	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0616	Calles Urbanas	Muelle, Florencia	3	0,5	3	3	U	Florencia	48	2018	Mantenimiento rutinario	BA	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en Asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0705	Ent. Cam#60, Puerto Escondido, Cementerio	Fin Camino, finca Gerardo Víquez	3	0,06	4	5	NCU	Pital	31	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2020				
										2021				
2-10-0783	Ent. Cam#54, Marsella, Escuela	Fin Camino, Finca Memo Mejía	3	0,2	2	3	NCU	Venecia	39	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2020				
										2021				
2-10-0786	Ent. R-140, Cruce Marsella (0,05km Cam#126)	Ent. Cam#53, Barrio Jardín (Fte Cam#787)	1	0,2	3	3	NCU	Venecia	39	2018	Mantenimiento rutinario	BA	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en Asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0839	Ent. R-702, La Tigra (0,3km Cam#80)	Fin Camino, Río La Esperanza	3	0,9	4	4	NCU	La Tigra	39	2018	Mantenimiento rutinario	BA	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en Asfalto
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2021				
									2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo	



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0909	Calles Urbanas	Cuidadela Emilio Rojas, Ciudad Quesada	3	0,4	4	5	U	Quesada	26	2018	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	SVDEM	Mejorar los sistemas de evacuación	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0911	Calles Urbanas	Dulce Nombre Sur (Cedral), Ciudad Quesada	3	1,37	2	3	U	Quesada	53	2018	Mantenimiento rutinario	BA	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en Asfalto
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2021				
										2022				
2-10-0988	(Ent.N.227) Moravia X: 458417,17 Y:1191680,77	Fin Camino X: 457531,93 Y:1191398,10	3	1	3	3	NCU	Cutris	15	2018	Mantenimiento rutinario	BA	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en Asfalto
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0995	(Ent.C.994) Cruce Jardin X:473113,31 Y:1187517,95	(Ent.C.109) El Recreo, Rlo San Carlos X :474119,06 Y:1188548,34	3	1,5	3	3	NCU	Cutris	12	2018	Mantenimiento rutinario	BA	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en Asfalto
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	SDRC	Evacuación Pluvial	Recarpeteo
										2020				
										2021				
										2022				



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1048	(ENT C 054) Paraiso	Fin de Camino, Proyecto Hidroeléctrico Toro	3	1,1	4	2	NCU	Venecia	34	2018	Mantenimiento rutinario y Rehabilitación	BA	Mejorar los sistemas de evacuación	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en Asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-1054	(ENT C 176) Trinchera	Fin De camino, Propiedad Privada	1	0,5	2	3	NCU	Pital	16	2018	Mantenimiento rutinario	BA	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0005	Ent. Cam.# 006, Porvenir (1km R-141)	Fin de Camino, Finca la Maritza	4	0,4	1	2	NCU	Quesada	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0007	Ent. R.141, Porvenir (0,1km Cam#216)	Fin de Camino, Parque Nacional J.Castro Blanco	4	7,78	4	3	VC	Quesada	40	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial:Cajas de registro, tragantes, cabezales, Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0010	Ent. R 745, Chaparrón	Fin de Camino, Finca Oro Verde	4	0,5	2	3	NCU	Pital	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0011	Ent. R-4, Mirador (1 km de Cam#113)	Ent.Camino #92, Montelimar, Escuela	4	4,5	2	3	VC	Monterrey	25	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0015	Ent.R140, San Juan (0,1km Cam#208)	Fin de Camino, cerrado, San Luis	4	1,3	1	3	NCU	Quesada	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0016	Ent.Cam#132, Tesalía, C.Linda Vista (1,8km R-140)	Fin de Camino, Barrio Corazón de Jesús	4	2	1	3	NCU	Quesada	12	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	"Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0020	Ent. R.141, Florencia (1,1km R-35)	Ent.Camino #131, Quebrada Azul (0,2km R-35)	4	2,84		3	VC	Florencia	41	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0021	Ent.R35, Caimitos (0,8km Cam#22)	Ent.Cam#20, San Luis (0,2km Cam#217)	4	0,216	2	3	NCU	Florencia	32	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0621	Ent. R.4, Cruce a Muelle (0,7km Cam.#620)	Fin Camino, Río San Rafael	4	1,4	5	5	NCU	Palmera	22	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial:Cajas de registro, tragantes, cabezales, Relastrados,Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0622	Ent. R.4, Entrada La Unión (1,2km Cam#81)	Ent. R.747, Sn Francisco (0,1km R-748)	1	1,72	5	5	NCU	Palmera	33	2018	Mantenimiento Rutinario, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial:Cunetas	Demarcación horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
2-10-0023	Ent. Cam. #22, Sn Francisco (0,85km Cam#24)	Fin de Camino, Finca La Aquilea	4	0,8	2	3	NCU	Florencia	39	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0024	Ent. Cam. #22, C. Sn Francisco (0,7km R-35)	Fin de Camino, Finca Francisco Campos	4	1	2	3	NCU	Florencia	3	2018	Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



2-10-0026	Ent.R35, Cruce Las Nieves (4,9km R227)	Ent. Camino # 100, Santa María (0,1km	4	4,1	3	3	NCU	Pocosol	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0029	Ent.R-748, Cruce Sn Rafael (1,2km Cam #166)	Ent. Ruta # 35, Cruce a Muelle (0,4km de R-4)	4	6,5	2	3	NCU	Florencia	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0031	Ent.R141, La Vega (3,0km de cam#167)	Fin de Camino, Caño Moja Huevos	4	2,2	2	3	VC	Florencia	28	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0032	Ent. Cam. #31, Cruce La Vega (0,9km de R-141)	Fin de Camino, Finca Hermanos Herrera	4	4,1	3	3	NCU	Florencia	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación

UIC-0-50

UIC



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0035	Ent.R141, C. La Perla (0,05km R. Peñas Blancas)	Fin de Camino, Finca Hermanos Alfaro	4	2,7	3	3	NCU	Florencia	54	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0036	Ent. Ruta # 35,Quebrada Azul (0,25km Cam#131)	Ent. Cam. #22, Peje Viejo, Iglesia(Adj. Cam#25)	4	4,28	3	3	VC	Florencia	44	2018	Mejoramiento Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mejoramiento Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0037	Ent. Cam. #122, La Culebra, B.Vista (1,8km Cam#9)	Ent. Cam. #122, Cruce La Vieja (0,1km Cam#121)	4	2,6	2	2	NCU	Buena Vista	25	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0046	Ent.R140, Buenos Aires (0,1km Cam#47)	Ent. Cam. #30, Las Brisas (1,1km Cam#117)	4	1	2	3	NCU	Venecia	29	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0049	Ent.R140, San Cayetano (0,9km Cam#148)	Ent. Cam. #52, Las Huacas (1,1km Cam#715)	4	2,865	3	3	NCU	Venecia	22	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022				
2-10-0051	Ent. Cam#141, Venecia (Fte Parque, 0,2km R140)	Ent. Cam. #44, Pueblo Viejo (Fte Cam#114)	4	0,4	2	3	VC	Venecia	63	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0053	Ent.R140, Colegio Venecia (0,1km Cam#143)	Ent. Cam#144, C. Marsella (0,35km Cam#54)	4	1	1	3	NCU	Venecia	18	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022				



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0635	Ent. R-751, San José Aguas Zarcas (0,3km R-4)	Ent. Cam.#226, Cruce Los Lotes (0,4km R-4)	4	1,2	5	5	NCU	A.Zarcas	35	2018	Mantenimiento Periódico, Mejoramiento	LTMP	Evacuación Pluvial	Construcción de puentes vehicular, Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0056	Ent. R-250, Cruce 4 Esquinas (0,5km Cam#659)	Fin de Camino, Coopeisabel, Río Tres Amigos	4	2,7	3	3	VC	Pital	73	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0067	Ent. Cam. #66, San Jorge (0,6km de R-4)	Fin de Camino, Finca Luis Carranza	4	1,3	2	3	NCU	Fortuna	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0069	Ent. Ruta # 4, San Cristóbal, frente a entrada	Ent.R141, Los Angeles, Plaza	4	4,7	4	3	VC	Fortuna	74	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0072	Ent.R141, Los Angeles, (0,7km de Camino#75)	Ent. Cam. #70, Zona Fluca	4	0,25	2	3	NCU	Fortuna	28	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0073	Ent. Cam. #70, Zona Fluca (1,0km de Cam.#72)	Ent. Cam. #75, Cruce a Tres Esquinas (1km C#74)	4	1,6	2	3	NCU	Fortuna	44	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0075	Ent.R141, Los Angeles, Frente a Cam.#69	El Bosque, Lím.Cant.S .Carlos/San Ramón	4	3,3	2	3	VC	Fortuna	63	2018				
										2019	Mejoramiento	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mejoramiento	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0079	Ent. Cam. #80, C.La Tigra (0,4 km R-702)	Fin camino, finca Bosque Eterno de los Niños	4	3,021	2	3	NCU	La Tigra	16	2018	Mejoramiento	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0082	Ent. Cam. #81, Cruce a Sn Francisco (0,6km R-4)	Fin camino, finca Macho Mora	4	2,7	2	3	NCU	Palmera	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0084	Ent. Ruta # 4, Cruce a Concepción	Ent. Ruta # 748, La Palmera	4	0,2	2	3	VC	Palmera	30	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0086	Ent. Ruta # 734, Venado Centro (1 km Cam#87)	Río Cucaracha, Lím.Cant.S.Carlos/ Guatuzo	4	10,818	4	3	NCU	Venado	27	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0088	Ent. Ruta # 734, Linda Vista	Ent. Cam# 64, La Torre de Monterrey	4	3,65	2	3	NCU	Venado	30	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Mantenimiento de puentes vehiculares, Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0088	Ent. Ruta # 734, Linda Vista	Ent. Cam# 64, La Torre de Monterrey	4	3,65	2	3	NCU	Monterrey	30	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Mantenimiento de puentes vehiculares, Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0093	Ent. R-4, Sn José de Cutris (1,2km de Cam#69)	Fin camino, Río San Carlos	4	7,2	3	3	VC	Cutris	38	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mejoramiento	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mejoramiento	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0097	Ent. Ruta # 751, Caño Negro	Ent. Ruta # 753, Bella Vista	4	3,65	2	3	NCU	Cutris	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICIÓN	CONVENCIÓN SUPERFICIE	CLASIFICACIÓN	DISTRITO	IVTS	PROGRAMA DO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0097	Ent. Ruta # 751, Caño Negro	Ent. Ruta # 753, Bella Vista	4	3,65	2	3	NCU	A.Zarcas	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0100	Ent. Ruta # 35, Santa Rosa Pocosol.	Ent. R227, Asent. El Edén	4	7,985	3	3	VC	Pocosol	54	2018	Mantenimiento Periódico, Mejoramiento, Rehabilitación	SDC	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0104	Ent. R227, Moravia, Crucitas (Se convirtió 3.95 Km. en la RN 961, según oficio DR-HN-28-2013-0121).	Fin Camino, Campo Pocosol, (Escuela), 4 Esquinas	4	13,25	2	3	VC	Cutris	42	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
2-10-0107	Ent. Cam. #106, San Rafael, (a 2km del centro)	Ent. Cam. #106, San Rafael, Escuela	4	0,3	1	1	NCU	Pocosol	22	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0110	Ent. Cam.# 063, Río Tico	Fin Camino, Intransitable a San Vito	4	0,6	4	3	NCU	Cutris	19	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0113	Ent. Ruta # 4, Mirador (1,0km de Cam.#11)	Ent. Cam # 11, La Unión (0,3m km de R-4)	4	0,85	3	3	NCU	Monterrey	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0114	Ent. Cam.#44, Pueblo Viejo (Fte Cam#51)	Fin Camino, Finca Alberto Vargas	4	2,5	2	3	VC	Venecia	45	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial: Cajas de registro, tragantes, cabezales, Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0116	Ent. Cam.# 30, La Unión (0,2km Cam#803)	Fin Camino, Finca Hernán Morales (Reserva For.)	4	3,5	3	3	NCU	Venecia	16	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0118	Ent. Cam.#116, C. La Unión (1,6km Cam#30)	Fin Camino, Finca Macho Alvarado	4	0,4	2	2	NCU	Venecia	13	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0121	Ent. Cam.#122, La Vieja (0,5km R-739)	Fin Camino, Alto La Gloria, Finca Roberto Siles	4	3,8	2	3	NCU	Florencia	16	2018	Mantenimiento Rutinario, Rehanbilitación	LTMR	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0122	Ent. R-739, La Vieja, escuela (0,3km a Cam#215)	Lím. Cantonal S. Carlos/Alfaro Ruiz, La Quina	4	4	2	3	VC	Florencia	39	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0124	Ent. R-141, Sucre Ron Ron (0,1km Cam#924)	Ent. Cam.#09, Cruce Ron Ron (2,2km Cam#122)	4	4	2	3	NCU	Quesada	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0126	Ent. R.140, Cruce a Marsella (Adjunto a Cam#784)	Fin Camino, Finca	4	0,3	3	3	NCU	Venecia	27	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0127	Ent. Cam.#54, Paraiso (5,6km R-140)	Fin Camino, Finca Ezequiel Herrera	4	0,9	2	1	NCU	Venecia	13	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0128	Ent. R.141, Santa Clara, Fte a Plaza de deportes	Ent. R.739, Santa Rita (0,4km Cam#861)	4	0,659	2	3	VC	Florencia	23	2018				
										2019				
										2020				
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0129	Ent. Cam.# 128, C. Santa Clara (1,1km de R-141)	Ent. Cam.# 130, C. R. Municipal (0,2km Cam#128)	4	0,8	2	2	NCU	Florencia	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0130	Ent. Cam.# 128, C. Santa Clara (0,6km Cam#129)	Fin Camino, Finca Rancho Municipal	4	0,3	2	3	NCU	Florencia	33	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0136	Ent. R.140, C. Aguas Zarcas (0,4km Cam#138)	Ent. Cam. #119, Garabito (0,35km Cam#810)	4	0,5	2	3	NCU	A.Zarcas	32	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial:Cajas de registro, tragantes, cabezales, Cordón y Caño, y Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0138	Ent. R.140, C. Aguas Zarcas (Fte Cam#137)	Fin Camino, Finca Benedicto Rojas Cubero	4	0,765	2	3	NCU	A.Zarcas	20	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020				
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022				
2-10-0142	Ent. Cam # 151, C. Sn Martín (0,7km Cam#143)	Fin Camino, Finca Dago Zamora	4	0,5	1	1	NCU	Venecia	13	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0144	Ent. R.140, C. Marsella (Fte Cam#54)	Fin Camino, Finca Frutas Tropicales	4	1,4	3	3	VC	Venecia	41	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0145	Ent. R-250, Cruce Aguas Zarcas (1,3km R-140)	Fin Camino, Finca Agropecuaria Los Abuelos	4	0,8	2	3	NCU	A.Zarcas	25	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0148	Ent. R.140, C. Sn Cayetano (0,9km Cam#49)	Fin Camino, Finca Fernando Obando	4	1,62	3	3	NCU	Venecia	83	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0151	Ent.Cam # 143, Cruce San Martin (0,4km R140)	Fin Camino, Finca Joaquín Porras	4	0,875	4	3	NCU	Venecia	27	2018	Mejoramientos	LTMJ	No aplica	Lastrado
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0156	CUADRANTES AGUAS ZARCAS	CUADRANTES AGUAS ZARCAS	4	5,107	4	2	U	A.Zarcas	67	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0159	CUADRANTES FORTUNA	CUADRANTES FORTUNA	4	0,28			U	Fortuna	66	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0164	CUADRANTES SANTO DOMINGO, MONTERREY	CUADRANTES SANTO DOMINGO, MONTERREY	4	2,425	3	3	U	Monterrey	53	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial: Cunetas, Cordón y Caño, Cajas de Registro, tragantes, cabezales, Tubos de concreto alcantarillado,	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0168	Ent. R.141, Cruce La Vega (3,0km de Cam#167)	Fin Camino, Río Peñas Blancas	4	1,19	2	3	VC	Florencia	36	2018	Mantenimiento rutinario	LTMR	Evacuación Pluvial	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0169	Ent. Ruta # 749, Cruce a Coopesan Juan, Gloria	Ent. C.111, Los Almendros	4	5,05	3	2	NCU	Cutris	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0169	Ent. Ruta # 749, Cruce a Coopesan Juan, Gloria	Ent. C.111, Los Almendros	4	5,05	3	2	NCU	A.Zarcas	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0170	Ent.Camino #004, San Gerardo (0,4km Cam#03)	Fin Camino, Finca Chente Aguilar	4	0,4	2	2	NCU	Quesada	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0679	Calles Urbanas	Piedra Alegre, Pital	4	0,3	5	5	U	Pital	40	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				
2-10-0171	Ent.Ruta# 745,Chaparrón	Yucatán, Lím. Prov. Alajuela/Heredia	4	4,6	1	3	NCU	Pital	19	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0173	Ent.Camino #172, Sante Rita	Casalata, Lím. Prov. Alajuela/Heredia	4	5,1	3	3	NCU	Pital	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0182	Ent. Ruta# 734, Venado (0,6 km Cam#86)	Ent. Cam.#64, Sangregado, Lím.Prov.Alaj/Guan	4	9,6	1	3	NCU	Venado	19	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0183	Ent. R.227, Sn Gerardo, a 100m Plaza	Fin Camino, Finca Juan Jarquín, Santa Cecilia	4	5,9	1	3	NCU	Pocosol	13	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0184	Ent. R.227, Entrada a San Luis	Ent. R.227, Cruce a Morazán (0,2km Cam#379)	4	2	3	3	NCU	Pocosol	27	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	No aplica	Construcción de puentes vehicular, Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0186	Ent. R.227, Cruce a Sn Joaquín	Fin de Camino, finca reforestada, Laurel G.	4	5,1	1	2	NCU	Cutris	21	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0188	Ent. Cam.#185, El Jardín	Ent. Cam.#276, El Carmen, Frontera .Norte	4	3,2	1	3	NCU	Cutris	19	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0189	Ent. R.753, Betania	Fin Cam., Río Sn Carlos, Vuelta El Cubano	4	1,86		3	NCU	Cutris	13	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0191	Ent. Cam.#11, Montelimar, Estrella, Escuela	Ent. Cam.#91, C. Sn Diego (0,2km Cam#197)	4	8,6	3	3	VC	Pocosol	27	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0191	Ent. Cam.#11, Montelimar, Estrella, Escuela	Ent. Cam.#91, C. Sn Diego (0,2km Cam#197)	4	2,6		3	VC	Pocosol	27	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0192	Ent. Cam.#11, C. Mirador (0,7km R-4)	Fin Camino, Asent. La Unión, Finca Miguel Varela	4	5,1	3	3	NCU	Monterrey	36	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0193	Ent. R.752, Chambacú, Frente a Plaza	Ent. Cam.# 112, C.Sn Bosco (3,8km R 752)	4	9,8	3	3	NCU	Monterrey	27	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0195	Ent. R.752, C. San Martín (0,9km Río Pocosol)	Ent. Cam.# 17, Tres y Tres, Plaza	4	4,4	1	3	NCU	Pocosol	30	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0196	Ent. Cam.#91, C, Sn Diego (1,5km R-752)	Ent. Cam.#91, C, La Estrella (0,5km Cam#191)	4	6,2	2	3	VC	Pocosol	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0197	Ent. R-35, Las Nieves, Frente a Cam#26	Ent. Cam.#91, C, La Estrella (0,02km Cam#191)	4	3,64	2	3	VC	Pocosol	21	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0199	Ent. R.227, Moravia	Ent. Cam.#106, Llano verde	4	7,6	1	3	NCU	Pocosol	19	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periodico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0205	Ent.Cam#201, Plaza de Banderas	Ent. Cam.# 204, Cruce a Pueblo Santo	4	7	2	2	NCU	Pocosol	22	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0207	Ent. R.141, Jabillos (0,1km R-738)	Ent. Cam.# 152, La Esperanza (0,3km Cam#855)	4	1,77	4	3	NCU	La Tigra	22	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0209	Ent. R.142, Fte. a Pu. Policía (2,5km R. Tabacón)	Castillo, Límit.Cant. San Carlos/San Ramón	4	8,9	3	3	VC	Fortuna	40	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-02014	Ent. R.702, La Tigra (0,1km C.N#841)	Ent. Cam. #210, La Lucha (0,4km Cam#152)	4	2	2	3	NCU	La Tigra	22	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0216	Ent. R.141, Porvenir (0,1km Cam#07)	Ent. Cam. #007, San Vicente (2,2km Cam#06)	4	0,322	1	3	NCU	Quesada	23	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0217	Ent. Cam.# 13, Dulce Nombre Sur (Fte Cam#908)	Ent. Cam.# 20, San Luis , escuela (1,3km R-141)	4	1,331	2	3	VC	Florencia	41	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0219	Ent. Cam.#202, La Esperanza	Fin de camino, finca Parra	4	1,04	2	3	NCU	Pocosol	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0221	Ent. R.734, Altos Banca Lucia (0,5km Lím.Prov.)	Snta Lucía, Lím.Cant.S.Carlos/ Guatuzo	4	8,3	3	3	NCU	Venado	27	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0223	Ent. Cam.# 195, Cruce. Tres y Tres (3,2km R752)	Ent. Cam.#222, Juanilama (1,8km R752)	4	1,7	2	3	NCU	Pocosol	22	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0226	Ent.R-4, Cruce Cerro Cortés, Fte. A Cam#627)	Ent. R.751, San José Aguas Zarcas (1,2km R-4)	4	0,65	2	3	NCU	A.Zarcas	19	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0226	Ent.R-4, Cruce Cerro Cortés, Fte. A Cam#627)	Ent. R.751, San José Aguas Zarcas (1,2km R-4)	4	1,55	2	3	NCU	Palmera	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0230	Ent. Cam.#16, Cruce a Linda Vista	Ent. Cam.#133, Corazón de Jesús	4	1,2	2	3	NCU	Quesada	38	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial: Cajas de registro, tragantes, cabezales	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0232	Ent. Cam.# 008, C. Bajo la Vieja (0,05km Cam#233)	Reserva Forestal, cruce Pozo Verde	4	0,6	2	2	NCU	Quesada	18	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0233	Ent. Cam.# 08, Sn José de Monta (0,05kmC.N#232)	Fin de Camino, Laguna el Congo, C. Sn.Vic.	4	1,5	2	3	NCU	Quesada	16	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0236	Ent. R.140, C. Q. Colegio María (0,2km Cam #03)	Ent. R.141, La Hacienda (0,5km Cam#941)	4	1,4			VC	Quesada	53	2018				
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
2-10-0238	Ent. R-140, Qb. el Palo, Sn Juan (0,1km Cam#825)	Fin de Camino, Finca Los Zúñiga	4	1,3	2	3	NCU	Quesada	34	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0239	Ent. Cam.# 133, Corazón de Jesús	Fin de Camino, Corazón de Jesús	4	1	2	3	VC	Quesada	34	2018	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0242	Ent. Cam #240, Tiricias, Jocote	Fin de Camino, portón de finca	4	2,9	1	3	NCU	Pocosol	3	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0259	Ent. Cam.#204,Cruce Sn Cristóbal	Fin Camino, finca Jorge Alfaro	4	0,08	1	2	NCU	Pocosol	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0262	Ent. Cam.#204,Cruce Sn Cristóbal	Fin Camino, finca Luis Céspedes	4	0,12	1	2	NCU	Pocosol	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0265	Ent. Cam.#201, Cruce Carrizal	Fin Camino, finca Alfaro	4	2,3	2	3	NCU	Pocosol	15	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0271	Ent. Cam.#108, San Alejo	Fin Camino, finca	4	0,6	1	1	NCU	Pocosol	9	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0278	Ent. Cam.#187, El Carmen Escuela	Fin Camino, finca, camino viejo Chamorro	4	0,3	1	1	NCU	Cutris	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0287	Ent. R.227, Coopevega	Fin Camino, finca Chavarría	4	2,7	3	3	NCU	Cutris	9	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDC	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales,	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020				
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022				
2-10-0293	Ent. R.250, Sahino	Fin Camino, finca San Luis (Ojochito)	4	10	2	3	NCU	Pital	9	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0296	Ent. Cam.#174, Castelmar	Fin Camino, finca Los Colachos	4	1	1	2	NCU	Cutris	12	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0297	Ent. R.250, Sahino, 100 N Iglesia	Fin Camino, finca Palmitera	4	1,2	2	3	NCU	Pital	18	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0298	Ent. R.250, Sahino, plaza deportes	Fin Camino, Río Sahino	4	0,5857	2	3	NCU	Pital	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0299	Ent. R.250, Sahino, plaza deportes	Fin Camino, Sitio de Cabra	4	6,3	3	3	NCU	Pital	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0300	Ent. Cam.# 299, Sahino (1 km Este Plaza)	Fin Camino, finca	4	0,4	3	3	NCU	Pital	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0302	Ent. R.745, Chaparrón, Iglesia	Fin Camino, finca, Cerro el Chaparrón	4	0,7	1	2	NCU	Pital	3	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0303	Ent. R.745, Quebrada Grande	Fin Camino, finca, parcela #22	4	2,2	1	3	NCU	Pital	12	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0304	Ent. R.745, Estanques, Quebrada. Grande	Ent. Cam.# 303, Parcelas, Qb Grande.	4	1,5	1	3	NCU	Pital	18	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0305	Ent. R.745, Cruce Queb. Grande	Fin Camino, finca	4	0,8	1	3	NCU	Pital	12	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0306	Ent. R.745, Cruce Veracruz	Fin Camino, finca Los Rojas	4	1,4	1	3	NCU	Pital	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0307	Ent. R.745, Cruce Veracruz	Ent. Cam# 299, Las cabras-Sn Marcos	4	0,43	4	3	NCU	Pital	23	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0322	Ent. Cam.# 307, San Marcos	Fin Camino, finca Marcos Murillo	4	0,9	1	3	NCU	Pital	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0323	Ent. Cam.# 307, San Marcos	Fin Camino, finca Liuver Mena	4	0,3	1	3	NCU	Pital	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0327	Ent. Cam. #97, Caño Negro	Fin Camino, finca Hermanos Gamboa	4	1	2	3	NCU	A.Zarcas	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0329	Ent. Cam. #225, Parcela Betania	Fin Camino, Río San Carlos, Parcela El Pollo	4	0,4	1	3	NCU	Cutris	18	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0331	Ent. R.753, Pueblo Nuevo	Fin Camino, finca los Quesada	4	2,3	1	2	NCU	Cutris	0	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0338	Ent. R.753, San Marcos, Escuela	Fin Camino, finca Los Magón	4	3,3	3	3	NCU	Cutris	13	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0735	Calles Urbanas	Buenos Aires, Venecia	1	0,2	5	5	U	Venecia	46	2018	Mantenimiento Rutinario	SDEP	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
2-10-0341	Ent. R.753, San Pedro	Ent. Cam.# 346, Cruce a Vasconia	4	4,7	1	3	NCU	Cutris	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0342	Ent. R.753, San Pedro	Fin Camino, finca Rancho Chico	4	1,3	1	3	NCU	Cutris	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0344	Ent. R.753, San Pedro	Fin Camino, finca Jiménez	4	1,8	2	3	NCU	Cutris	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0345	Ent. Cam# 344, Sn Pedro	Fin Camino, finca José Luis Carvajal(bodegas)	4	2	2	3	NCU	Cutris	6	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0348	Ent. Cam.# 346, Vasconia	Fin Camino, finca Iluminada Rojas	4	2,4	1	2	NCU	A.Zarcas	12	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0349	Ent. Cam.# 346, Bella Vista	Fin Camino, finca Reforestada	4	0,68	1	3	NCU	Cutris	3	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0351	Ent. R.753, Bella Vista	Fin Camino, finca El Macho	4	2,2	1	3	NCU	Cutris	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0353	Ent. Cam.# 351, Bella Vista	Fin Camino, finca	4	0,5	1	2	NCU	Cutris	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0354	Ent. R.753, San Jorge	Fin Camino, finca Holandéz	4	1,4	2	3	NCU	Cutris	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0355	Ent. Cam. #98, Santa Teresa	Fin Camino, finca Eliecer Valerio	4	0,7	1	3	NCU	Cutris	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0356	Ent. Cam. #96, Cruce a Santa Teresa Sur	Fin Camino, finca Emilia	4	0,8	1	3	NCU	Cutris	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0357	Ent. Cam.#172, Santa Rita	Lím. Prov. Alajuela/Heredia	4	3,2	3	3	NCU	Pital	18	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0358	Ent. R.35, Acapulco (a 0,65km de R. Pocosol.)	Ent. Cam. #101, Las Brisas, Escuela	4	4,1	3	3	NCU	Pocosol	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0361	Ent. Cam. #101, Las Brisas, (a 0,6km Esc.)	Ent. Cam. #102, Plomo, Iglesia	4	3,8	1	3	NCU	Pocosol	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0362	Ent. Cam. #100, Santa María, (1km de Esc.)	Ent. Cam.# 361, Cruce a Plomo (0,7km Iglesia)	4	3,7	1	3	NCU	Pocosol	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0363	Ent. Cam# 363, Cruce a Santa María	Fin Camino, finca	4	0,54	4	3	NCU	Pocosol	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0367	Ent. Cam. #101, Las Brisas, (a 0,6km Esc.)	Fin Camino, finca	4	0,4	1	1	NCU	Pocosol	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0369	Ent. Cam.# 368, Cruce a Plomo (1km centro)	Fin Camino, Parcelas	4	0,5	1	3	NCU	Pocosol	18	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0370	Ent. Cam.# 369, Parcelas el Plomo	Fin Camino, finca	4	0,16	1	3	NCU	Pocosol	12	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0374	Ent. Cam. #202, Cruce a Pueblo Nuevo	Fin Camino, finca La Escondida	4	0,4	1	3	NCU	Pocosol	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0375	Ent. Cam.# 372, Cruce a Sn Joaquín	Fin Camino, finca	4	0,46	1	3	NCU	Pocosol	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0383	Ent. Cam. #186, Cruce a Laurel Galán	Fin Camino, finca Providencia	4	2	2	3	NCU	Cutris	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0384	Ent. Cam# 383, C. A Laurel Galán	Fin Camino, Río San Carlos	4	0,7	1	2	NCU	Cutris	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0385	Ent. Cam. #186, Laurel Galán, centro	Ent. Cam.# 383, Laurel Galán, ctro.	4	0,4	1	3	NCU	Pocosol	12	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0386	Ent. Cam.# 379, C.a Morazán, 1,9km R227	Fin Camino, finca Espedito Mora	4	0,25	1	3	NCU	Pocosol	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0386	Ent. Cam.# 379, C.a Morazán, 1,9km R227	Fin Camino, finca Espedito Mora	4	0,25	1	3	NCU	Cutris	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0387	Ent. Cam. #100, La Luisa (a 2km de plaza)	Ent. Cam# 379, Cruce a Morazán	4	1,52	1	3	NCU	Pocosol	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0388	Ent. Cam. #184, San Luis (a 2,7km de R227)	Fin Camino, finca German Núñez	4	3	3	3	NCU	Pocosol	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0390	Ent. Cam. #184, San Luis (a 2 km de R227)	Fin Camino, finca Juan Bautista Arce	4	3,4	3	3	NCU	Pocosol	23	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0392	Ent. Cam.# 390, C.a Sn Luis,(1,4km C184)	Fin Camino, finca Hacienda Diez Letras	4	0,28	1	3	NCU	Pocosol	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0394	Ent. R.227, El Edén a 0,4km de cam#100	Fin Camino, finca Baldomar Canderó	4	1,3	3	3	NCU	Pocosol	21	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0395	Ent. Cam.# 394, Edén a 0,7km R227	Fin Camino, finca Ronald Saborío	4	0,5	3	3	NCU	Pocosol	9	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial; Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0762	Ent. R-748, °La Marina (0,4km Cam#14)	Ent. Cam#134, La Loma (1,6km R-140)	4	3,3	5	5	NCU	Palmera	25	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial; Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0397	Ent. Cam. #183, Cruce a Santa Cecilia	Fin Camino, finca	4	1,3	1	1	NCU	Pocosol	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0398	Ent. Cam. #183, Cruce a San Gerardo	Fin Camino, finca.... Río San Carlos	4	1,6	1	3	NCU	Pocosol	9	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial; Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0399	Ent. R.227, Buenos Aires (a 0,5km de R35)	Ent. Cam. #183, Cruce a San Gerardo	4	1	2	3	NCU	Pocosol	9	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial; Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0400	Ent. R.35, Cruce a Nieves (a 0,6km de Plaza)	Ent. R.227, Buenos Aires (a 1,8km de R35)	4	1,75	1	3	NCU	Pocosol	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0401	Ent. Cam.# 400, C. a Nieves(a 1,2km R35)	Fin Camino, finca	4	0,14	1	3	NCU	Pocosol	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0402	Ent. Cam. #100, La Luisa, Plaza	Fin Camino, finca Ramón Zeledón	4	1,5	1	1	NCU	Pocosol	9	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial; Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0403	Ent. Cam.# 387, La Luisa, (2,2km Cam#100)	Fin Camino, finca Edwin Pérez	4	0,77			NCU	Pocosol	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0404	Ent.# 390, Cruce. a Sn Luis (2km Cam#184)	Fin Camino, finca Reforestada	4	0,2	2	3	NCU	Cutris	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0406	Ent. R.35, Nieves (a 3,4km de R227)	Fin Camino, finca Miguel Cruz	4	2,1	2	3	NCU	Pocosol	20	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial; Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0407	Ent. Cam.# 406 Nieves(a 1,0km R35)	Fin Camino, finca Chino Flores	4	0,8	2	2	NCU	Pocosol	12	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial; Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0408	Ent. Cam.# 406 Nieves(a 0,6 km R35)	Fin Camino, finca Carmona	4	1,5	3	3	NCU	Pocosol	18	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial; Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0411	Ent. Cam.# 410, C. Snta Rosa(0,8km R35)	Fin Camino, finca	4	0,36	1	3	NCU	Pocosol	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0416	Ent. R.35, Acapulco (a 0,5km de Plaza)	Ent. Cam# 417, C. Juanilama (0,5km R35)	4	1,9	1	3	NCU	Pocosol	15	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial; Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0418	Ent. Cam# 417, Juanilama (3,2km R35)	Fin Camino, finca Graciliano Valverde	4	0,5	1	3	NCU	Pocosol	12	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial; Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0427	Ent. Cam. #195, Tres y Tres (0,2km Plaza)	Fin Camino, finca	4	0,3	1	3	NCU	Pocosol	18	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial; Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0431	Ent. R.35, Santa Rosa a 1,3 km de R752	Ent. R.752, Santa Rosa Frente a Parque	4	0,97	2	3	VC	Pocosol	49	2018				
										2019				
										2020				
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2022	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
2-10-0432	Ent. Cam.# 430 Santa Rosa (0,1km R35)	Fin Camino, finca La Quinta	4	1	2	3	NCU	Pocosol	12	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial; Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0433	Ent. Cam.# 430 Santa Rosa (0,2km R35)	Fin Camino, finca	4	1,9	2	3	NCU	Pocosol	18	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial; Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0436	Ent. Cam.# 430 Santa Rosa (0,5km R752)	Ent. Cam# 431 Santa Rosa Fte. Plaza	4	0,5	2	3	NCU	Pocosol	24	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial; Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0437	Ent. R.752, Santa Rosa (0,4km del Parque)	Ent. Cam. #197, C. Nieves, Frente Cementerio	4	0,34	2	3	NCU	Pocosol	38	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0438	Ent. R.35, Santa Rosa a 0,5 km de R752	Ent. R.752, Santa Rosa (0,2km del Parque)	4	0,35	1	3	NCU	Pocosol	43	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0439	Ent. R.752, Santa Rosa (0,3km del	Fin Camino, finca Los Mejías	4	1,1	1	2	NCU	Pocosol	12	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0445	Ent. R.752, C. Monterrey (1,4km R004)	Fin Camino, finca Juan González, Las Delicias	4	4,5	2	3	NCU	Monterrey	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0449	Ent. R.734, Cruce La Tigra (2,1 km de Cam#221)	Ent. Cam. #181, Santa Marta (3km Santa Lucía)	4	2,9	4	3	NCU	Venado	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0450	Ent. R.734, La Tigra (2,7 km de Cam#181)	Fin Camino, finca	4	0,3	1	2	NCU	Venado	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0451	Ent. Cam. #181, La Tigra (3 km R-734), Sn Isidro	Lím.Cant.Sn Carlos/Guatuzo, Río Cucaracha	4	2,5	4	3	NCU	Venado	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0452	Ent. Cam.# 451, Sn Isidro (0,4km Rio Cucaracha)	Fin Camino, finca Miguel Vargas	4	0,4	1	1	NCU	Venado	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relaistrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relaistrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0453	Ent. Cam. #181, La Tigra (0,3 km R-734)	Fin Camino, Río Catanurio	4	3	4	3	NCU	Venado	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relaistrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relaistrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0783	Ent. Cam#54, Marsella, Escuela	Fin Camino, Finca Memo Mejía	1	0,5	5	5	NCU	Venecia	39	2018	Mantenimiento rutinario	SDEP	Evacuación Pluvial: Aceras	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0455	Ent. Cam. #88, Escuela Santa Eulalia	Ent. Cam. #64, Cruce a Sangregado	4	3,5	1	3	NCU	Venado	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relaistrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relaistrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0456	Ent. Cam. #87, Esperanza (1,3 km R-734)	Fin Camino, finca Miguel Mora	4	0,8	4	3	NCU	Venado	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relaistrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relaistrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relaistrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0458	Ent. Cam. #86, Finca La Mina (2,6 km R-734)	Fin Camino, finca Victor Julio Murillo	4	3,8	2	3	NCU	Venado	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0459	Ent. R-4, Cruce a Delicias (6km R-734)	Ent. Cam#86, Cruce a Cucaracha (6,3 km R-734)	4	2,4	1	3	NCU	Venado	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0460	Ent. R.142, Fortuna (0,3 km del Cementerio)	Ent. Cam. #64, Alto Monterrey	4	5,6	2	3	NCU	Fortuna	23	2018	Mejoramiento	SDEP	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0461	Ent. Cam# 460, Alto Monterrey (0,2km cam#64)	Fin Camino, finca cam#64)	4	0,3	1	2	NCU	Monterrey	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0462	Ent. Cam. #64, Cruce a la Torre (3,4km Cam#88)	Fin Camino, finca Hubert Solís	4	0,8	1	1	NCU	Monterrey	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0463	Ent. Cam. #64, Cruce a la Torre (1,7km Cam#88)	Fin Camino, finca Claudio Esquivel	4	0,365	2	3	NCU	Monterrey	9		Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
											Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0464	Ent. Cam. #88, Cruce La Torre (2 km Cam#64)	Ent. Cam. #227, Pataste Arriba (0,9m km Esc.)	4	3,7	2	2	NCU	Monterrey	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0465	Ent. Cam. #64, Cruce Alto Mont. (1,5km Cam#460)	Ent. Cam. #227, Pataste Arriba (0,35m km Esc.)	4	2,6	1	3	NCU	Monterrey	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0466	Ent. R.734, Cruce Jicarito (2,4 km R-004)	Fin Camino, finca Felicindo Cubero	4	1,5	2	3	NCU	Venado	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0467	Ent. R.734, Cruce Linda Vista (0,4 km Cam#88)	Fin Camino, finca Alcides Mora	4	1,8	1	2	NCU	Venado	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0468	Ent. R.734, Linda Vista (0,3 km Cam#88)	Ent. R.734, Linda Vista (frente a Cam#88)	4	0,3	4	3	NCU	Venado	26	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0469	Ent. R.734, La Esperanza (2,0 km Cam#88)	Fin Camino, finca La Macaria	4	1,1	3	3	NCU	Venado	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0470	Ent. Cam. #89, Cruce Sn Antonio (0,9km R-04)	Fin Camino, finca	4	0,9	2	3	NCU	Monterrey	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0472	Ent. Cam. #89, Sabalito (0,2 km Escuela)	Fin Camino, finca Hermanos Rojas	4	2,5	1	3	NCU	Monterrey	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0473	Ent. Cam# 472, Sabalito (1,3 km Cam#89)	Fin Camino, finca Guido Muñoz	4	0,4	2	3	NCU	Monterrey	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0475	Ent. Cam. #89, C. San Miguel (1,2km Cam#180)	Fin Camino, finca Klever Alvarez	4	2	2	3	NCU	Monterrey	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0476	Ent. Cam. #89, La Garita, Frente a Plaza	Fin Camino, finca Beto Sandoval	4	2,5	1	1	NCU	Monterrey	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0477	Ent. Cam. #89, La Garita, (3,6 km Cam#180)	Fin Camino, finca	4	1,1	2	3	NCU	Monterrey	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0478	Ent. Cam. #89, San Miguel (0,7km Cam#180)	Lím.Cant. Sn Carlos/Guatuzo	4	4,9	2	3	NCU	Monterrey	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0479	Ent. Cam# 478, Sn Miguel (2,3 km Cam#89)	Fin Camino, finca Paulino Molina	4	1,7	2	2	NCU	Monterrey	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0480	Ent. Cam. #179, Cruce Puerto Seco (3,9km R-4)	Fin Camino, finca El Parque (Río Pataste)	4	1,4	2	3	NCU	Venado	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0481	Ent. R.4, Cruce Jicarito (2,1 km R-734)	Ent. R.734, Jicarito (0,7 km R-4)	4	2,4	2	3	NCU	Venado	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0483	Ent. Cam# 482, San Juan (1,5 km R-04)	Fin Camino, finca Narcizo Vargas	4	0,7	2	3	NCU	Monterrey	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0486	Ent. R.4, Cruce. San Juan (1,4 km Cam#89)	Ent. Cam# 484, San Juan, Iglesia	4	1,1	2	3	NCU	Monterrey	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0487	Ent. R.4, San Antonio (0,6 km R-752)	Ent. Cam. #227, San Antonio (0,1 km R-04)	4	1,8	2	3	NCU	Monterrey	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0488	Ent. Cam. #64, Alto Monterrey (0,1km Cement.)	Ent. Cam# 487, Sn Juan (0,7 km R-04)	4	1,8	1	1	NCU	Monterrey	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0489	Ent. R.4, San Antonio (0,6 km R-752)	Ent. Cam. #89, C. San Antonio (0,2 km R-04)	4	1,09	2	3	NCU	Monterrey	21	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0490	Ent. Cam. #64, Alto Monterrey (0,1km Cement.)	Fin Camino, finca Gerardo Salazar	4	2,8	2	3	NCU	Monterrey	18	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0495	Ent. R.142, Represa Arenal	Ent. Cam. #64, Sangregado (3,3km Cam#87)	4	4,4	1	1	NCU	Fortuna	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0496	Ent. Cam# 495, Sangregado (2,2km R-142)	Fin Camino, finca	4	0,3	1	1	NCU	Fortuna	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0497	Ent. R.142, Represa Arenal (0,8 km Cam#495)	Ent. C.#209, Fte Puesto del MINAE (2,2km R142)	4	4,1	2	3	NCU	Fortuna	17	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0498	Ent. C.#209, Río Agua Caliente (5,4km R142)	Fin Camino, Observatorio Arenal	4	2	3	3	VC	Fortuna	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0499	Ent. R.142, La Palma (Fte a Cabinas Palo Verde)	Fin Camino, finca	4	0,4	2	2	NCU	Fortuna	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0500	Ent. R.142, Zeta Trece (0,55 km Cam#460)	Fin Camino, Tajo Manolos	4	0,6	3	3	NCU	Fortuna	12	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0501	Ent. R.142, Zeta Trece (0,50 km Cam#460)	Fin Camino, Hotel Lomas del Volcán	4	1,6	2	3	NCU	Fortuna	18	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0504	Ent. C.#177, C. Catarata Fortuna (2,1km R702)	Ent. Cam.# 503 (1,3km R-142)	4	0,17	2	2	NCU	Fortuna	32	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0506	Ent. C.#65, Agua Azul (3,5 km de R-142)	Fin Camino, finca Marvin Castro	4	1,3	2	3	NCU	Fortuna	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0510	Ent. R.142, Colegio Fortuna (0,7km de R-702)	Ent. Cam# 509, Fortuna (0,5km R-142)	4	0,2		3	VC	Fortuna	57	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
2-10-0512	Calles Urbanas	Valle del Volcán, Fortuna	4	0,9	4	3	U	Fortuna	47	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0513	Ent. R.702, Cruce a Orquídea (0,4km)	Fin Camino, finca Omar Miranda	4	0,5	2	2	NCU	Fortuna	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0514	Ent. R.702, Cruce a Orquídea (0,2km Cam.#177)	Fin Camino, finca Marco Danielletto	4	0,3	3	2	NCU	Fortuna	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0515	Ent. R.702, Cruce a Orquídea (Frente Cam.#177)	Fin Camino, finca	4	0,3	3	2	NCU	Fortuna	12	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0516	Ent. R-4, Mirador (1,9 km de Cam.#113)	Ent. R-4, Cruce Los Cedros(1,5 km de Cam.#90)	4	0,2	3	2	NCU	Monterrey	12	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0517	Ent. R.141, El Tanque, Plaza	Ent. Cam#70, (0,5km de R-142)	4	1,7	2	3	NCU	Fortuna	15	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial: Cajas de registro, tragantes, cabezales, Tubos de concreto alcantarillado	SD Estructura de Pavimento
										2019	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0518	Ent. Cam.#70, C.El Tanque (1,6km de R-142)	Fin Camino, Río Fortuna	4	0,3	2	2	NCU	Fortuna	9	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0521	Ent. C.#75,Cruce 3 Esquinas (1,2km de Cam#520)	Ent. Cam.#70,Asent. La Pajuela (0,3km Cam#72)	4	1,1	2	3	NCU	Fortuna	18	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0523	Ent. C.#75, 3 Esquinas, Plaza (0,6km de Cam#521)	Lím.Cant. Sn Carlos/Sn Ramón, Río Burro	4	0,6	2	3	NCU	Fortuna	35	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0524	Ent. Cam# 523, 3 Esquinas (0,5km Cam#,75)	Fin Camino, finca Hermanos Cerdas	4	0,4	2	3	NCU	Fortuna	23	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0525	Ent. C.#75, 3 Esquinas (0,9km de	Lím.Cant. Sn Carlos/Sn Ramón,	4	0,7	2	3	NCU	Fortuna	21	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0526	Ent. C.#75, Los Angeles, Cement., Fte Cam#70	Ent. Cam# 527, C. Los Angeles (1km Cam#528)	4	1,1	2	3	NCU	Fortuna	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0527	Ent. C.#75, Los Angeles (0,4km de R-141)	Lím.Cant. Sn Carlos/Sn Ramón, Río Burro	4	2,7	2	3	NCU	Fortuna	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0528	Ent. R.141, Los Angeles (1,0km de Cam#.75)	Ent. Cam#527, C. Los Angeles (1km Cam#526)	4	1,4	2	3	NCU	Fortuna	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0529	Ent. C.#75, Los Angeles (0,3km de R-141)	Ent. Cam.#72, Zona Fluca (0,5km de R-141)	4	1,1	2	3	NCU	Fortuna	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0532	Ent. R.142, El Tanque, Fte Cam#70 (1,1km R-4)	Ent. R.142, Cruce El Tanque (0,6km R-141)	4	1,1	1	2	NCU	Fortuna	18	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0534	Ent. R.142, Cruce El Tanque (0,6km de R-4)	Fin Camino, Río Rurío	4	0,5	2	3	NCU	Fortuna	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0536	Calles Urbanas	El Tanque, Fortuna	4	0,5	2	3	U	Fortuna	46	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial: Cajas de registro, tragantes, cabezales, Tubos de registro alcantarillado, Cordón y caño	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0537	Ent. R.141, El Tanque (0,8km de Cam#66)	Fin Camino, finca Edwin Conejo	4	0,4	2	3	NCU	Fortuna	29	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0538	Ent. R.141, Cruce El Tanque (0,9km de Cam#66)	Fin Camino, Intransitable	4	0,5	2	3	NCU	Fortuna	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0539	Ent. R.141, C. Los Angeles (0,5km de Cam#.72)	Ent. Cam.#69, Sn Isidro (1,6 km R-141)	4	1,6	2	3	NCU	Fortuna	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0540	Ent. Cam.#69, Sn Isidro (1,6 km R-141)	Fin Camino, finca	4	0,3	3	3	NCU	Fortuna	6	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0541	Ent. Cam.#68, C. Sn Jorge (0,9km de Cam#.69)	Fin Camino, finca Durán	4	1	2	3	NCU	Fortuna	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0542	Ent. R.4, Sn Jorge (0,6km de Cam#.66)	Ent. Cam.#68, C. Sn Jorge (1,8km de Cam#.69)	4	0,2	2	3	NCU	Fortuna	29	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0543	Ent. R.141, C. Los Angeles (1,1km de Cam#.75)	Fin Camino, finca	4	1,1	2	3	NCU	Fortuna	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0544	Ent. R.141, La Perla (1,4 km de	Fin Camino, finca Alin Cordero	4	0,2	2	3	NCU	Fortuna	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0545	Ent. R.141, La Perla, Fte a Cam.#544	Fin Camino, Quebrador La Perla	4	1,9	3	3	VC	Fortuna	30	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Mantenimiento de puentes vehiculares, Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0548	Ent. Cam.#35, Bonanza (1,6km de R-141)	Fin Camino, finca Dello Quesada	4	1	3	3	NCU	Florencia	18	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0550	Ent. R.141, Cruce La Vega (0,3km de Cam#35)	Fin Camino, finca Carlos Castillo	4	2,6	4	3	VC	Florencia	47	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0551	Calles Urbanas	Asentamiento La Ulima, Florencia	4	0,5	2	3	U	Florencia	50	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0552	Ent. R.141, Cruce La Vega (0,9km de Cam#551)	Fin Camino, finca Fredy Arana	4	0,9	2	3	NCU	Florencia	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0553	Ent. Cam.#167, Cruce La Vega (0,65km R-141)	Fin Camino, finca Ernesto Arguello	4	0,4	2	3	NCU	Florencia	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0554	Ent. Cam.#168, Cruce La Vega (3,0km R-141)	Fin Camino, Quebrada sin Nombre	4	0,8	2	2	NCU	Florencia	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0555	Ent. Cam.#168, Cruce La Vega (2,1 km R-141)	Fin Camino, finca I.T.C.R.	4	0,5	2	2	NCU	Florencia	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0556	Ent. Cam.#168, Cruce La Vega (2,0 km R-141)	Fin Camino, finca Mario Barrientos	4	1,5	2	2	NCU	Florencia	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0557	Ent. Cam.#168, Cruce La Vega (1,7 km R-141)	Fin Camino, finca Arnoldo Valverde	4	0,9	2	3	NCU	Florencia	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0558	Calles Urbanas	La Vega, Florencia	4	0,5	2	3	U	Florencia	43	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				
2-10-0560	Ent. Cam.#34, Cruce a Jabillos (2km de R-141)	Fin Camino, finca Enrique Solís	4	1,4	2	3	NCU	Florencia	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0562	Ent. Cam.#33, Cruce a Molinos (0,7km de R-141)	Fin Camino, finca	4	0,7	2	2	NCU	Florencia	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0563	Ent. Cam.#33, Cruce a Molinos (0,7km de R-141)	Ent. Cam.#168, Cruce La Vega (1,5 km R-141)	4	1,7	2	3	NCU	Florencia	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0564	Ent. R.4, San Cristóbal, Fte Cam#69	Fin Camino, Río Arenal	4	0,4	3	3	NCU	Fortuna	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0565	Ent. Cam.#93, Cruce San José Cutris (4,2km R-4)	Fin Camino, finca José Alberto Rojas	4	0,8	3	3	NCU	Cutris	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0567	Ent. R.4, San José Cutris (0,4km de Cam#566)	Ent. C#93, C. a San José Cutris (3km R-4)	4	1,4	2	3	NCU	Cutris	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0568	Ent. R.4, San José Cutris (1,5km de Cam#567)	Ent. C#93, C. a San José Cutris (1,5km R-4)	4	1,1	2	3	NCU	Cutris	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0569	Ent. Cam.#192, La Unión (0,4 km Cam#570)	Ent. Cam#574, La Unión (0,6km Cam#192)	4	0,4	3	3	NCU	Monterrey	18	2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0570	Ent. Cam.#192, La Unión, Plaza	Fin Camino, finca	4	0,9	2	2	NCU	Monterrey	18	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0571	Ent. Cam.#192, La Unión (1,9 km Cam.#11)	Fin Camino, finca Carlos Alvarado	4	2	2	3	NCU	Monterrey	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0572	Ent. Cam#571, La Unión (1,0km Cam#192)	Fin Camino, finca	4	0,9	1	1	NCU	Monterrey	16	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0573	Ent. Cam#571, La Unión (0,2km Cam#192)	Fin Camino, finca	4	0,54		3	NCU	Monterrey	10	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0574	Ent. Cam.#192, Cruce Mirador (0,6km Cam#11)	Fin Camino, finca Primo	4	1,1	2	3	NCU	Monterrey	19	2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0576	Ent. Cam.#92, C. Montelimar (1,4km Cam#191)	Fin Camino, finca	4	1,7	2	3	NCU	Pocosol	13	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
2-10-0579	Ent. Cam.#92, C. Esterito (0,9km Cam#581)	Ent. Cam#580, Cruce Esterito (1,3km Cam#192)	4	1,4	2	3	NCU	Pocosol	19	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	"Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0580	Ent. Cam.#92, C. Esterito (0,4km Cam#581)	Fin Camino, finca Jeannette Rodríguez	4	2,2	3	3	NCU	Pocosol	19	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	"Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION	CONFORMACION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMA DO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0581	Ent. Cam.#92, Esterito, Iglesia (0,9km Cam#579)	Fin Camino, Estero, Finca	4	4,5	2	3	NCU	Pocosol	19	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	"Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado"	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0583	Ent. R.35, Cruce a Buenos Aires (0,6km R-227)	Ent. Cam.#92, C. Terrón Colorado (0,4km R-35)	4	1,9	4	3	NCU	Pocosol	25	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0586	Ent. Cam.#224, C. Buenos Aires (0,3km Cam#91)	Ent. Cam#584, Asent. Sn Miguel (1,9km Cam#92)	4	0,48	1	3	NCU	Pocosol	25	2018	Mejoramiento, Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Lastrados, Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0587	Calles Urbanas	Asentamiento San Miguel, Pocosol	4	0,7	2	2	U	Pocosol	29	2018	Mejoramiento, Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Lastrados, Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0588	Ent. R.35, Terrón Colorado, Frente a Camino #92	Fin Camino, Río San Carlos	4	0,3	2	3	NCU	Pocosol	29	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0591	Ent. Cam#586, C. Buenos Aires (0,2km Cam#224)	Fin Camino, Parcelas San Miguel	4	1,7	1	1	NCU	Pocosol	10	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0593	Ent. Cam.#191, C. San Andrés (1,9km Cam#11)	Fin Camino, Finca Punto Rojo	4	0,5	3	3	NCU	Pocosol	18	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0594	Ent. Cam.#191, San Andrés (1,8km Cam#593)	Fin Camino, Finca Punto Rojo	4	0,4	3	3	NCU	Pocosol	18	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0595	Ent. Cam.#191, San Andrés (0,3km Cam#594)	Fin Camino, Finca Eliecer Arias	4	0,4	3	3	NCU	Pocosol	19	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0596	Ent. Cam.#191, San Andrés (0,3km Cam#595)	Ent. Cam.#196, San Diego (1km Escuela)	4	3	2	3	VC	Pocosol	19	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0597	Ent. R.752, Cruce Santa Rosa (0,1km Cam#91)	Fin Camino, Finca Sidales Hidalgo	4	1,3	3	3	NCU	Pocosol	19	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados	
											2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
											2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
											2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
											2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0599	Ent. Cam.#196, C. San Diego (2,1km Cam#91)	Fin Camino, Río Pocosol, Finca Eliecer A.	4	0,2	2	3	NCU	Pocosol	13	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados	
											2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
											2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
											2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
											2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0602	Ent. Cam.#196, Sn Diego, Frente a Escuela	Fin Camino, Finca Felix Alpizar	4	0,5	1	3	NCU	Pocosol	3	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados	
											2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
											2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
											2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
											2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0603	Calles Urbanas	San Diego, Pocosol	4	0,3	2	2	U	Pocosol	34	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados	
											2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
											2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
											2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
											2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0605	Ent. R.35, Cruce Santa Rosa (0,4km Cam#26)	Ent. Cam.#197, C. Las Nieves (0,1km R-35)	4	0,7	1	3	NCU	Pocosol	12	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0606	Ent. Cam.#91, Plaza Buenos Aires (0,6km R-35)	Fin Camino, Finca Tobías Villegas	4	0,49	1	3	NCU	Pocosol	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0608	Calles Urbanas	Terrón Colorado, Pocosol	4	1	2	3	U	Cutris	40	2018	Mejoramiento, Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Lastrados, Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0610	Ent. Cam#609, Lago Cutris (2,2km R-35)	Fin Camino, Finca	4	0,5	2	3	VC	Cutris	16	2018	Mejoramiento, Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Lastrados, Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0611	Urbanizacion Calles Urbanas	Ingenio, Boca Arenal, Cutris	4	0,5	3	3	U	Cutris	43	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				
2-10-0614	Ent. R-35, Cruce a Muelle (0,9km Cam#613)	Fin Camino, Finca Eli Salazar	4	3	2	3	NCU	Cutris	16	2018	Mejoramiento, Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Lastrados, Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0617	Ent. R-35, Muelle (0,2km Salón Comunal)	Fin Camino, Finca Chiroides	4	0,4	2	3	NCU	Florencia	39	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0618	Ent. R.4, Cruce a Muelle (0,2km R-35)	Fin Camino, Finca	4	0,2	2	2	NCU	Florencia	16	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0619	Ent. R.4, Cruce a Muelle (0,2km R-35)	Ent. R-35, Cruce a Muelle (0,1km R-4)	4	0,2	2	3	NCU	Florencia	32	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado y Aceras	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0620	Ent. R.4, Cruce a Muelle (1,3km R-35)	Fin Camino, Finca Alcides Chiroides	4	0,8	2	3	NCU	Palmera	13	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0624	Ent. Cam#621, Cruce a Muelle (0,3km R-4)	Ent. Cam#625, Cruce a Unión (0,5km Cam#622)	4	0,2	1	3	NCU	Palmera	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0625	Ent. R.748, Sn Rafael, Frente a Plaza	Ent. Cam#622, Cruce a Unión (1,1km R-4)	4	4,4	1	3	NCU	Palmera	19	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0626	Ent. R.747, Cruce a Villa María (1,2km R-4)	Fin Camino, Finca Los Gamboa	4	1,1	3	3	NCU	A.Zarcas	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0628	Ent. Cam#627, Cruce a Cerro Cortés (0,5km R-4)	Fin Camino, Río Aguas Zarcas	4	1,2	3	3	NCU	A.Zarcas	19	2018	Mejoramiento	CPV	No aplica	Construcción de puentes vehicular
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0631	Ent. Cam#630, Cruce a Cerro Cortés (0,3km R-4)	Fin Camino, Río Kopper	4	0,5	2	3	NCU	A.Zarcas	12	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0632	Ent. R.4, Cruce a Cerro Cortés (0,05km Cam#630)	Ent. Cam#633, C. a Cerro Cortés (0,4km Cam#627)	4	1,6	2	2	NCU	A.Zarcas	19	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0633	Ent. R.4, Cruce a Concepción, Frente Cam#84	Ent. Cam#627, C. a Cerro Cortés (1,4km R-747)	4	1,4	1	1	NCU	A.Zarcas	15	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0636	Ent. R.747, Kopper (0,4km Cam.#627)	Fin Camino, finca Oscar Acuña	4	1,7	2	3	NCU	A.Zarcas	33	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0637	Ent. R-751, Altamira (1.0km Cam.#638)	Fin Camino, finca Carlos Acuña	4	1,7	3	3	NCU	A.Zarcas	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0638	Ent. R-751, Cruce a Caño Negro (0,3km Cam#97)	Fin Camino, finca Custodio Alfaro	4	1,2	2	3	NCU	A.Zarcas	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0638	Ent. R-751, Cruce a Caño Negro (0,3km Cam#97)	Fin Camino, finca Custodio Alfaro	4	0,8	2	3	NCU	Cutris	22	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0639	(ENT C 169) CAÑO NEGRO	(ENT C 169) CAÑO NEGRO	4	4,7	3	2	NCU	A.Zarcas	32	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0640	Ent. R-749, Cruce La Gloria (1,5km Cam#169)	Ent. Cam#347, C. a Vasconia (0,7km Cam.#641)	4	2,4	4	3	NCU	A.Zarcas	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0642	Ent. Cam#640, Cruce La Gloria (2km de R-749)	Fin Camino, finca Henry Aguilar	4	0,4	2	3	NCU	A.Zarcas	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0643	Ent. Cam#640, Cruce La Gloria (1,7km de R-749)	Fin Camino, Asentamiento Azalucy	4	0,6	1	3	NCU	A.Zarcas	10	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0644	Ent. R-749, La Gloria, Plaza (1km Cam.#640)	Ent. Cam#645, La Gloria (0,7km de R-749)	4	0,4	2	3	NCU	A.Zarcas	18	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0645	Ent. R-749, La Gloria (0,7km Cam.#644)	Fin Camino, Río Tres Amigos	4	0,9	3	3	NCU	A.Zarcas	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0646	Ent. R-749, Cruce La Gloria (0,7km Cam.#641)	Fin Camino, Río Tres Amigos	4	1,9	2	3	NCU	A.Zarcas	19	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0652	Ent. R-749, Santa Fe, A.Z. (1,1km R-751)	Fin Camino, finca Hermanos Camacho	4	1	1	2	NCU	A.Zarcas	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0654	Ent. R-751, Los Llanos (0,9km R-749)	Fin Camino, finca	4	0,7	3	3	NCU	A.Zarcas	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0657	Ent. R-746, El Pegón (0,2km R-250)	Ent. R-746, Cruce Pegón (0,9km Cam#659)	4	1,3	2	3	NCU	Pital	19	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0658	Ent. Cam#657, Cruce Pegón (0,6km R-746)	Fin Camino, finca	4	0,3	2	3	NCU	Pital	33	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0660	Ent. R-746, Cruce Pegón (0,6km Cam#659)	Fin Camino, finca	4	0,6	1	1	NCU	Pital	16	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0664	Ent. Cam.#176, La Trinchera (0,7km Cam#663)	Fin Camino, finca Río Toro	4	0,8	2	3	NCU	Pital	25	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0665	Ent. Cam.#176, C. La Trinchera (1,1km Cam#664)	Fin Camino, finca	4	0,6	2	3	NCU	Pital	19	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0672	Calles Urbanas	La Legua, Pital	4	0,3	1	3	U	Pital	12	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019				
										2020				
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2022				
2-10-0674	Ent. Cam#673, Santa Elena (0,8km Cam#55)	Fin Camino, finca José Guerrero	4	0,3	2	3	NCU	Pital	24	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0675	Ent. Cam#673, Santa Elena (0,4km Cam#674)	Fin Camino, Río Tres Amigos, Lím. Distr. Pital/A.Z.	4	2,9	2	3	NCU	Pital	30	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0676	Ent. Cam#675, C. Santa Elena (2,7km Cam#673)	Fin Camino, finca Quido Arce	4	0,3	2	3	NCU	Pital	22	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0677	Ent. Cam.#55, Piedra Alegre (0,6km Cam#309)	Ent. Cam#675, C. Santa Elena (0,5km Cam#673)	4	2,6	2	3	VC	Pital	30	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0678	Ent. Cam#677, Santa Elena (0,2km Cam#675)	Fin Camino, Río Tres Amigos, Lím.Distr.Pital/A.Z.	4	2,8	2	3	NCU	Pital	22	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0680	Ent. Cam#677, Piedra Alegre (0,3km Cam#55)	Ent. Cam#677, C. Santa Elena (0,5km Cam#678)	4	2,9	3	3	NCU	Pital	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0681	Ent. Cam#680, C. Piedra Alegre (0,9km Cam#677)	Fin Camino, Río Tres Amigos, Lím.Distr.Pital/A.Z.	4	1,3	2	3	NCU	Pital	13	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0682	Ent. Cam#681, C. Piedra Alegre (0,9km Cam#680)	Fin Camino, finca Valle Azul	4	0,3	2	3	NCU	Pital	13	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0683	Ent. Cam#673, C. Los Angeles (1,2km Cam#675)	Fin Camino, finca	4	0,9	2	3	NCU	Pital	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0685	Calles Urbanas	Coopelsabel, Pital	4	0,2	2	3	U	Pital	46	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
2-10-0686	Ent. Cam.#56, El Encanto (0,8km R-250)	Fin Camino, finca Eduvino Vega	4	0,6	2	3	NCU	Pital	19	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0689	Ent. Cam#59, Cruce 4 Esquinas (1,8km Cam#57)	Fin Camino, finca los Curpia	4	0,3	2	3	NCU	Pital	25	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0691	Ent. Cam#59, Cruce 4 Esquinas (1,2km Cam#690)	Fin Camino, finca Augusto Cesar Su Villalobos	4	0,2	2	3	NCU	Pital	19	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0693	Ent. Cam#692, Cruce EL Carmen (0,2km Cam#57)	Fin Camino, finca Edwin Miranda	4	0,3	2	3	NCU	Pital	19	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0694	Calles Urbanas	Los Angeles, Pital	4	0,4	2	3	U	Pital	34	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0696	Ent. Cam#56, Los Angeles (0,3km Cam#695)	Fin Camino, finca Iginio Porras	4	0,8	2	2	NCU	Pital	7	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0697	Ent. Cam#56, Los Angeles (0,4km Cam#696)	Fin Camino, finca Marvin Araya	4	0,7	2	2	NCU	Pital	3	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0698	Calles Urbanas	El Carmen, Pital	4	0,6	1	2	U	Pital	20	2018				
										2019				
										2020				
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2022				



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0700	Ent. Cam#57, Cruce 4 Esquinas (1,2km Cam#692)	Fin Camino, finca Jaime Mayorga Morales	4	0,8	3	3	NCU	Pital	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0702	Ent. Cam#57, Cruce 4 Esquinas (0,4km Cam#59)	Fin Camino, finca Orlando Alvarez	4	0,8	2	3	NCU	Pital	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0707	Calles Urbanas	Asent. La Hermandad, Puerto Escondido, Pital	4	0,3	2	3	U	Pital	38	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0710	Ent. R-250, Pital (0,8km Cam#61)	Fin Camino, finca Raúl Lara	4	0,4	2	2	NCU	Pital	29	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0914	Ent. Cam#20, San Luis (0,5km R-141)	Fin Camino Finca Rafa Pérez Parra	1	0,26	5	5	NCU	Florencia	15	2018	Mantenimiento rutinario	BA	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
2-10-0712	Ent. R-744, Cruce a Pital (1,6km R-250)	Fin Camino, finca Rosario González	4	0,5	2	3	NCU	Pital	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0915	Ent. Cam#20, San Luis (0,5km Cam#914)	Fin Camino Finca, Entrada Acueducto Rural	1	0,23	5	5	NCU	Florencia	20	2018	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Conformación, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario	SDRC	No aplica	Recarpeteo
										2022	Mantenimiento Rutinario	SDRC	No aplica	Recarpeteo
2-10-0715	Ent. Cam#52, Cruce La Huacas (1,2km Cam#49)	Fin Camino, finca Francisco Herrera	4	0,8	3	3	NCU	Venecia	16	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0716	Ent. R-250, Cruce Las Delicias (2km Cam#60)	Ent. Cam#41, Pitalito (0,8km Cam#47)	4	0,9	3	3	NCU	A.Zarcas	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0718	Ent. R-250, Cruce Las Delicias (1,4km Cam.#716)	Fin Camino, finca Montealegre	4	0,8	2	3	NCU	A.Zarcas	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0722	Ent. Cam #721, Cruce Las Delicias (0,3km R-250)	Fin Camino, finca Miguel Sánchez	4	0,3	1	3	NCU	A.Zarcas	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0723	Ent. Cam#41, Cruce Esquipulas (1,0km R-250))	Fin Camino, finca Anibal Quesada (Tanque Acued)	4	0,3	2	2	NCU	A.Zarcas	13	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0725	Ent. Cam#147, Cruce Pitalito (0,03km Cam#724)	Fin Camino, finca Alfredo Alfaro	4	0,3	2	3	NCU	A.Zarcas	35	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0727	Ent. R-250, Los Chiles (0,3km Cam #726)	Fin Camino, finca María Los Angeles Rodríguez	4	1,5	2	3	NCU	A.Zarcas	13	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Cajas de registro, tragantes, cabezales, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0729	Ent. Cam#41, Concepción (1,0km Cam#40)	Fin Camino, finca Gerardo Barrantes	4	0,6	2	3	NCU	A.Zarcas	25	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0730	Calles Urbanas	Pitalito, Aguas Zarcas	4	0,4	2	3	U	A.Zarcas	26	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0731	Ent. Cam#47, Cruce Pitalito (0,8km Cam#41)	Fin Camino, Río Los Negritos	4	0,9	2	3	NCU	Venecia	3	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0732	Ent. Cam#47, Urb.Nazaret, (0,5km Cam#146)	Fin Camino, finca Rafael Torres	4	0,05	2	3	NCU	Venecia	32	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0734	Ent. Cam#47, C. Buenos Aires (0,15km Cam#733)	Fin Camino, finca	4	0,2	2	2	NCU	Venecia	29	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0736	Ent. Cam#84, Cement. Palmera (0,5km R-748)	Fin Camino, finca Raúl Acuña	4	0,6	3	NCU	Palmera	16	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Cajas de registro, tragantes, cabezales, Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados	
									2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados	
									2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación	
									2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados	
									2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación	
2-10-0738	Ent. Cam#737, Cruce La Caldera (1,1km Cam#84)	Fin Camino, finca Río Kopper	4	0,3	2	3	NCU	Palmera	13	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0740	Ent. R-747, Cruce a Sn Fco. (0,25km R-4)	Fin Camino, finca Familia Porras	4	0,3	2	2	NCU	Palmera	16	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0742	Calles Urbanas	San Francisco, La Palmera	4	0,6	2	3	U	Palmera	46	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	"Evacuación Pluvial: Cajas de registro, tragantes, cabezales, Tubos de concreto alcantarillado, Cordón y Caño "	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0743	Ent. R-747, Cruce a Sn Fco. (0,30km Cam#623)	Fin Camino, finca Cucuy	4	0,8	2	3	NCU	Palmera	19	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0745	Ent. Cam#85, La Palmera (0,7km R-748)	Fin Camino, finca Juan Luis Ugalde	4	0,4	2	2	NCU	Palmera	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0746	Ent. Cam#85, Cruce La Palmera (1,0km Cam#745)	Fin Camino, Casa Máquinas Proyecto Hidreléctrico	4	0,3	3	3	NCU	Palmera	25	2018	Rehabilitación, Mejoramiento	SDEP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado"	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0748	Ent. Cam#85, Cruce La Palmera (0,2km Cam#746)	Fin Camino, finca Erick	4	0,3	2	3	NCU	Palmera	13	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0756	Ent. R-748, Cruce a Snta Rosa (0,3km Cam#755)	Fin Camino, finca el Salvadoreño	4	0,2	2	3	NCU	Palmera	15	2018	Rehabilitación, Mantenimiento Periódico	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0760	Ent. R-140, La Marina (0,3km R-748)	Ent. R-140, La Marina (0,5km R-748)	4	1,7	2	3	NCU	Palmera	21	2018	Mejoramiento	LTMJ	No aplica	Movimiento de Tierra, ampliación de caminos
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0761	Ent. R-140, La Marina (0,2km R-748)	Fin Camino, finca Carlos Chacón	4	0,4	2	3	NCU	Palmera	36	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0765	Ent. Cam#133, C. Corazón Jesús (1,8km Cam#14)	Fin Camino, finca Henry Alfaro	4	0,5	2	3	NCU	Quesada	19	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0767	Ent. Cam#766, Cruce Sn Ramón (0,4km Cam#14)	Fin Camino, finca Jorge Miranda	4	0,4	1	3	NCU	Quesada	16	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0770	Ent. R-35, Platanar, Cementerio (0,5km R-748)	Fin Camino, Finca Omar Cordero	4	2,2	2	3	NCU	Florencia	16	2018	Mantenimiento rutinario	LTMR	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0939	Calles Urbanas	Sucre, Ciudad Quesada	1	1,2	5	5	U	Quesada	48	2018	Mantenimiento rutinario	BA	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical, Bacheo en asfalto
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario	BA	No aplica	Bacheo en Asfalto
2-10-0771	Calles Urbanas	Platanar, Florencia	4	0,492	3	3	U	Florencia	37	2018				
										2019				
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0773	Calles Urbanas	Barrio Corazón de Jesús, Venecia	4	0,84	3	3	U	Venecia	43	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0775	Ent. Cam#774, Cruce Los Chiles (0,02km R-751)	Fin Camino, finca Edgar Jara	4	0,3	1	1	NCU	A.Zarcas	13	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0778	Ent. Cam#54, Cruce a Marsella (2,1km R-140)	Fin Camino, Finca Recreo Verde	4	0,6	1	2	VC	Venecia	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMA DO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0942	Ent. R-141, Puente Casa (0,2km Cam#943)	Fin Camino, Tanque Acueducto Florencia	4	0,4	5	5	VC	Quesada	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2022	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0779	Ent. Cam#54, Cruce a Marsella (2,0km R-140)	Fin Camino, Finca Alex Arce	4	1,2	2	2	VC	Venecia	20	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
2-10-0782	Ent. Cam#54, Cruce a Marsella (0,1km Escuela)	Río Toro, Lím.Cantonal San Carlos/Grecia	4	0,8	1	1	NCU	Venecia	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0783	Ent. Cam#54, Marsella, Escuela	Fin Camino, Finca Memo Mejía	4	0,2	3	3	NCU	Venecia	29	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0785	(ENT C 126) C. Marsella (0,1Km R-140)	Fin Camino, Finca Rolando Vargas	4	2,8	3	3	NCU	Venecia	22	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0788	Ent. R-140, Cruce Sn Martin (0,2km Cam#143)	Ent. Cam#785, C. Jardín (0,3km Cam#126)	4	0,5	3	2	NCU	Venecia	35	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0789	Ent. Cam#143, C. Sn Martin (2,8km R-140)	Fin Camino, Finca La paila	4	0,6	1	1	NCU	Venecia	7	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0791	Ent. Cam#149, C. Pueblo Viejo (0,4km Cam#114)	Fin Camino, Reserva Forestal Rodríguez	4	2,3	2	3	VC	Venecia	16	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0793	Ent. Cam#148, Los Alpes (0,2km Cam#115)	Fin Camino, Finca Sandro Pacheco	4	0,2	4	3	NCU	Venecia	33	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0947	Calles Urbanas	Barrio Los Angeles, Ciudad Quesada	2	1,267	5	5	U	Quesada	46	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2020	Mantenimiento Rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
										2022	Rehabilitación		Evacuación Pluvial	
2-10-0795	Ent. Cam#150, Pueblo Viejo (0,4 Cam#148)	Fin Camino, Finca Fernando Obando	4	0,5	1	1	NCU	Venecia	13	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0796	Ent. Cam#44, C. Pueblo Viejo (0,15 Cam#30)	Ent. Cam#150, C. Pueblo Viejo (0,4km Cam#148)	4	0,4	2	3	NCU	Venecia	28	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0798	Ent. Cam#49, Sn Cayetano (0,5km R-140)	Fin Camino Finca Heglenka	4	2,2	3	3	NCU	Venecia	30	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0799	Ent. Cam#49, Las Huacas (0,4km Cam#52)	Fin Camino Finca Eladio Herrera	4	0,4	1	3	NCU	Venecia	30	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0801	Ent. Cam#47, Buenos Aires (0,02km R-140)	Fin Camino Finca Guillermo Herrera	4	0,4	2	3	NCU	Venecia	13	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0803	Ent. R-140, C. La Unión (0,4km Cam#804)	Ent. Cam#30, La Unión (1,1km Cam#46)	4	0,004	3	3	NCU	Venecia	43	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0804	Ent. R-140, C. Sn Cayetano (0,2km Cam#148)	Ent. Cam#30, C. La Unión (0,3km Cam#794)	4	0,9	3	3	NCU	Venecia	30	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0805	Ent. Cam#30, La Unión (0.1km Cam#116)	Fin Camino Finca Pipo Sánchez	4	0,2	2	3	NCU	Venecia	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0809	Ent. Cam#119, Garabito (0,35km Cam#810)	Fin Camino, Quebrada Pericos	4	0,2	1	1	NCU	A.Zarcas	15	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial:Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0812	Ent. Cam#120, San Bosco (0,4km Cam#119)	Fin Camino, parque Nacional Juan Castro Blanco	4	0,57	1	3	NCU	A.Zarcas	6	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0814	Ent. Cam#42, Monte Cristo (0,5km Cam#813)	Ent. Cam#42, Monte Cristo (Fte a Cam#815)	4	0,3	1	3	NCU	A.Zarcas	32	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0817	Ent. Cam #816, Garabito (0,25km Cam#119)	Fin Camino Finca Miguel Rojas	4	0,2	2	2	NCU	A.Zarcas	23	2018	Rehabilitación	EPCA	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado, Cajas de registro, tragantes, cabezales	
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0819	Ent. R-140, Aguas Zarcas (0,3km Cam#820)	Fin Camino Finca Bernardo Rodríguez	4	0,9	2	3	NCU	A.Zarcas	13	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0820	Ent. R-140, C. La Marina (0,1km Cam#135)	Fin Camino Finca Remigio Vargas	4	0,4	2	2	NCU	Palmera	16	2018	Rehabilitación, Mejoramiento, Mantenimiento Periódico	LYMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados, Movimiento de Tierra, ampliación de caminos
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0822	Ent. R-140, C. La Marina (0,2km Cam#760)	Fin Camino Finca José Joaquín Salas	4	0,6	3	3	NCU	Palmera	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0959	Calles Urbanas	La Llanada, Ciudad Quesada	4	1,1	5	5	U	Quesada	12	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2022				



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0824	Ent. R-140, San Juan (0,4km Cam#15)	Fin Camino Finca Emel Avila	4	0,2	1	2	NCU	Quesada	26	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0825	Ent. R-140, San Juan, Escuela (0,1km Cam#238)	Fin Camino Finca Hortensia Gamboa	4	0,03	2	3	NCU	Quesada	26	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0826	Ent. Cam#238, Sn Juan (1,2km R-140)	Fin Camino Finca Marcos Araya	4	1,6	1	3	NCU	Quesada	7	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0828	Ent. R-141, Puente Casa (0,3km Cam#19)	Ent. Cam#206, Barrio Los Angeles (0,1km R-141)	4	0,213	1	3	NCU	Quesada	7	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0829	Ent. Cam#76, C. Sn Miguel (5,9km R-702)	Fin Camino Finca Los Sánchez	4	0,7	1	1	NCU	La Tigra	3	2018	Mantenimiento Periódico	MPP	No aplica	Mantenimiento de puentes peatonales
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0830	Ent. Cam#77, San José, La Tigra (0,9km R-702)	Ent. Cam#76, C. Sn Miguel (1,3km R-702)	4	0,15	2	3	NCU	La Tigra	19	2018	Mantenimiento Periódico, Mejoramiento	LTMP	No aplica	Construcción de puentes vehicular, Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0831	Ent. Cam#77, San José, La Tigra (0,6km R-702)	Ent. Cam#76, C. Sn Miguel (0,6km R-702)	4	0,4	1	3	NCU	La Tigra	33	2018	Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario		No aplica	Conformación, Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0833	Ent. Cam#78, San José, La Tigra (0,1km Cam#77)	Fin Camino Finca Gerardo Morales Ulate	4	0,8	3	3	NCU	La Tigra	33	2018	Mejoramiento, Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial: Cunetas, Cajas de registro, tragantes, cabezales	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0834	Ent. Cam#78, C. Sn Rafael (0,8km Cam#833)	Fin Camino Finca Marvin Méndez	4	0,4	2	2	NCU	La Tigra	19	2018	Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Conformación, Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0837	Ent. Cam#80, Cerritos (2,4km R-702)	Lím.Cant. Sn Carlos/Sn Ramón, Río Esperanza	4	1,9	1	3	NCU	La Tigra	13	2018	Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Conformación, Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0838	Calles Urbanas	Concepción, La Tigra	4	0,6	2	2	U	La Tigra	12	2018	Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Conformación, Relastrados
										2019				
										2020				
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2022				



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0840	Calles Urbanas	La Esperanza, La Tigra	4	0,7	2	2	U	La Tigra	32	2018	Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Conformación, Relastrados
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				
2-10-0842	Ent. Cam#152, Cruce La Lucha (0,7km cam#210)	Fin Camino Finca Miguel Angel Salazar	4	0,7	2	3	NCU	La Tigra	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0843	Ent. Cam#842, C. La Lucha (0,2km Cam#152)	Fin Camino, Río La Esperanza	4	0,3	1	3	NCU	La Tigra	13	2018	Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Conformación, Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0845	Ent. R-702, C. Sn Miguel (0,2km R-738)	Ent. Cam#212, C. Sn José, Tigra (0,45km R-702)	4	1,1	3	3	NCU	La Tigra	19	2018	Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Conformación, Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0848	Ent. Cam#152, Cruce a Futuro (0,7km R-738)	Ent. Cam#211, Cruce La Lucha (0,6km R-738)	4	0,3	2	3	NCU	La Tigra	28	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0850	Ent. Cam#213, La Lucha (0,025km Cam#152)	Ent. Cam#152, Cruce a Futuro (1,0km Cam#848)	4	1,1	2	3	NCU	La Tigra	28	2018	Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Conformación, Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0851	Ent. Cam#152, Cruce a Futuro (1km Cam#213)	Ent. Cam#850, Futuro (0,1km Cam#152)	4	1,1	1	3	NCU	La Tigra	22	2018	Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Conformación, Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0852	Ent. Cam#152, Calle la Esperanza (1,25km Cam#851)	Lím. Cant. S. Carlos / San Ramón, Río La Esperz	4	0,4	2	2	NCU	La Tigra	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO N°	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0853	Ent.Cam#152,La Esperanza (0,3km Cam#207)	Fin Camino Río San Lorenzo	4	0,5	2	2	NCU	La Tigra	26	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0855	Calles Urbanas	El Futuro, La Tigra	4	0,4	1	1	U	La Tigra	37	2018	Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Conformación, Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				
2-10-0857	Ent. R-141, C. A Jabillos (1,45km)	Fin Camino Finca Mario Solano	4	0,8	1	2	NCU	Florencia	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0858	Ent. R-141, Chaparral (1,6km Cam#857)	Fin Camino Finca Victor Manuel García Zúñiga	4	0,2	2	2	NCU	Florencia	26	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0860	Calles Urbanas	Santa Clara, Florencia	4	0,6		3	U	Florencia	54	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mejoramamiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
2-10-0861	Ent. R-739, Santa Rita (0,4km Cam#128)	Fin Camino, Alto La Gloria	4	1,5	1	3	NCU	Florencia	9	2018	Mejoramamiento	SDC	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2019	Mejoramamiento	SDC	No aplica	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0863	Ent. R-739, C. Santa Rita (0,7km Cam#864)	Fin Camino Finca Omar Chavarría	4	0,4	1	1	NCU	Florencia	9	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(K.m.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0864	Ent. R-739, C. Santa Rita (0,7km Cam#863)	Fin Camino Finca Purruja	4	1	1	3	NCU	Florencia	9	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0865	Calles Urbanas	Santa Rita, Florencia	4	0,5	2	3	U	Florencia	18	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Conformación
										2019				
										2020				
										2021	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2022				
2-10-0866	Ent. Cam#215, C. Santa Clara (0,65km Cam#867)	Fin Camino Finca Corrales Corrales Ltda.	4	0,3	1	2	NCU	Florencia	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0867	Ent. Cam#215, Santa Clara (0,7km R-141)	Fin Camino Finca Fernando Picado	4	0,3	1	2	NCU	Florencia	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO N°	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0868	Ent. R-141, Santa Clara (0,3km Cam#25)	Fin Camino Finca Los Corrales	4	0,6	2	2	NCU	Florencia	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
									2018					
									2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados	
									2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación	
									2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados	
									2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación	
2-10-0871	Calles Urbanas	San Francisco, Florencia	4	0,3	2	2	U	Florencia	26	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				
2-10-0872	Ent. Cam#22, C. San Francisco (0,8km Cam#23)	Fin Camino Finca Melvin Murillo	4	0,68	1	3	NCU	Florencia	10	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0873	Calles Urbanas	Peje Viejo, Florencia	4	0,4	2	3	U	Florencia	29	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				
2-10-0875	Ent. Cam#25, Peje Viejo (0,4km Cam#36)	Fin Camino, Río Peje Viejo	4	0,2	2	2	NCU	Florencia	7	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0876	Ent. Cam#25, Cuestillas (1,3km Cam#875)	Ent. Cam#25, Cuestillas (1,4km R-141)	4	0,3	1	3	NCU	Florencia	35	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0877	Calles Urbanas	Cuestillas, Florencia	4	0,5	2	3	U	Florencia	40	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				
2-10-0880	Ent. Cam#27, C.San Juan (0,3km Cam#879)	Fin Camino Finca Laudencio Huertas	4	1,2	2	2	NCU	Florencia	10	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0882	Ent. Cam#27, C.San Juan (0,15km R-748)	Ent. Cam#770, Platanar (0,5km R-35)	4	1,3	3	3	NCU	Florencia	16	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1000	(ENT C 049) San Cayetano	(ENT C 052) GUAYABO	4	2	5	1	NCU	Venecia	36	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0883	Ent. R-748, San Juan (0,5km Cam#27)	Ent. Cam#28, San Juan (0,8km R-748)	4	2	2	2	NCU	Florencia	33	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMR	Evacuación Pluvial	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0884	Calles Urbanas	San Juan, Florencia	4	0	3	3	U	Florencia	51	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0885	Ent. R-35, Quebrada Azul (0,1km Cam#131)	Ent. Cam#28, C. San Juan (1,3km R-748)	4	4	2	3	NCU	Florencia	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0886	Calles Urbanas	Lotificación, Florencia	4	0	2	2	U	Florencia	32	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMR	Evacuación Pluvial	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				
2-10-0887	Calles Urbanas	Quebrada Azul, Florencia	4	0	3	3	U	Florencia	40	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMR	Evacuación Pluvial	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0888	Ent. R-35, Platanar (0,3km Pte. sobre Río Platanar)	Fin Camino Finca Gilberto Castro Quesada	4	0,3	2	3	NCU	Florencia	18	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMR	Evacuación Pluvial	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0889	Ent. R-35, Platanar (0,2km Cam#888)	Fin Camino Finca	4	0,073	2	3	NCU	Florencia	32	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0891	Ent. Cam#28, C. Dulce Nombre (Fte Cam#892)	Ent. Cam#131, C. Dulce Nombre (0,8km Cam#893)	4	0,9	2	3	NCU	Quesada	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0893	Ent. Cam#131, Dulce Nombre (0,8km Cam#13)	Fin Camino Finca El Lago, Luis Solís Rojas	4	0,8	2	3	NCU	Quesada	9	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0899	Ent. Cam#13, Dulce Nombre (0,3km Cam#895)	Ent. Cam#13, Dulce Nombre (0,3km Cam#900)	4	0,4	1	1	NCU	Quesada	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0900	Ent. Cam#13, Dulce Nombre (0,3km Cam#899)	Fin Camino Finca Los Matamoros	4	0,2	2	3	NCU	Quesada	6	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial: Cajas de registro, tragantes, cabezales, Tubos de concreto alcantarillado, Cunetas	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0901	Ent. Cam#13, Dulce Nombre (0,6km Cam#900)	Fin Camino Finca Los Matamoros	4	0,3	2	3	NCU	Quesada	21	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0902	Ent. Cam#13, Dulce Nombre (0,25km Cam#131)	Ent. Cam#13, C. Dulce Nombre (0,02km Cam#903)	4	0,28	1	3	NCU	Quesada	18	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0903	Ent. Cam#13, C. Dulce Nombre (0,02km Cam#902)	Fin Camino Finca Arturo Oviedo	4	0,038	1	3	NCU	Quesada	26	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0904	Ent. Cam#13, C. Dulce Nombre S.(0,5km Cam#903)	Fin Camino Torres ICE	4	0,4	2	2	NCU	Quesada	20	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0905	Ent. Cam#13, C. Dulce Nombre (Adj. Cam#904)	Fin Camino Finca Juan Félix Arce Alvarado	4	0,22	1	2	NCU	Quesada	26	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0906	Calles Urbanas	La Piñata, Dulce Nombre, Ciudad Quesada	4	0,02	3	3	U	Quesada	32	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				
2-10-0907	Ent. Cam#13, C Dulce Nombre S.(0,15km Cam#905)	Ent. Cam#908,Dulce Nombre S.(0,5km Cam#13)	4	0,55	1	3	NCU	Quesada	32	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0913	Ent. Cam#217, Dulce Nombre Sur (1,2km Cam#912)	Fin Camino, Quebrada Serena	4	0,8	1	2	NCU	Quesada	13	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1019	(ENT C 064) Sangregado	(ENT C 460) Altos Monterrey	5	1,6	5	1	NCU	Monterrey	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-1020	(ENT C 064) Sangregado	Fin de camino, Propiedad Privada	5	0,2	5	1	NCU	Monterrey	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0915	Ent. Cam#20, San Luis (0,5km Cam#914)	Fin Camino Finca, Entrada Acueducto Rural	4	0,32	2	3	NCU	Florencia	20	2018	Mantenimiento Rutinario	SDEP	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0916	Ent. R-739, Cruce Pénjamo (0,3km Cam#878)	Fin Camino Finca Rafael Quesada	4	0,2	1	2	NCU	Florencia	26	2018	Mantenimiento Rutinario	SDEP	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0917	Ent. R-739, Pénjamo (0,12km Cam#916)	Fin Camino Finca Marvin Doti	4	0,8	1	2	NCU	Florencia	26	2018	Mantenimiento Rutinario	SDEP	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0918	Ent. R-739, Pénjamo (0,1km Cam#09)	Fin Camino Complejo Deportivo Veteranos 83	4	0,3	2	3	NCU	Florencia	12	2018	Mantenimiento Rutinario	SDEP	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0919	Calles Urbanas	La Vieja, Florencia	4	0,5	2	3	U	Florencia	34	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				
2-10-0922	Ent. Cam#38, C. Buena Vista (0,7km Cam#122)	Fin Camino Finca Miguel Rodríguez	4	0,2	1	2	NCU	Buena Vista	22	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0923	Ent. Cam#122 Buena Vista (0,1km Cam#38)	Ent. Cam#122, Buena Vista (0,5km Cam#09)	4	0,3	1	1	NCU	Buena Vista	33	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0924	Ent. R-141, Sucre (0,1km Cam#124)	Fin Camino Finca Rodrigo Alfaro	4	1,4	2	2	NCU	Quesada	10	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1029	(ENT C 179) ESCUELA PUERTO SECO	Fin de camino, Propiedad Privada	5	0,6	5	1	NCU	Venado	12	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario	LTMR	Evacuación Pluvial	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
2-10-0925	Ent. Cam#124, Ron Ron Arriba (0,8km Cam#155)	Fin Camino Finca Julio Blanco	4	0,2	2	2	NCU	Quesada	10	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0926	Ent. Cam#09, Ron Ron Abajo (1,6km Cam#124)	Fin Camino Finca Ernesto Arguello	4	0,7	2	2	NCU	Quesada	16	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO N°	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0930	Ent. Cam#09, Pénjamo (0,5km R-739)	Fin Camino Finca Marvin Doti	4	0,5	2	3	NCU	Florencia	15	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0931	Calles Urbanas	La Loma (Antiguo Botadero)	4	0,4	1	3	U	Quesada	32	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				
2-10-0932	Ent. R-141, San Roque (0,1km Cam#02)	Ent. Cam#09, La Abundancia (0,7km Cam#928)	4	1,3	3	3	VC	Quesada	52	2018				
										2019				
										2020				
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	BA	Evacuación Pluvial	Bacheo en Asfalto
2-10-0933	Ent. Cam#932, Pueblo Nuevo (0,5km Cam#09)	Ent. R-35 Futura Intersección (Fte Cam#935)	4	0,7	2	2	NCU	Quesada	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0934	Ent. R-35 Futura Intersección (Adjunto Cam#935)	Fin Camino Finca La Luna, Moisés Rodríguez	4	0,2	2	3	NCU	Quesada	28	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0936	Ent. Futura R-35 C. Florencia (0,1km Cam#935)	Fin Camino Finca Luis Carlos Araya	4	0,5	2	1	NCU	Quesada	3	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0937	Ent. Cam#932, Barrio Cristo Rey (0,4km R-141)	Fin Camino Finca Hermanos Loaiza Mejias	4	0,5	4	2	NCU	Quesada	32	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO N°	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0938	Ent. R-141, Sucre (0,3km Puente Río La Vieja)	Fin Camino Finca Emerita Rojas Morera	4	0,2	2	3	NCU	Quesada	42	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0940	Calles Urbanas		4	0,52	3	3	U	Quesada	40	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2021				
										2022				
2-10-0943	Ent. R-141, Puente Casa (Fte Cam#944)	Ent. R-141, Puente Casa (0,2km Cam#942)	4	0,5	2	3	NCU	Quesada	32	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0945	Ent. Cam# 944, Puente Casa (0,2km R-141)	Fin Camino Finca Elicio Núñez	4	0,2	2	2	NCU	Quesada	30	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0946	Ent. R-141, Cruce Cedral (0,3km Cam#13)	Fin Camino Finca Elizondo	4	0,15	2	3	NCU	Quesada	26	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0948	Ent. Cam#08, Sucre (0,4km Cam#234)	Fin Camino Finca Luz Chávez Salas	4	1,4	2	3	NCU	Quesada	16	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0949	Ent. Cam#08, Sucre (0,2km Cam#948)	Fin Camino Finca Adrian Alfaro	4	0,3	2	2	NCU	Quesada	16	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-1046	(ENT C 179) Puerto Seco	(ENT N 4) Jicarito	5	0,8	5	1	NCU	Venado	15	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0950	Ent. Cam#08, Sucre (0,7km Cam#949)	Ent. Cam#08, C. San Isidro (0,02km Cam#951)	4	0,9	1	1	NCU	Quesada	22	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0951	Ent. Cam#08, C. San Isidro (0,02km Cam#950)	Fin Camino Finca Jorge Barrantes	4	1,5	1	2	NCU	Quesada	16	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0952	Ent. Cam#08, Sn J. de la Montaña (1,6km Cam#951)	nt. Cam#08, Sn J. de la Mont. (0,7km Cam#233)	4	1	1	3	NCU	Quesada	22	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0953	Ent. Cam#08, Sn J. de la Montaña (1,5km Cam#233)	Fin Camino Finca Juan Alfaro Barrantes	4	1	1	3	NCU	Quesada	22	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0955	Ent. Cam#07, San Vicente (1,8km Cam#956)	Fin Camino, parque Nacional Juan Castro Blanco	4	1,9	1	1	NCU	Quesada	13	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0957	Ent. Cam#04, Colón (0,6km Cam#956)	Fin Camino Finca Antonio Barrientos	4	0,3	1	2	NCU	Quesada	36	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0960	Ent. R-140, C. San Juan (0,6km Cam#237)	Fin Camino Finca Carlos Jiménez Alfaro	4	0,3	1	1	NCU	Quesada	16	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-0972	Calles Urbanas	Cuadrantes San Isidro	4	0,13	4	2	U	Pocosol	100	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0973	(Ent.C.104) San Isidro X: 454506,98 Y: 1209673,50	(Ent.N.1856) Limite Cantonal X: 454506,98 Y: 1209673,50	4	2,5	4	2	NCU	Pocosol	36	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0981	Calles Urbanas	Cuadrantes Concho	4	0,4	3	3	U	Pocosol	100	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0983	CALLES URBANAS CUADRANTES.	CUADRANTES San Bosco Monterrey	4	1,1	4	2	U	Pocosol	100	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-0986	(Ent.C.185) El Jardin	(Ent.C.109) El Recreo	4	2,4	3	3	NCU	Cutris	6	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0993	(Ent.C.203) CrucitasX: 463550,15 Y:1203853,92	(Ent.C.104) Crucitas X:462824,86 Y:1200262,55	4	8,1	3	3	NCU	Cutris	30	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-0997	(Ent.C.275) Cruce Rancho Quemado X:448482,80 Y:1185324,71	(Ent.C.275) Cruce Pueblo Nuevo X:447692,47 Y:1183474,57	4	2,5	4	3	NCU	Pocosol	36	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-0998	(Ent.C.275) Cruce Rancho Quemado X:448765,52 Y:1185853,62	(Ent.C.102) Paraiso X:446167,26 Y:1186144,74	4	3,1	1	3	NCU	Pocosol	24	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1002	(ENT C 200) Camino Guaría a Azucena	(ENT C 201) Cochito	4	5,2	0	1	NCU	Pocosol	29	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1003	(ENT N 141) Cruce a Molino	(ENT C 033) Calle Finca Mario Barrientos	4	1,3	3	2	VC	Florencia	52	2018	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
2-10-1064	(ENT C 002) San Juan	Fin Camino, Propiedad Privada	4	0,9	5	5	NCU	Quesada	52	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1065	(ENT C 132) Linda Vista	Fin Camino,Propiedad	4	0,2	5	1	NCU	Quesada	43	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1006	CALLES URBANAS CUADRANTES.	CUADRANTES San Martin	4	0,4	4	2	U	Pocosol	100	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-1007	CALLES URBANAS CUADRANTES.	CUADRANTES Acapulco	4	0,4	4	2	U	Pocosol	100	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-1010	CALLES URBANAS CUADRANTES.	CUADRANTES Juanilama	4	0,5	4	3	U	Pocosol	100	2018	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2019				
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-1069	(ENT C 004) COLON	FIN CAMINO PROPIEDAD PRIVADA,CONDOMINIOS LOMAS LINDA	2	0,5	5	1	NCU	Quesada	27	2018	Mantenimiento Rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2019				
										2020	Mantenimiento Rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical
										2021				
										2022	Mantenimiento Rutinario	SVDEM	No aplica	Demarcación Horizontal y Vertical



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-1012	(ENT N 734) DELICIAS EN VENADO	Fin de camino, Propiedad Privada	4	0,6	2	3	NCU	Venado	27	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1015	(ENT C 1015) CHIMURRIA	FIN DE CAMINO, Propiedad Privada	4	0,2	3	3	NCU	Venado	15	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1073	(ENT N 4) Cutris	Fin de camino., Propiedad Privada	4	1,1	5	1	NCU	Cutris	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1026	(ENT N 140) San Martin	(ENT C 216) San Martin	4	0,6	4	3	NCU	Venecia	40	2018	Mantenimiento Periódico, Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial: Tubos de concreto alcantarillado	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1075	(ENT C 093) San Jose de Cutris	Fin de camino, Propiedad Privada, rio Arenal	4	0,8	5	2	NCU	Cutris	26	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1076	(ENT C 615) Corazon de Jesus	Fin de Camino, Propiedad Privada	4	0,2	5	3	NCU	Cutris	39	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2022	Mantenimiento Periódico	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1028	(ENT N 702) Orquidea	Limite Cantonal San Carlos -	4	0,2	4	2	NCU	Fortuna	36	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1033	(ENT N 739) Santa Rita	Fin camino, Propiedad Privada	4	2	3	3	NCU	Florencia	25	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1034	(ENT C 022) San Francisco	Fin Camino, Propiedad Los Campos	4	0,1	3	3	NCU	Florencia	35	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1035	(ENT C 022) San Francisco	Fin Camino Propiedad Privada	4	0,6	3	3	NCU	Florencia	25	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL											2018			
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1081	(ENT C 1080) Cruce La Gloria (ELIMINADO VER OFICIO UTGVM-316-2016)	(ENT C 347) Danta	4	0,2	5	3	NCU	A.Zarcas	23	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2020	Mantenimiento Periódico	LTMR	No aplica	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
2-10-1036	(ENT C 022) San Francisco	Fin Camino Propiedad Privada	4	0,2	4	2	NCU	Florencia	43	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
2-10-1038	(ENT C 022) San Francisco	Fin Camino Propiedad Privada	4	0,1	3	3	NCU	Florencia	35	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
2-10-1040	(ENT N 035) Quebrada Azul	(ENT N 035) Quebrada Azul	4	0,2	3	3	NCU	Florencia	35	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-1041	(ENT C 908) Cedral Sur	Liceo Francisco Amiguetti de Cedral	4	0,2	4	2	NCU	Quesada	48	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1044	(ENT C 1043) Cedral Norte	Fin Camino, Propiedad Privada	4	1	3	3	NCU	Quesada	19	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1045	(ENT C 079) San Gerardo	Fin Camino Propiedad Privada	4	0,8	4	2	NCU	La Tigra	19	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1047	(ENT C 030) Brisas	Fin Camino, Propiedad Privada	4	0,4	3	3	NCU	Venecia	45	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1050	(ENT N 702) Venecia	Fin camino Propiedad Privada	4	0,4	3	3	NCU	La Tigra	35	2018	Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Relastrados, Conformación
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1052	(ENT C 104) Campo Pocosol	Fin de Camino, Propiedad Privada	4	1,6	4	2	NCU	Pocosol	12	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1055	ENT C 152 La lucha	Limite Cantonal de San Carlos	4	0,6	4	2	NCU	La Tigra	30	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL											2018			
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1056	(ENT C 1055) La Lucha	Fin De camino, Propiedad Privada	4	0,6	4	2	NCU	La Tigra	46	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1062	(ENT N 140) San Juan	(ENT C 1061) San Juan	4	1	3	3	NCU	Quesada	33	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1067	(ENT C 132) Linda Vista	Fin Camino, Propiedad Privada	4	0,5	3	3	NCU	Quesada	32	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1071	(ENT C 038) LA ESPRIELA	Fin camino, Propiedad Privada	4	3,6	3	3	NCU	Buena Vista	23	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1074	(ENT C 1073) Cutris	Fin de camino, Propiedad Privada	4	0,1	3	3	NCU	Cutris	23	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1077	(ENT N 753) Caño Negro	Fin de Camino, Propiedad DOLE	4	1,4	3	3	NCU	Cutris	15	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL-INVERSION ANUAL POR CAMINO DE LA RED VIAL										2018				
0,00 CAMINOS "CANTON SAN CARLOS" SELECCIONADOS - RED NACIONAL														
CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG.(Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1078	(ENT C 472) Caño ciego	Fin de camino Propiedad Privada	4	1,2	4	3	NCU	A.Zarcas	17	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1080	(ENT C 640) Cruce la Gloria	Fin de Camino, Propiedad Privada	4	1	3	2	NCU	A.Zarcas	23	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1100	(ENT N 250) Delicias	Fin de camino, Propiedad Privada	5	0,2	5	1	NCU	A.Zarcas	19	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2020	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2021	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra
										2022	Mantenimiento Rutinario	LTMR	No aplica	Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

2-10-1082	(ENT N 250) La Legua	(ENT C 673) Chirivico	4	3,2	2	3	VC	Pital	44	2018				
										2019	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2021	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
2-10-1084	(ENT C 095) Corazon de Jesus	Fin de Camino, Propiedad Privada	4	4,4	3	3	NCU	Cutris	23	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1085	CALLES URBANAS CUADRANTES.	CUADRANTES PENJAMO	4	0,2	4	2	U	Florencia	100	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-1086	CALLES URBANAS CUADRANTES.	CUADRANTES URBA LA TORRE	4	1,9	4	2	U	Florencia	100	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal

CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (km.)	CONDICION	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1099	(ENT N 250) Delicias	Fin de camino, Propiedad Privada	4	0,3	2	2	NCU	A.Zarcas	29	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1101	(ENT N 4) Cerro Cortez	Fin de camino, Finca Negrita de los	4	0,7	1	2	NCU	A.Zarcas	16	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1103	(ENT N 751) Vuelta KOOPER	Fin Camino Propiedad Privada	4	0,8	3	3	NCU	A.Zarcas	35	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1105	(ENT C 803) Union	Fin Camino Propiedad Privada	4	0,3	3	3	NCU	Venecia	35	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación



2-10-1109	CALLES URBANAS CUADRANTES.	Cuadrantes	4	1	5	5	U	Quesada	100	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-1107	(ENT C 281) Rio San Carlos	(ENT C 281) Cruce Cascada	4	12.2	3	3	NCU	Cutris	37	2018	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1108	CALLES URBANAS - CUADRANTES.	CUADRANTES	4	1,1	4	2	U	Quesada	100	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				

i ó

n



Plan Quinquenal Red Vial Cantonal



CAMINO Nº	DE	A	TIPO SUPERFICIE	LONG. (Km.)	CONDICION DRENAJE	CONDICION SUPERFICIE	CLASIFICACION	DISTRITO	IVTS	PROGRAMADO 2018	MANT. PERIÓDICO	SIMBOLO	ACTIVIDAD PROGRAMADA DRENAJE	ACTIVIDAD PROGRAMADA SUPERFICIE
2-10-1110	CALLES URBANAS - CUADRANTES.	CUADRANTES	4	1,1	4	2	U	Quesada	100	2018				
										2019	Mejoramiento y Rehabilitación	SDEP	Evacuación Pluvial	SD Estructura de Pavimento
										2020				
										2021				
										2022				
2-10-1111	(ENT C 092) Terron Colorado	Fin camino, Propiedad Privada	4	0,2	3	2	NCU	Pocosol	6	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1112	(ENT N 142) El Tanque	(ENT C 070) El Tanque	4	2,37	2	3	NCU	Fortuna	26	2018				
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
2-10-1113	(ENT C 276) El Carmen	Fin de camino, Cerrado con porton	4	2,03	3	3	NCU	Cutris	21	2018	Mantenimiento Periódico	LTMP	No aplica	Relastrados
										2019	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2020	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación
										2021	Mantenimiento Periódico y Rehabilitación	LTMP	Evacuación Pluvial	Relastrados
										2022	Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación	LTMR	Evacuación Pluvial	Bacheo en Lastre y Conformación

5. ANÁLISIS DEL PLAN QUINQUENAL 2011-2015 Y AÑOS 2016-2017

En este apartado se pretende realizar un análisis del trabajo realizado durante el periodo 2011 hasta el 2017 y la consecución de las metas establecidas.

La Unidad Técnica de Gestión Vial ha implementado la valoración con la Matriz de Evaluación establecida en el quinquenio anterior, en la cual se reflejan los siguientes resultados para cada una de las áreas:

Mantenimiento Periódico: se proyectó la ejecución de 524 Km anuales en actividades de mantenimiento periódico como lo son actividades de lastrado, recarpeteo, relastrado, manteniendo de puentes, demarcación horizontal y vertical de caminos, entre otras, con respecto a los Km programados se realizó una intervención de 128 km, lo cual representa un 24% y un indicador de evaluación bajo.

Mantenimiento Rutinario: con respecto a las acciones que se realizan en esta área como lo son bacheo en lastre, bacheo en asfalto, bacheo con base, entre otros, se estableció como meta la ejecución de 352 Km anuales, de los cuales se implementaron 843.52 Km, en este caso el indicador da un alto porcentaje de 239.50%, por consiguiente, se cumplió a cabalidad la meta establecida.


Mejoramiento: Por medio de actividades como el adoquinado, lastrado, asfalto, rectificación de curvas horizontales y verticales, movimiento de tierra, cementado, alcantarillado, construcción de puentes, entre otros, se estableció la meta de implementar el mejoramiento de 973.6 km, con respecto a los resultados se registran la ejecución de 140 Km, lo cual genera un indicador bajo del 14% de ejecución.

Rehabilitación: se estableció como meta rehabilitar 619.5 kilómetros de la Red Vial Cantonal, por medio de alcantarillados, lastrado, aceras, cordón y caño, cunetas, cajas de registro, evacuación pluvial, entre otras tareas, como resultado se ejecutaron 386.06 Km lo cual representa un 62,31% de ejecución reflejando un indicador medio

de cumplimiento.

El total de proyectos establecidos para el periodo 2011-2017 fue de 5896, de los cuales se realizaron 1517, en la siguiente imagen se puede apreciar de manera gráfica los porcentajes de proyectos ejecutados y no ejecutados en dicho periodo.

Gráficos X Proyectos ejecutados y no ejecutados en el Periodo 2011-2017

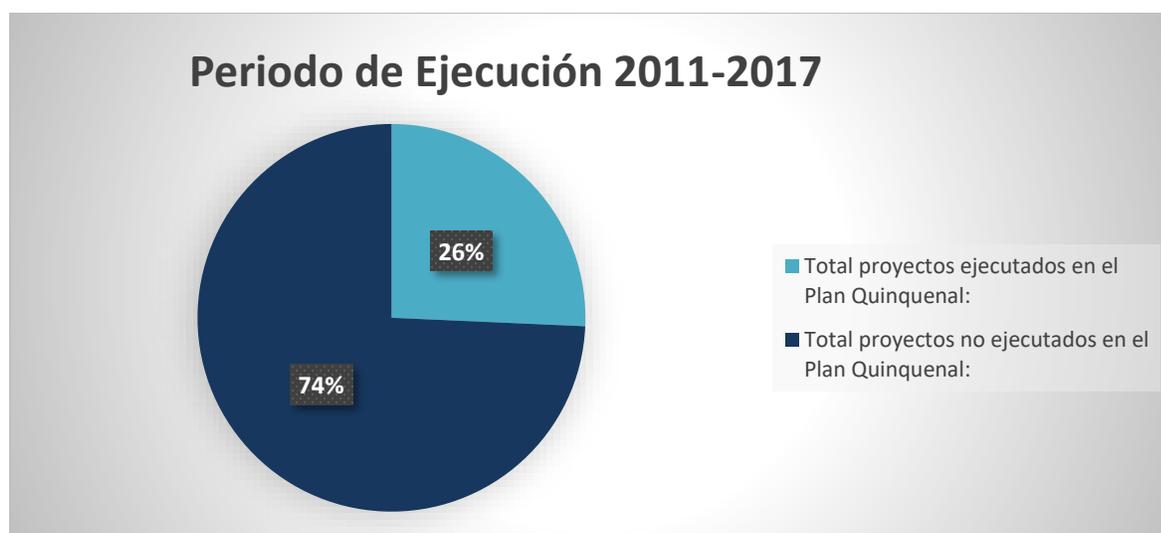

Fuente: Elaboración Propia base a la información presentada por la UTGV

Con la finalidad de apreciar la información de una manera más específica se muestra el siguiente gráfico, en el cual se presenta la información de los proyectos ejecutados en cada uno de los años en estudio.

Analizando la información se puede determinar que los años 2013 y 2016 fueron los años con mayor cantidad de proyectos ejecutados en promedio un 72,25% y un 71.5% consecutivamente, seguido del año 2012 en el cual se realizaron 69,75 %, en el 2015 un 61%, en el 2014 un 53,5%, para el año 2011 el porcentaje fue de 49,25% y finalmente el 2017 un 2%.

Cabe destacar que la proyección de proyectos que se realiza en un plan quinquenal es una estimación muy amplia, motivo por el cual a la hora de ejecutar es posible no se alcancen la totalidad de las actividades propuestas, datos que se reflejan en este gráfico.

Gráficos XI Proyectos ejecutados y no ejecutados por año 2011-2017




Fuente: Elaboración Propia base a la información brindada por la UTGV

Para brindar al lector una visión más clara del estado actual de la Red Vial Cantonal se detallan los siguientes gráficos, los cuales brindan resultados reales de la programación que se realiza en la UTGV.

En el gráfico se puede apreciar como desde el año 2012 al 2014 hubo una estabilidad en el estado de la Red Vial Cantonal, sin embargo, desde el 2015 ha presentado un crecimiento positivo hasta el año 2017 logrado aumentar en casi el doble el porcentaje en el año 2017 se llegó a un 60,2%, lo cual refleja un buen trabajo por parte de la UTGV y los involucrados con respecto al desenvolvimiento y alcance de resultados.


De igual manera se presenta el gráfico XII, en el cual se puede apreciar el comportamiento de la superficie de rueda a través de los años donde la estabilidad se ve reflejada en la imagen, ha tenido pocas variaciones, se puede destacar que la cantidad de Km asfalto ha ido aumentando lo cual es positivo para la RVC, así como la superficie en adoquines, las superficies tratamiento, concreto, tierra y lastre se les ha brindado un manteniendo adecuado para mantener un equilibrio en este periodo.

Gráficos XII Porcentaje del estado actual de la Red Vial Cantonal 2012-2017

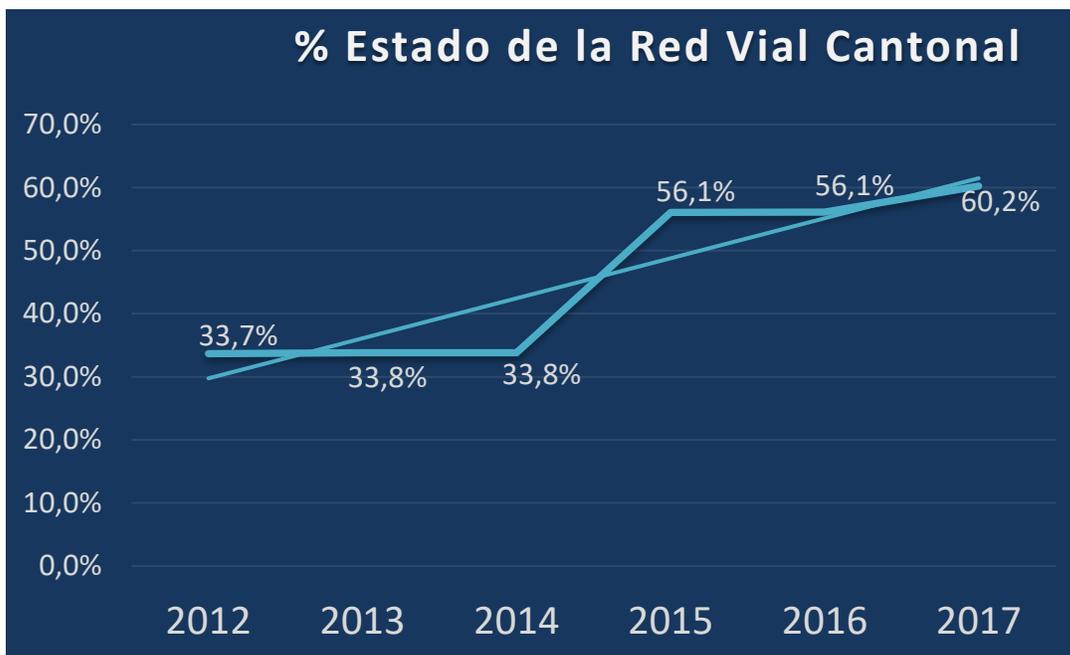

Fuente: Unidad Técnica de Gestión Vial

Gráficos XIII Porcentaje del estado actual de la Red Vial Cantonal 2012-2017

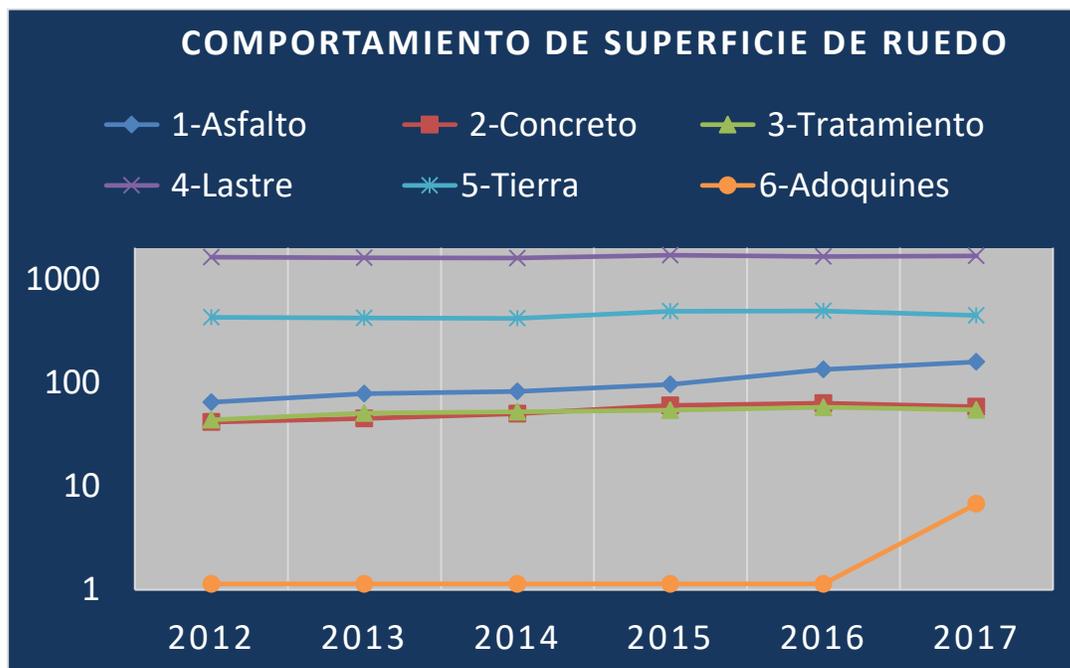

Fuente: Unidad Técnica de Gestión Vial




La Red Vial Cantonal la podemos calificar por su condición en excelente, bueno, regular, malo y muy malo, lo ideal para todo proyecto es siempre buscar la excelencia, a continuación, se presenta un gráfico en el cual se ven reflejada la cantidad de Km que se han ejecutado por año en cada una de las categorías.

El resultado para la condición excelente, representada con el color azul, es positiva debido a que desde el año 2014 ha ido en aumento y se ha mantenido estable, lo cual muestra como ha mejorado la condición de la RVC. De igual manera la condición bueno refleja un importante pico de crecimiento.

La condición regular aumento en el año 2015, pero afortunadamente disminuyo en el 2016 y aún más en el 2017, mismo comportamiento se ve en las condiciones mala y muy mala, han ido disminuyendo al pasar los años.

Gráficos XIV Comportamiento de la Condición de la RVC

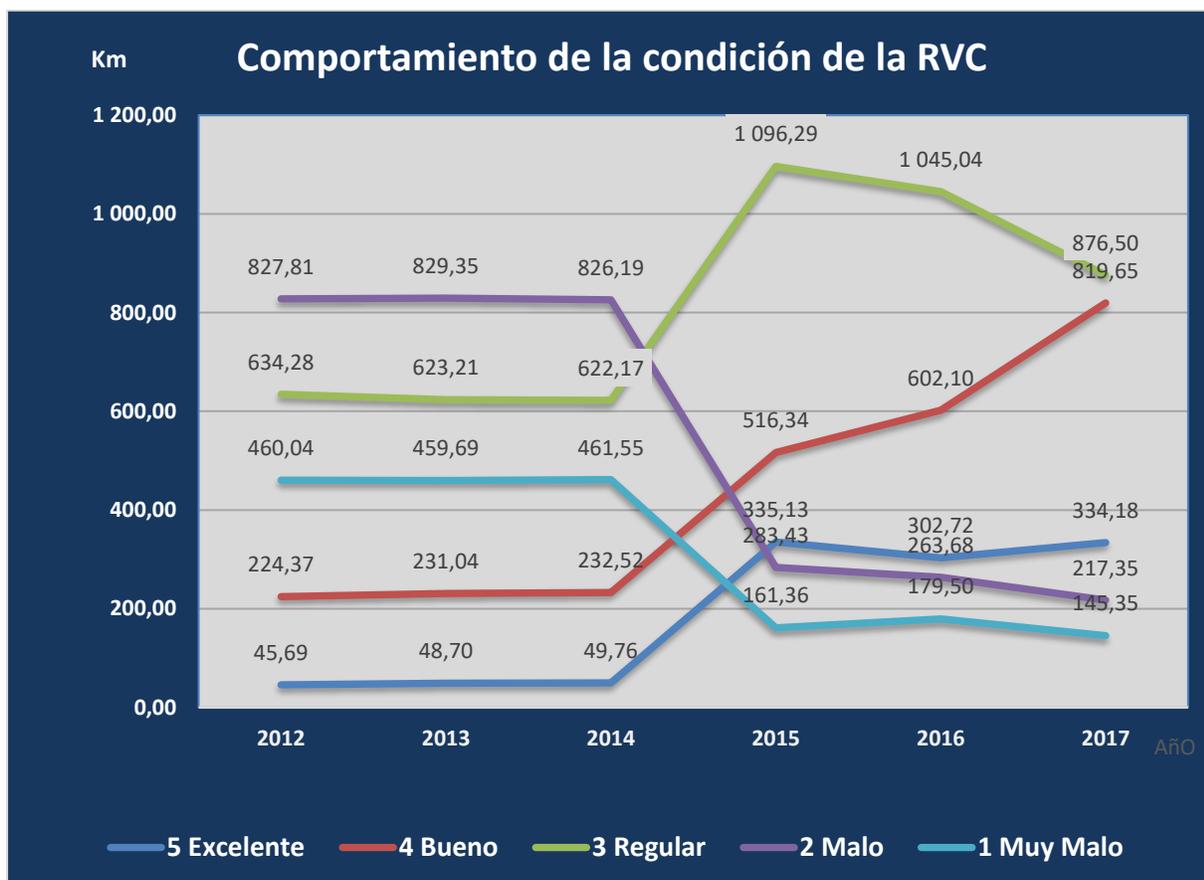

Fuente: Unidad Técnica de Gestión Vial

Una vez presentada la información anterior se puede afirmar, el crecimiento positivo que está presentando la Red Vial Cantonal de la Municipalidad de San Carlos. La eficiencia y eficacia son dos de las características que se pretenden alcanzar en cada uno de los proyectos.



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

Seguidamente se detallan las principales conclusiones que se generan una vez finalizado el trabajo:

A. CONCLUSIONES

1. Alrededor de diez legislaciones son las que respaldan el Plan Quinquenal y el aporte de recursos para la inversión pública en la Red Vial Cantonal, sin embargo, en materia vial cantonal la Ley 8114 y su reforma la ley N. 9323 es el principal cuerpo normativo que rige la materia.
2. La unidad Técnica de Gestión Vial mantiene una base de datos actualizada con el inventario de la Red Vial Cantonal y sus especificaciones como: la extensión de la Red Vial Cantonal Clasificada, la extensión de la Red Vial Cantonal no Clasificada, los cuadrantes y calles urbanas y el diagnóstico del estado de la Red Vial del Cantón.
4. La proyección financiera de los recursos que se destinan para la ejecución de los proyectos de la Red Vial Cantonal tienen un porcentaje de aumento anual aproximado del 10%.
5. La UTGV, posee una base de datos, en la cual se lleva un registro de las emergencias causadas por desastres naturales que han afectado a RVC y que se han atendido en los últimos cinco años por la Municipalidad de San Carlos de la mano con la Comisión Nacional de Emergencias. Se pueden generar una estimación de las zonas más propensas a desastres.
6. La UTGV prioriza los proyectos a ejecutar en el próximo quinquenio



mediante el formulario de Índice de Viabilidad Técnico Social, el cual permite determinar la importancia relativa de una calle o camino dentro del cantón.

7. Se cuenta con un documento llamado “Propuesta de Políticas en Materia de Red Vial Cantonal” del año 2007, el mismo fue aprobado por la Municipalidad de San Carlos en Sesión N° 16, Artículo N° 3. Este documento muestra una serie de políticas en materia de gestión vial municipal y aún no ha sido aprobado por el concejo.

10. No se tienen metas específicas por proyecto, por lo tanto, se presentan las metas que se esperan alcanzar por tipo de intervención para el periodo 2018-2022.

11. En general el análisis del quinquenio 2011-2015 refleja un avance positivo por parte de la Municipalidad de San Carlos con respecto a la Red Vial del Cantón



Bibliografía





LITERATURA CONSULTADA

(CONAVI, 2018)

BID, EIAP y FGV Brasil. (1985). *Proyecto de desarrollo: Planificación, implementación y control*. Mexico DF: Limusa.

Chiavenato, I. (1986). *Introducción a la teoría General de la Administración*. Bogotá: Mc Graw Hill.

CN Crece Negocios.com. (s.f.). Recuperado el Agosto de 2011, de <http://www.crecenegocios.com/la-planeacion/>

Elizagarate, V. (1986). *Un todo para la gerencia, la dirección estratégica*.

Freeman, G. S. (1997). *Administración* (Sexta ed.). Prentice Hall.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2007). *Metodología de la Investigación* (Cuarta ed.). Mexico: McGraw-Hill.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2003). *Metodología de la Investigación* (Tercera ed.). Mexico

Carlos, M. d. (03 de Enero de 2018). *Municipalidad de San Carlos*. Obtenido de Municipalidad de San Carlos: <https://www.munisc.go.cr/>

CENSOS, I. N. (03 de Enero de 2018). *INEC Costa Rica*. Obtenido de INEC Costa Rica: <http://www.inec.go.cr/>

Económica, M. d. (10 de ENERO de 2018). *MIDEPLAN*. Obtenido de MIDEPLAN: <https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8919cc42-afa2-4283-ab37-837547406763/IDS%202013.pdf?guest=true>

Hernandez, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación* (Quinta Edición ed.). (J. M. Chacón, Ed.) D.F., Mexico: McGraw-Hill.

Stoner, J. (1996). *Administración* (Sexta ed.). Mexico: Prentice-Hall.



Apéndices



APÉNDICES

Apéndice 1. Proyección de la población de San Carlos al 2018-2022

Costa Rica: Población total proyectada al 30 de junio por grupos de edades, según provincia y cantón 2018																		
Año	Provincia y cantón	Total	Grupos de edades															
			0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 y más
2018	San Carlos	194 207	16 332	16 091	16 034	17 104	18 896	19 406	17 861	14 126	11 615	10 515	9 916	8 154	6 202	4 463	3 021	4 471
2019	San Carlos	197 218	16 315	16 035	16 346	16 949	18 787	19 492	18 392	14 665	11 992	10 694	9 993	8 489	6 466	4 772	3 171	4 660
2020	San Carlos	200 151	16 273	16 039	16 655	16 637	18 756	19 560	18 667	15 382	12 443	10 894	10 045	8 755	6 736	5 100	3 341	4 868
2021	San Carlos	203 149	16 247	16 260	16 579	16 570	18 614	19 618	18 662	16 216	13 091	11 066	10 091	8 958	7 123	5 418	3 552	5 084
2022	San Carlos	206 115	16 207	16 326	16 638	16 654	18 416	19 605	18 851	16 778	13 737	11 295	10 143	9 157	7 488	5 695	3 814	5 311

Fuente: Construido con base en información del INEC

Apéndice 2. Población por área geográfica según distrito

Costa Rica: Población total proyectada al 30 de junio por grupos de edades, según provincia, cantón, distrito y sexo
2018

Provincia, cantón, distrito y sexo	Total	Grupos de edades															
		0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 y más
San Carlos	194 207	16 332	16 091	16 034	17 104	18 896	19 406	17 861	14 126	11 615	10 515	9 916	8 154	6 202	4 463	3 021	4 471
Quesada	44 933	3 426	3 317	3 212	3 150	4 104	4 577	4 707	3 744	2 956	2 624	2 495	2 031	1 541	1 094	759	1 196
Florencia	17 607	1 397	1 391	1 362	1 461	1 623	1 706	1 712	1 311	1 103	1 024	962	779	606	448	291	431
Buenavista	391	33	32	36	39	40	38	35	27	22	21	20	14	11	10	8	5
Aguas Zarcas	24 462	2 146	2 133	2 108	2 222	2 416	2 434	2 175	1 657	1 400	1 308	1 228	1 000	763	559	374	539
Venecia	11 370	991	982	972	987	1 077	1 103	1 040	786	664	626	593	481	363	267	182	256
Pital	22 994	2 059	2 068	2 086	2 303	2 392	2 351	1 908	1 535	1 268	1 137	1 064	891	672	476	324	460
Fortuna	18 418	1 554	1 510	1 526	1 680	1 878	1 890	1 634	1 306	1 083	977	918	767	581	420	283	411
Tigra	7 554	623	606	612	662	757	774	689	539	452	413	389	318	246	181	119	174
Palmera	7 494	598	604	584	631	680	722	727	553	468	436	409	334	257	188	124	179
Venado	2 099	175	173	161	175	179	194	204	168	135	119	113	94	72	49	35	53
Cutris	14 177	1 274	1 248	1 368	1 621	1 466	1 384	1 108	903	766	703	655	536	403	277	191	274
Monterrey	4 120	343	339	329	358	394	423	376	305	249	223	211	179	134	96	66	95
Pocosol	18 588	1 713	1 688	1 678	1 815	1 890	1 810	1 546	1 292	1 049	904	859	730	553	398	265	398

Fuente: Construido con base en información del INEC



Apéndice 3. Población Rural y Urbana

Costa Rica: Población total por zona y sexo, según provincia, cantón y distrito									
Provincia, cantón y	Total			Urbano			Rural		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Costa Rica	4 301 712	2 106 063	2 195 649	3 130 871	1 509 161	1 621 710	1 170 841	596 902	573 939
Alajuela	848 146	420 888	427 258	515 150	252 053	263 097	332 996	168 835	164 161
San Carlos	163 745	82 048	81 697	77 559	37 993	39 566	86 186	44 055	42 131
Quesada	42 060	20 273	21 787	29 830	14 291	15 539	12 230	5 982	6 248
Florencia	15 149	7 555	7 594	9 786	4 801	4 985	5 363	2 754	2 609
Buenavista	325	167	158	-	-	-	325	167	158
Aguas Zarcas	20 239	10 071	10 168	8 372	4 125	4 247	11 867	5 946	5 921
Venecia	9 638	4 842	4 796	2 469	1 221	1 248	7 169	3 621	3 548
Pital	17 318	8 867	8 451	8 621	4 290	4 331	8 697	4 577	4 120
La Fortuna	15 383	7 802	7 581	12 428	6 277	6 151	2 955	1 525	1 430
La Tigra	6 374	3 213	3 161	456	228	228	5 918	2 985	2 933
La Palmera	6 321	3 389	2 932	-	-	-	6 321	3 389	2 932
Venado	1 754	904	850	-	-	-	1 754	904	850
Cutris	10 334	5 392	4 942	2 033	1 015	1 018	8 301	4 377	3 924
Monterrey	3 455	1 786	1 669	-	-	-	3 455	1 786	1 669
Pocosol	15 395	7 787	7 608	3 564	1 745	1 819	11 831	6 042	5 789

Fuente: Información del INEC (Censo 2011)



Anexos



ANEXOS

Anexo 1. Formulario de Evaluación Técnico-Social

MOPT, Dirección General de Planificación

REGION MOPT: CAMINO: DE: _____ DE: _____ Formulario F.1

A: _____

NOMBRE DE LA CALLE O CAMINO: _____

FORMULARIO DE EVALUACIÓN TÉCNICO-SOCIAL PARA SELECCIÓN DE CAMINOS DE LA RED VIAL CANTONAL

INDICE DE VIABILIDAD TÉCNICO-SOCIAL

Provincia: _____ Distrito: _____ IDS:

Cantón: _____

Información complementaria:

Camino es incesionablemente público: Funciona en la Municipalidad una Unidad Técnica de Viabilidad:

Camino clasifica como vicinal (RVG): Existe carril de caminos con equidad de género:

Índice Desarrollo Social del Cantón: Camino es prioritario para la comunidad y la municipalidad:

CRITERIOS	Ponderación	0,3	0,7	1,8	Calificación
Criterio Social					
1. Infraestructura local	20%	< 3	4 a 7	> 8	<input type="checkbox"/>
1.1 Escuelas, cantidad aulas					
1.2 Puesto de salud					
1.3 Transporte Público					
1.4 Electricidad					
1.5 Telefonía pública					
1.6 Centros ecopio					
1.7 Plantas procesadoras					
1.8 Reflejo sanitario					
1.9 Plantas de tratamiento aguas					
1.10 Otro:					
2. Cantidad viviendas por km	20%	10-15	15-25	> 26	<input type="checkbox"/>
3. Proyectos Desarrollo Nacional	10%	1	2	> 2	<input type="checkbox"/>
- Proyectos Hidroeléctricos					
- Proyectos Turísticos					
- Proyectos Seguridad Nacional					
- Proyectos Productivos					
- Proy. Conservación Forestal					
4. Proy. De Desarrollo social	10%	1	2	> 2	<input type="checkbox"/>
Asentamientos Campesinos					
Reservas Indígenas					
Proy. Desarrollo Habitac. p. familias de bajos ingresos					
Grupos inmigrantes					
Criterios Económicos					
5. Criterios Económicos					
- Tránsito Promedio Diario	10%	30-50	50-100	100 o más	<input type="checkbox"/>
- Producc. visible o por consulta	10%	Baja	Media	Alta	<input type="checkbox"/>
Criterios Técnicos					
6. Accesibilidad, grado de desarrollo del camino y fuentes de material.	20%	1 a 2	3	4 a 5	<input type="checkbox"/>
Conectividad (conexión de red)					
Sistema de Drenaje (Reg. a buena)					
Geometría adecuada (curvas, pendientes)					
Superficie de Rueda (Reg. a buena)					
Fuentes de material disponibles, con distancia de camino menor que 15 km, material de buena calidad y vías de acceso.					
INDICE DE VIABILIDAD TÉCNICO-SOCIAL =					
¿EXISTEN CRITERIOS DE PESO PARA NO SELECCIONAR ESTE CAMINO?					
Firma: _____					Fecha: _____

Fuente: Unidad Técnica de Gestión Vial

Anexo 2. Simbología de acuerdo con la actividad y clasificación en la Matriz Quinquenal

ACTIVIDAD	SIMBOLOGIA	CLASIFICACION
Aceras	CA	REHABILITACION
Actividades varias de mantenimiento	AVM	MANT. RUTINARIO
Alcantarillas de cuadro	EPCC	REHABILITACION
Apilado	LT	MANT. RUTINARIO
Atención de emergencias cantonales que afecten la infraestructura vial	EM	CASOS DE EJECUCION INMEDIATA
Bacheo en asfalto	BA	MANT. RUTINARIO
Bacheo en concreto	BC	MANT. RUTINARIO
Bacheo en Lastre	LTMR	MANT. RUTINARIO
Cajas de registro, tragantes, cabezales	EPCC	REHABILITACION
Compra de equipos	GOEQ	UTGVM
Conformación	LTMR	MANT. RUTINARIO
Construcción de puentes peatonal	CPP	MEJORAMIENTO
Construcción de puentes vehicular	CPV	MEJORAMIENTO
Cordón y caño	CCC	REHABILITACION
Cunetas	CC	REHABILITACION
Demarcación Horizontal y Vertical	SVDEM	MANT. RUTINARIO
Lastrado	LTMJ	MEJORAMIENTO
Limpieza mecanizada	LTMR	MANT. RUTINARIO
Mantenimiento de puentes peatonales	MPP	MANT. PERIÓDICO
Mantenimiento de puentes vehiculares	MPV	MANT. PERIÓDICO
Mantenimiento Vados	MV	MANT. RUTINARIO
Movimiento de Tierra, ampliación de caminos	LTMJ	MEJORAMIENTO
Recarpeteo	SDRC	MANT. PERIÓDICO
Relastrados	LTMP	MANT. PERIÓDICO
Superficies Duraderas / Adoquín	SDAD	MEJORAMIENTO
Superficies Duraderas / Carpetas	SDC	MEJORAMIENTO
Superficies Duraderas / Losas	SDLC	MEJORAMIENTO
Superficies Duraderas / Tratamiento Superficial Bituminoso	SDBSB	MEJORAMIENTO
Traslado Maquinaria	TM	UTGVM
Tubos de concreto alcantarillado	EPCA	REHABILITACION
Carpeta Asfáltica	CASF	MANT. RUTINARIO
Lastrado con Evacuación Pluvial		MEJORAMIENTO
Limpieza Mecanizada y Conformación	LTMR	MANT. RUTINARIO
Bacheo en Lastre y Conformación	LTMR	MANT. PERIÓDICO
Limpieza Mecanizada, Conformación y Movimientos de Tierra	LTMR	MEJORAMIENTO
Comunidad	COM	
SD Estructura de Pavimento	SDEP	MEJORAMIENTO

Fuente: Unidad Técnica de Gestión Vial

Anexo 3. Simbología de acuerdo con tipo de superficie, tipo de vía y condición de drenaje y superficie de ruedo en la Matriz Quinquenal

TABLA DE CODIGOS PARA TIPO DE SUPERFICIE	
COD	DESCRIPCION
1	ASFALTO
2	CONCRETO
3	TSB
4	LASTRE
5	TIERRA
6	ADOQUIN
Simbología	Tipo de Vía
U	Urbana
VC	Vía Clasificada
NCU	No Clasificada en Uso
NCD	No Clasificada en Desuso
Simbología	Condición de drenaje y superficie de ruedo
1	Pésimo
2	Malo
3	Regular
4	Bueno
5	Excelente

Fuente: Unidad Técnica de Gestión Vial



Anexo 4. Acuerdo para las Políticas del Plan Quinquenal



Municipalidad de San Carlos
Departamento de Secretaría del Concejo Municipal
Calle Central - Avenida 2. Appdo. 13. 4400,
Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela, Costa Rica



25 de enero de 2018
MSCCM-SC-0120-2018

Señor Pablo Jiménez Araya
Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial
Municipalidad de San Carlos. –

Estimado señor:

Le comunico que el Concejo Municipal de San Carlos en su Sesión Ordinaria celebrada el lunes 22 de enero del 2018, en el Salón de Sesiones de ésta Municipalidad, mediante Artículo N° 17, Inciso N° 04, Acta N° 05, **ACORDÓ:** Con base en los oficios MSC MSC-SC-2483-2017 emitido por la Secretaria del Concejo Municipal y JVC-22-2017 de la Junta Vial Cantonal mediante el cual solicitan a este Concejo Municipal evaluar y analizar las políticas del Plan Quinquenal existente con el fin de emitir el criterio de mantener las existentes o realizar el cambio ya que se aproxima el periodo 2017-2022 y como parte de los requisitos debe cumplir un plan quinquenal, se determina, una vez evaluadas y analizadas las políticas del Plan Quinquenal existente, se recomienda continuar con dichas políticas ya que ellas atienden lo que se requiere del Plan Vial Cantonal. **Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. –**

Atentamente,


Ana Patricia Solis Rojas
Secretaria del Concejo Municipal

C.c.: Sres. Comisión Municipal de Obra Pública, Municipalidad de San Carlos. –



Fuente: Unidad Técnica de Gestión Vial

